


福島第一原子力発電所現地確認報告書

- 1 確認日
令和2年10月5日（月）
- 2 確認箇所
メガフロート（1～4号機取水路開渠内）
- 3 確認項目
メガフロート有効活用に向けた護岸工事等の状況
- 4 確認結果の概要

メガフロートについては、津波等リスク低減対策工事としてメガフロート内部へのモルタル充填作業が8月3日に完了（8月19日確認済）しており、メガフロートを護岸及び物揚場として有効活用していくための護岸工事等が実施されていることから、本日は当該工事の状況を確認した。（図1）

- ・メガフロート西側と海側遮水壁との間を砕石（人工地盤材料）により埋め戻す工事は、メガフロート北西側以外は完了しており、一部箇所については転圧作業も完了していた。（写真1）
- ・現場確認時は砕石の搬入作業が実施されていた。（写真2）

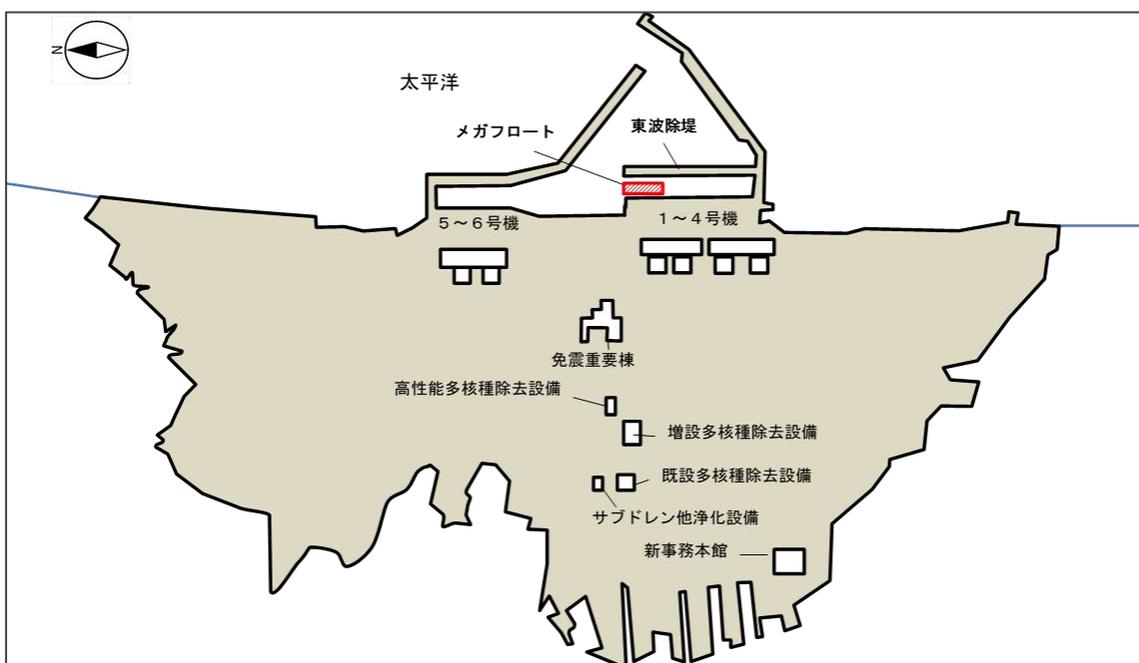

(図1) 福島第一原子力発電所構内概略図



(写真 1 - 1)
 メガフロート南西側の状況
 北西側から撮影
 (前回 (8月19日) 撮影)



(写真 1 - 2)
 同左
 (今回 (10月5日) 撮影)



(写真 1 - 3)
 メガフロート北西側の状況
 南西側から撮影
 赤丸部分は埋め戻しが始まっておらず、海面が見える



(写真 2 - 1)
 砕石の積み込み作業の状況



(写真 2 - 2)
 砕石の搬入作業の状況

5 プラント関連パラメータ等確認
 本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。
