


## 福島第一原子力発電所現地確認報告書

- 1 確認日  
令和2年8月26日（水）
- 2 確認箇所  
定検用機材倉庫B
- 3 確認項目  
1 / 2号機共用排気筒減容作業の状況
- 4 確認結果の概要

1 / 2号機共用排気筒については、本年5月1日までに解体作業が終了し、解体された筒身は発電所構内の仮置場にて保管されている。今月から小割切断作業が開始されたことから、進捗状況を確認した。

なお、前回の調査（令和2年8月18日）において、全19ブロックのうち1ブロックの搬入が確認されており、その後ブロックを8分割し、さらに小割切断してコンテナに収納する予定とされていた。（図1、写真1）

- ・今回、前回搬入が確認されたブロックは8分割されており、そのうち6片目までがコンテナに収納できる大きさに小割切断されていた。（写真2）
- ・残り2片についても小割切断する準備作業が進められており、作業場所には、透明なビニール製テントが設けられ、その中に2片が並べて置かれていた。（写真3）

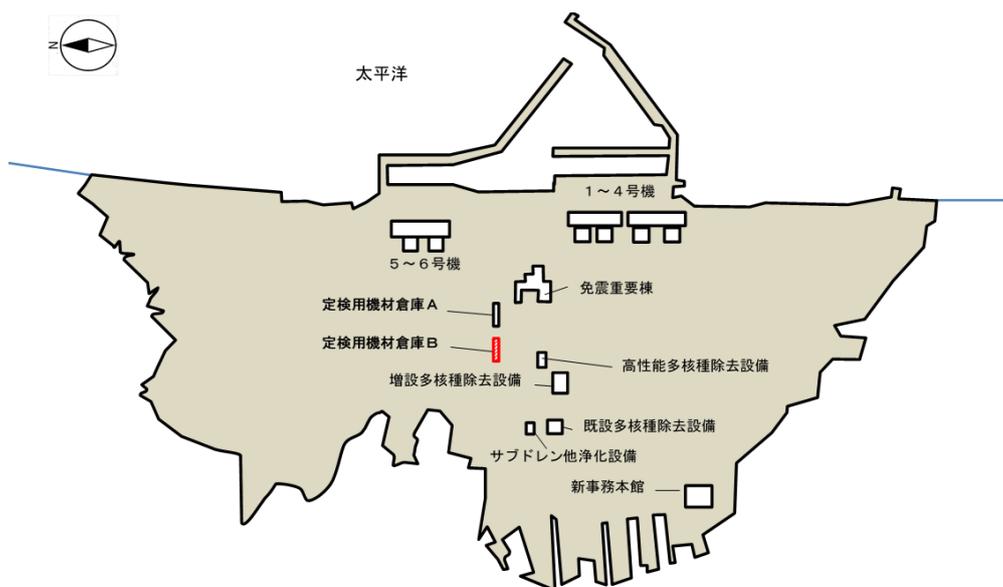

（図1）福島第一原子力発電所構内概略図



(写真1)  
定検用機材倉庫B  
(南西側から撮影)



(写真2)  
6片は、既にコンテナに収納可能な  
大きさに小割切断



(写真3-1)  
ビニール製テントが設置



(写真3-2)  
小割切断予定の2片

- 5 プラント関連パラメータ等確認  
本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。
