

# 原子力発電所の環境放射能測定結果

(令和 2 年度 第 3 四半期)

(案)

東京電力ホールディングス株式会社

福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所

福島第二原子力発電所

# 目 次

第1	測定結果の概要	1
第2	測定項目	11
第3	測定方法	15
第4	測定結果	19
1.	空間放射線	19
2.	環境試料	21
第5	原子力発電所周辺環境放射能測定値一覧表	25
	福島第一原子力発電所	
1.	空間放射線	25
2.	環境試料	27
	福島第二原子力発電所	
1.	空間放射線	30
2.	環境試料	32
	添付資料	
	放射性廃棄物管理状況及び試料採取時の付帯データ	35
	福島第一原子力発電所	
	放射性廃棄物管理状況	36
	試料採取時の付帯データ	39
	福島第二原子力発電所	
	放射性廃棄物管理状況	42
	試料採取時の付帯データ	44
	空間線量率等の変動グラフ	47
	〈参考〉地下水バイパス及びサブドレン他浄化設備の処理済水の評価，排水毎の運用目標値	70
	〈参考〉福島第一原子力発電所敷地境界近傍ダストモニタ指示値	75

## 第1 測定結果の概要


東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所が、令和2年度第3四半期(10月~12月)に実施した原子力発電所周辺の環境放射能測定結果は以下に示すとおりであり、福島第一原子力発電所の事故による影響を受けた空間線量率については事故前の測定値の範囲を上回り、環境試料については一部を除いて事故前の測定値の範囲を上回っておりますが、年月の経過とともに減少する傾向にありました。

### 1 空間放射線

○空間線量率については、福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所ともに、今期の測定値(月間平均値  $0.083\sim 1.216\ \mu\text{Gy/h}$ )は、事故前の測定値の範囲(月間平均値  $0.031\sim 0.049\ \mu\text{Gy/h}$ )を上回っていますが、概ね前四半期と同程度の値となりました。

○空間積算線量(90日換算値)については、福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所ともに、今期の測定値( $0.19\sim 7.80\text{mGy}$ )は、事故前の測定値の範囲( $0.10\sim 0.16\text{mGy}$ )を上回っていますが、年月の経過とともに減少する傾向にありました。

※今期の空間線量率及び空間積算線量の範囲

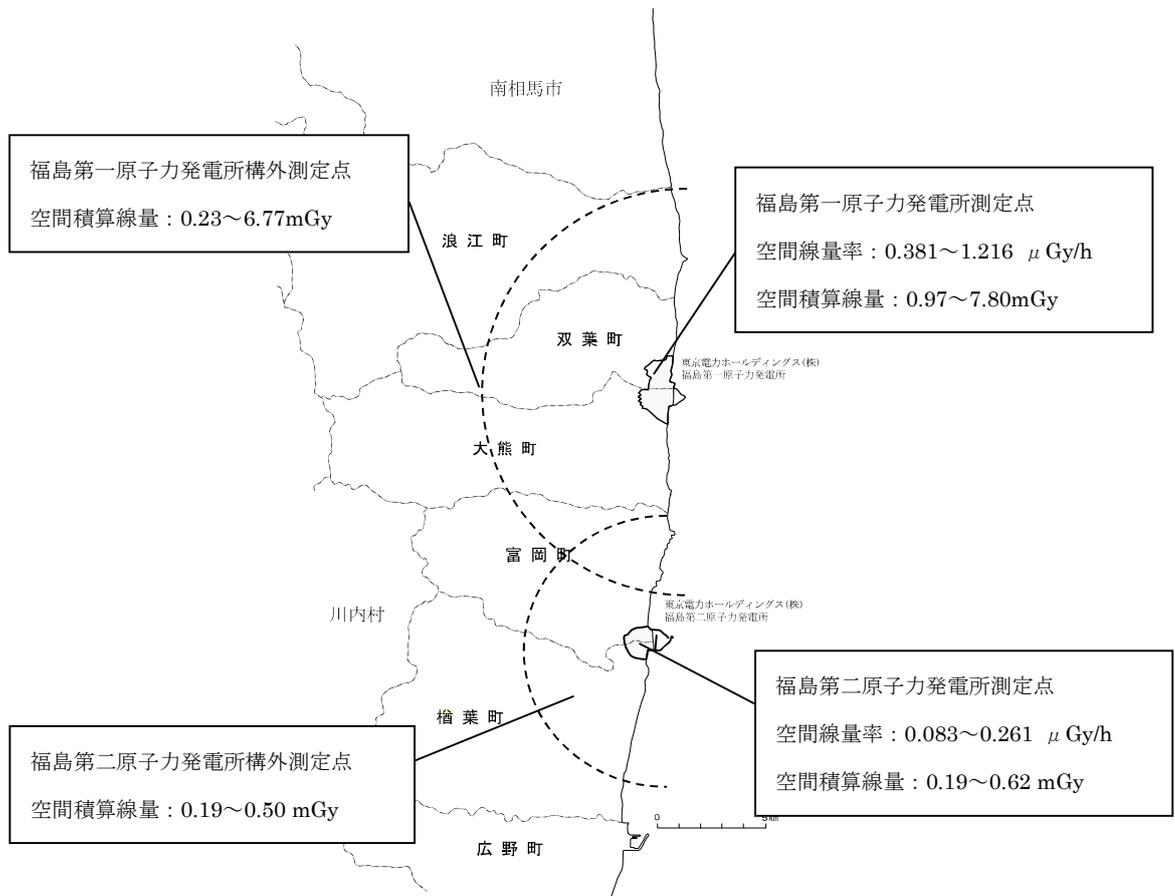

## 2 環境試料の核種濃度

- 大気浮遊じん、土壌、海水、海底土、松葉について、福島第一原子力発電所で17試料、福島第二原子力発電所で17試料について、核種濃度の調査を実施しました。

福島第一原子力発電所については、すべての試料から、事故前の測定値を上回るセシウム-134, 137 が検出されましたが、事故直後と比較すると低下しており、前四半期と比較すると、概ね横ばい傾向にあります。


福島第二原子力発電所については、すべての試料から、セシウム-137 が検出され、土壌、海底土から、セシウム-134 が検出されましたが、事故直後と比較すると低下しており、前四半期と比較すると、概ね横ばい傾向にあります。

- 海水について、福島第一原子力発電所の3試料及び福島第二原子力発電所の3試料でトリチウムの調査を実施しました。


福島第一原子力発電所の3試料のうち北放水口の1試料から検出されましたが、事故前の測定値と同程度の値でした。

福島第二原子力発電所の全ての試料から、トリチウムは検出されませんでした。


### ※今期の大気浮遊じんのセシウム-137 の範囲

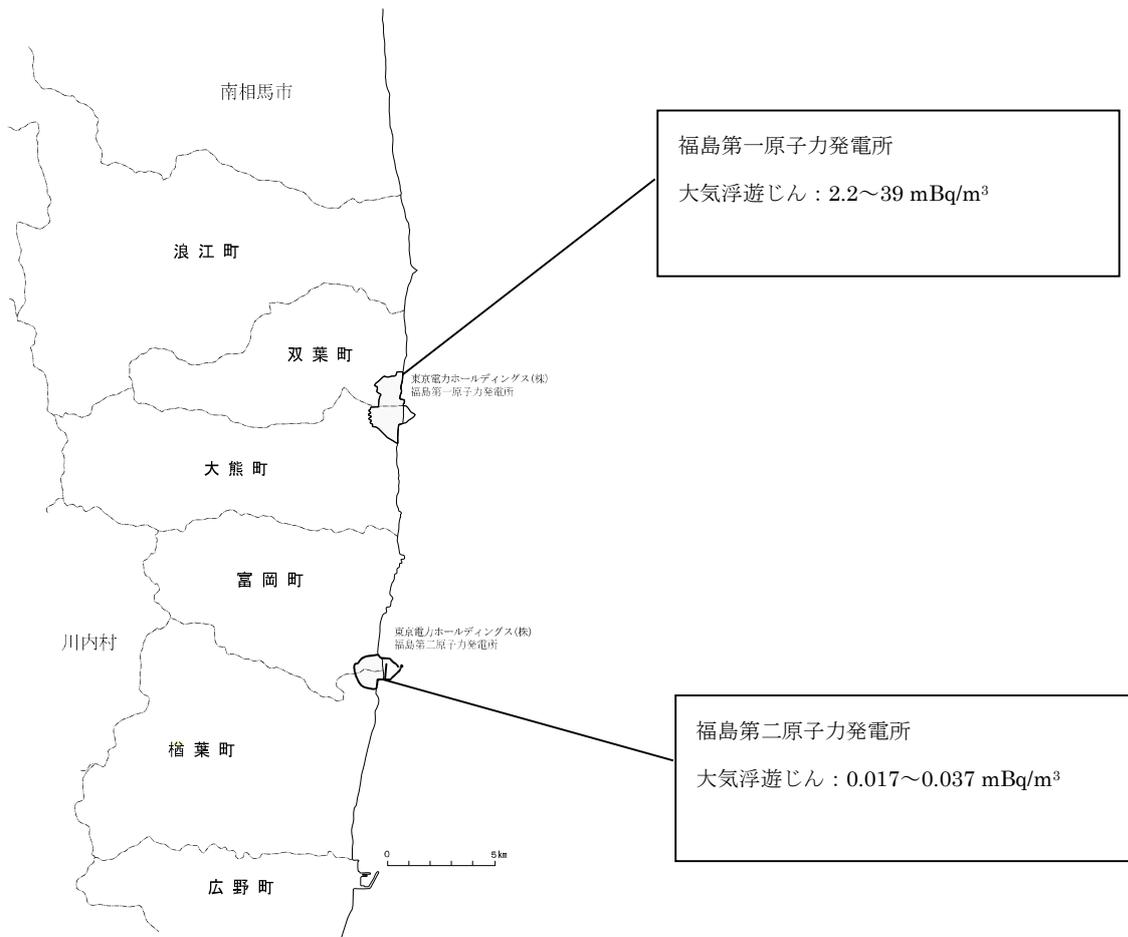


※ 今期の土壌のセシウム-137 の範囲

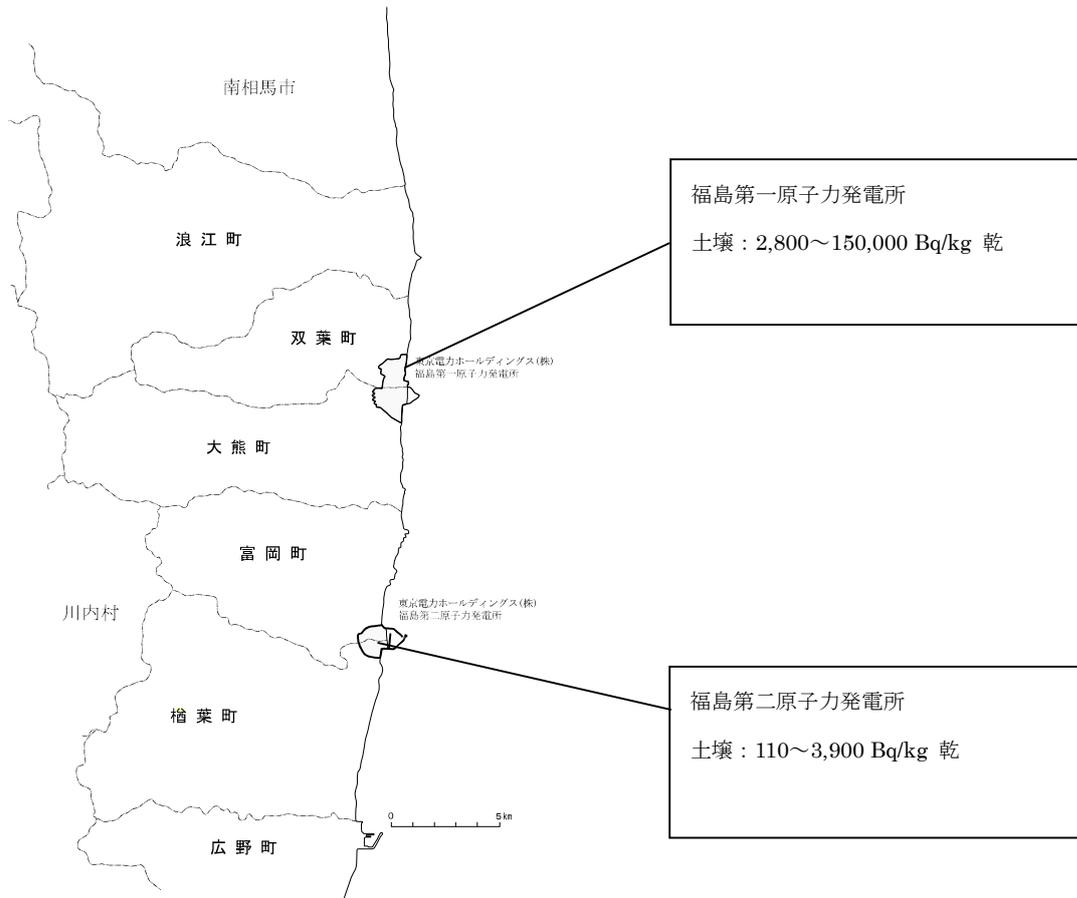


※ 今期の海水及び海底土のセシウム-137 の範囲

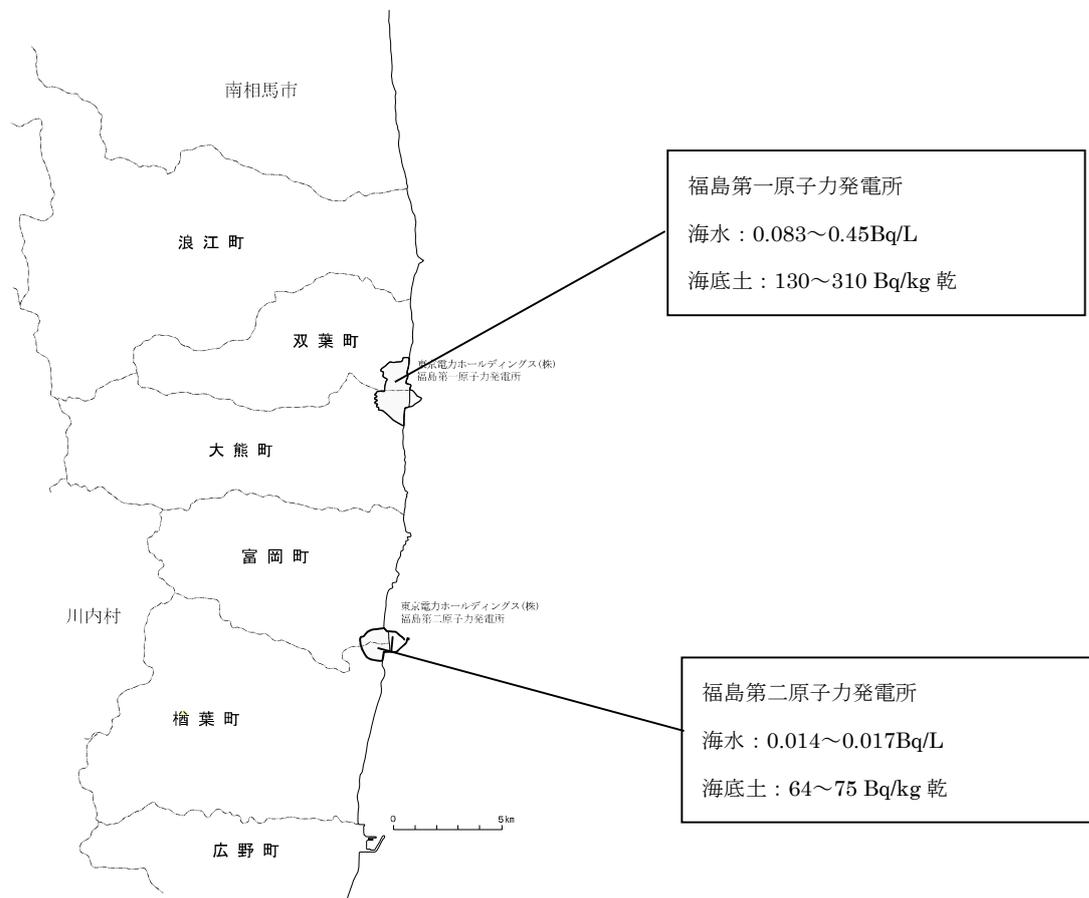





※今期の松葉のセシウム-137 の範囲

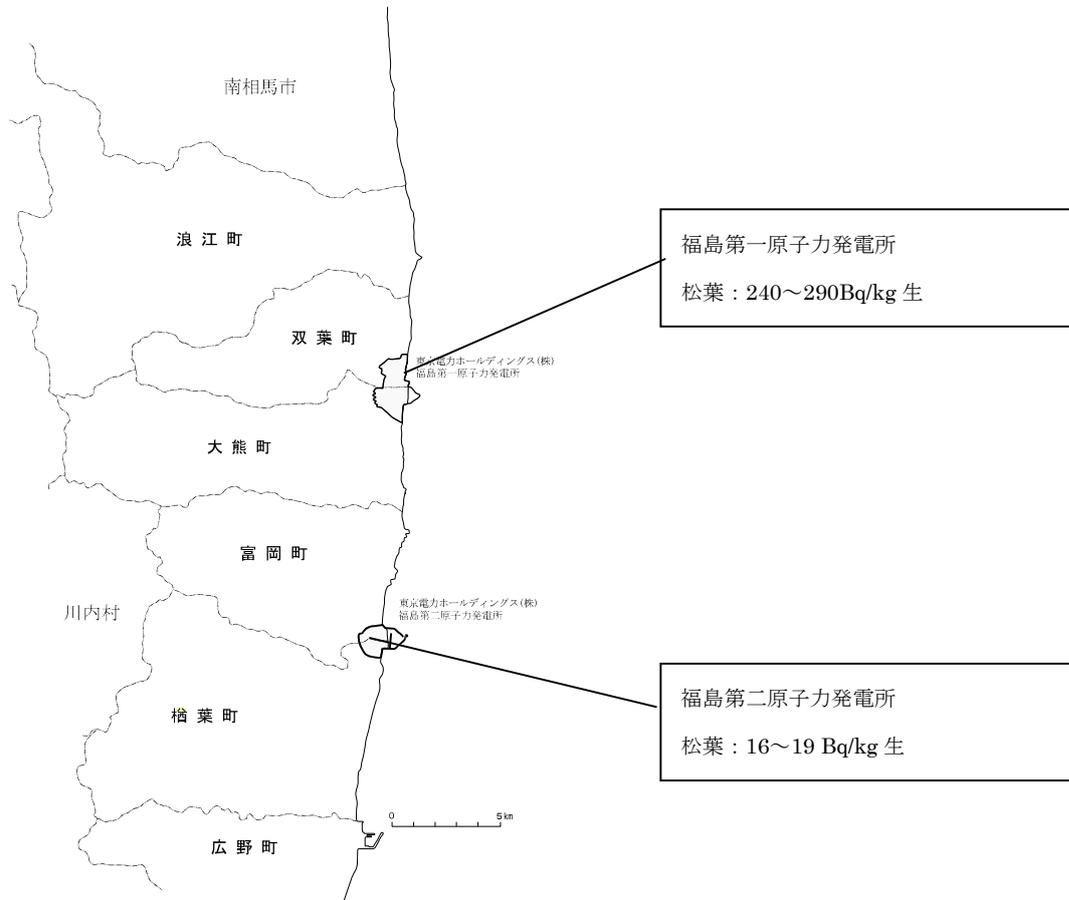

※今期のほんだわらのセシウム-137 の範囲

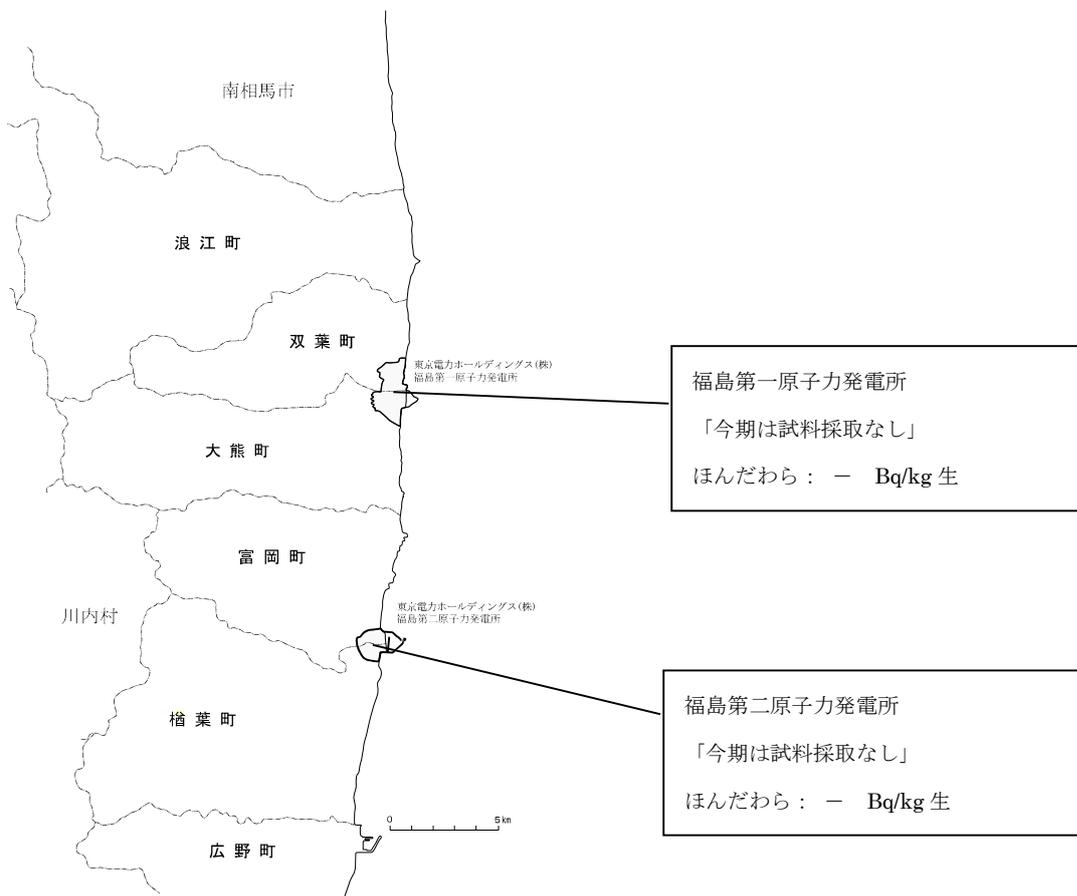





# 福島第一原子力発電所 環境モニタリングトレンドグラフ(1/3)

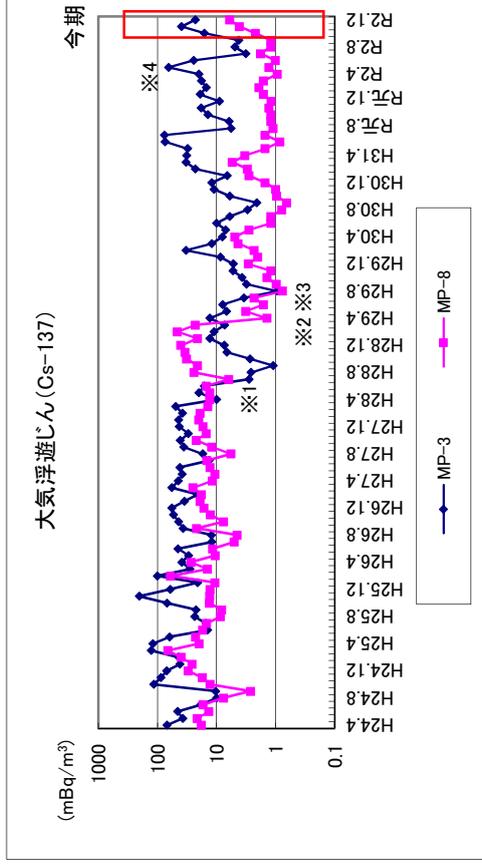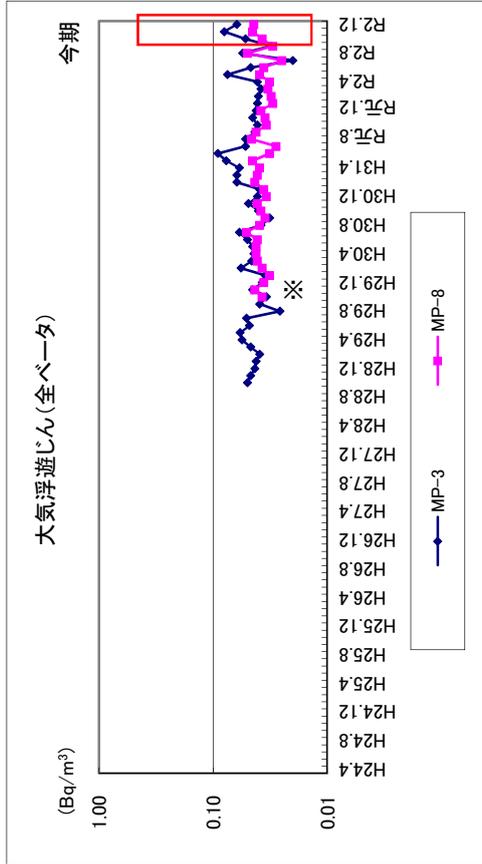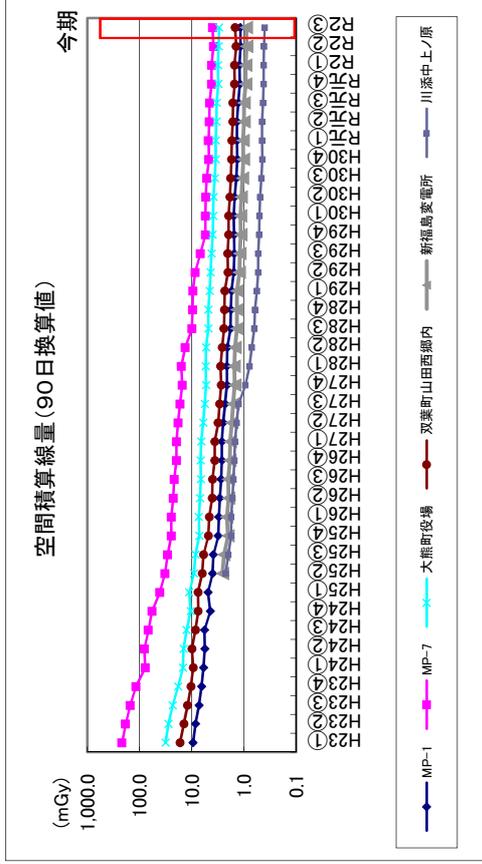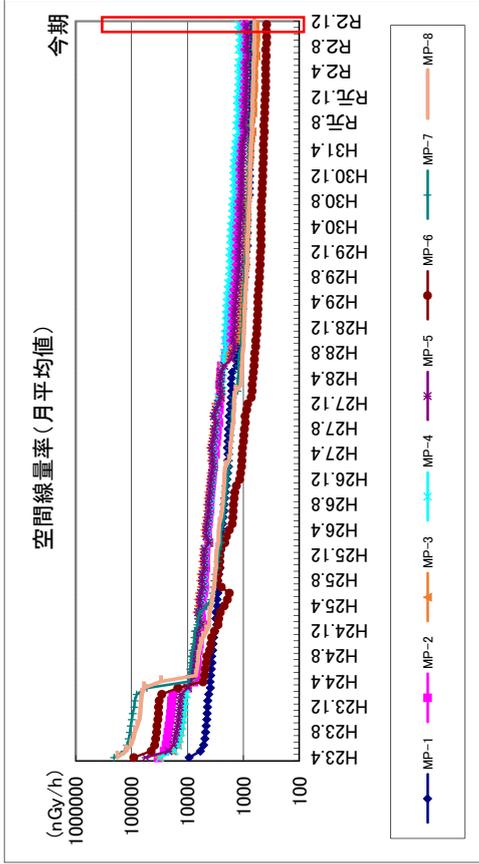

※MP-3は H28年10月より、MP-8はH29年10月より運用開始した。


- ※1: MP-3で機器本体の除染及び検出器並びに吸入配管等の取り替えによる低下(H28年3月完了)
  - ※2: 降雨により地表面からの大気浮遊じんの拡散が抑制されたことによる低下
  - ※3: MP-8で機器本体の除染及び検出器並びに吸入配管等の影響による周辺土壌の舞い上がりによる上昇
  - ※4: MP-3については中間貯蔵施設関連作業等の影響による周辺土壌の舞い上がりによる上昇
- 注: 機器本体や配管の除染・取り替えまでの期間は、事故時に付着した放射性物質が徐々に剥離し、検出部で計数された影響で大気浮遊じん濃度が高く推移したものと推測した。

# 福島第一原子力発電所 環境モニタリングトレンドグラフ(2/3)

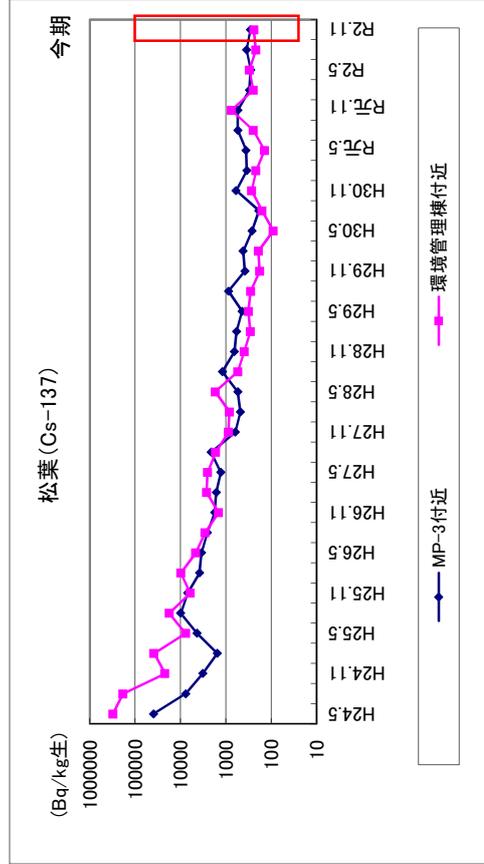
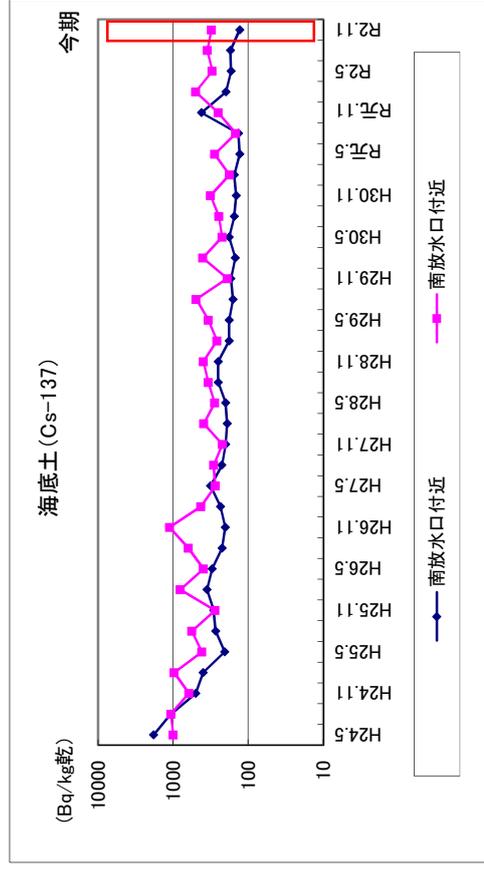
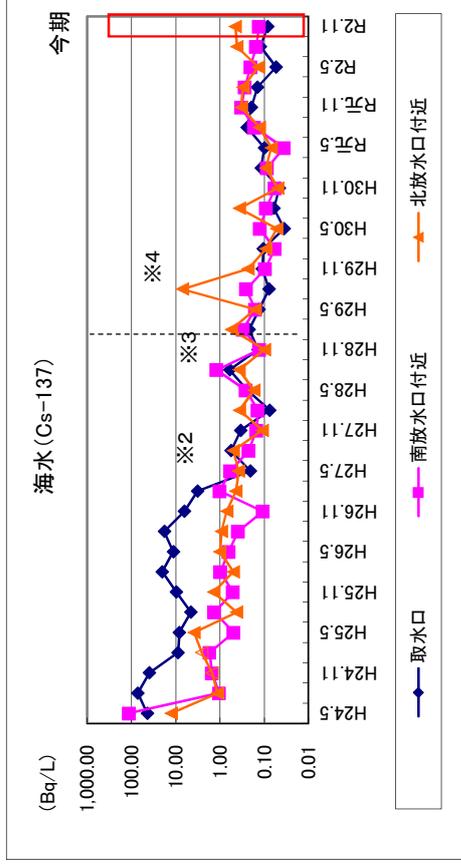
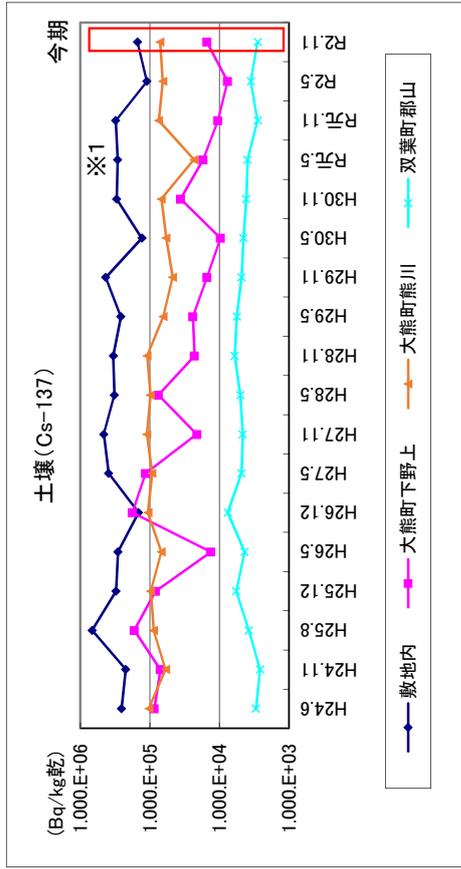


- ・白抜きのプロットは検出限界未満であるため、検出限界値をプロットしている。
- ・海水については、事故後は緊急時の簡易法で分析しており検出限界値が高かったが、平成28年4月(点線)から分析方法を従来の方法に戻し、検出下限値が低下。
- ※1: 熊川、郡山地点は国の中間貯蔵施設対象区域となったことにより採取箇所変更 (R元年第1 四半期より)
- ※2: 取水口・採取地点変更(港湾中央→港湾口: H27.5)
- ※3: 海水については、前回値より上昇が見られますが、試料採取日の前日までの降雨に伴う影響と考えます。(H28.9)
- ※4: 海水については、前回値より上昇が見られますが、試料採取日の当日の降雨に伴う影響と考えます。(H29.8)

# 福島第一原子力発電所 環境モニタリングトレンドグラフ(3/3)




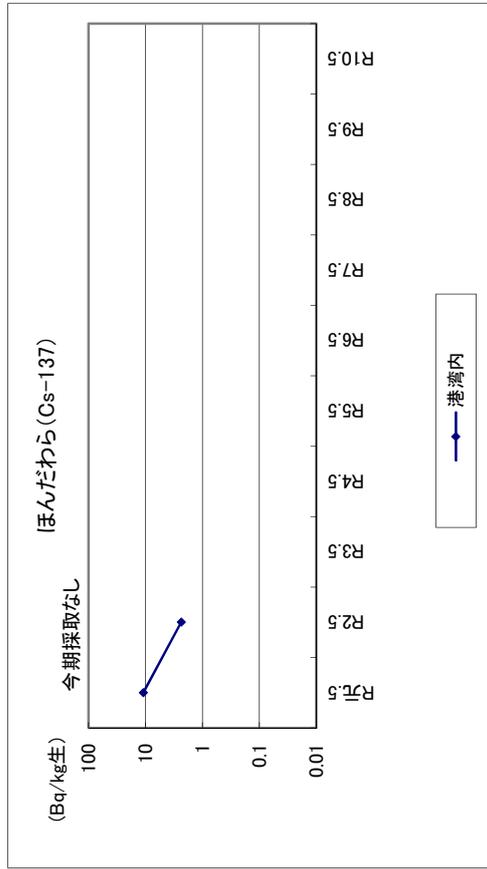


# 福島第二原子力発電所 環境モニタリングトレンドグラフ(1/3)

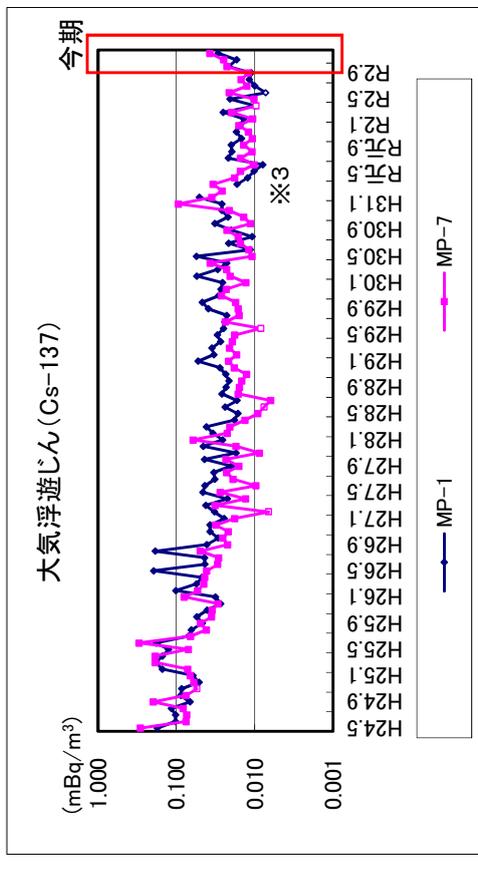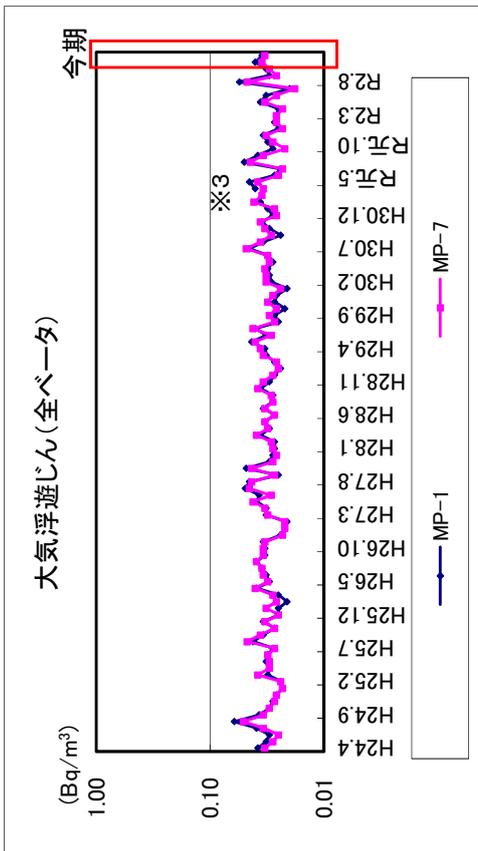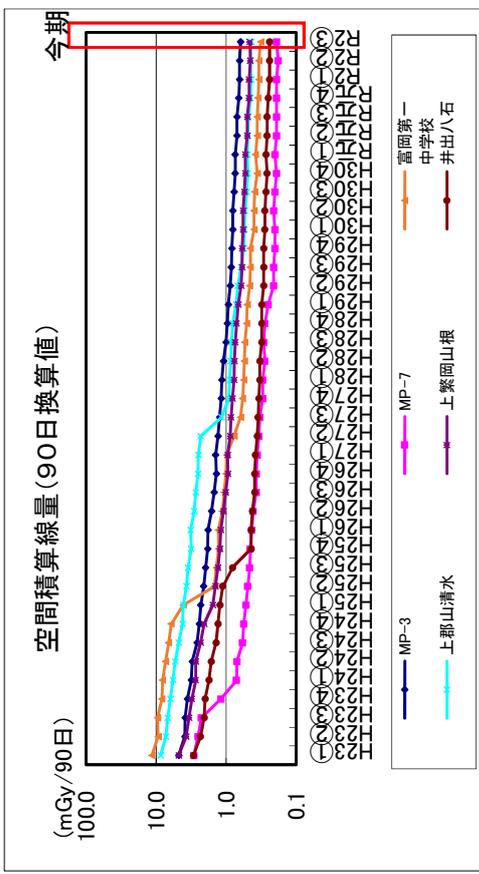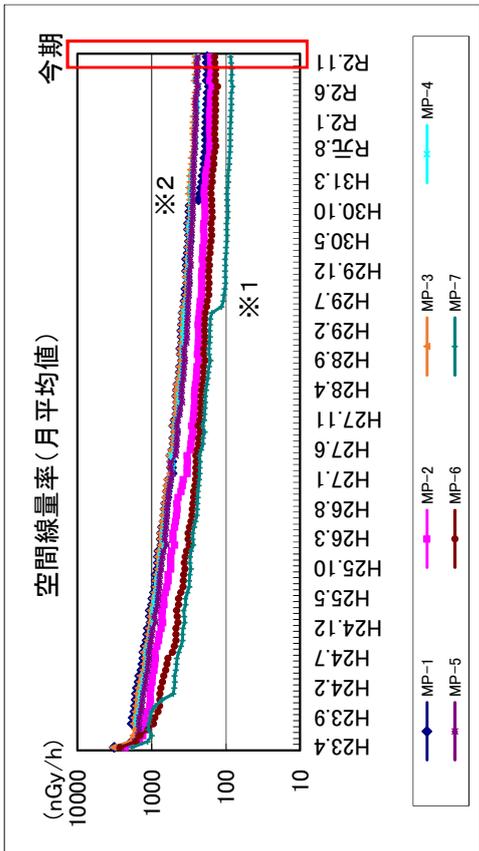


- ・白抜きのプロットは検出下限値未満であるため、検出下限値をプロットしている。
- ※1: MP-7へのアクセス道路及び法面の造成工事による減少。
- ※2: MP-1近傍への大気浮遊じん採取用の局舎設置工事に伴う、伐採・掘削等による減少。
- ※3: 局舎移設工事に伴う欠測。

# 福島第二原子力発電所 環境モニタリングトレンドグラフ(2/3)

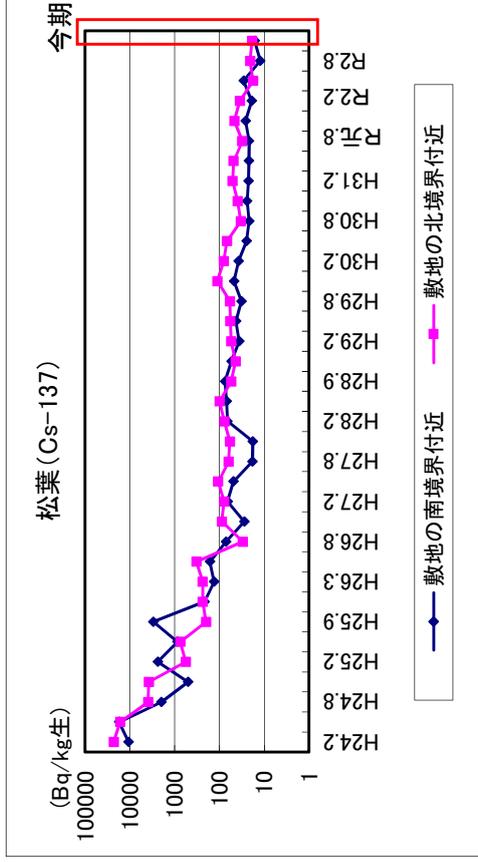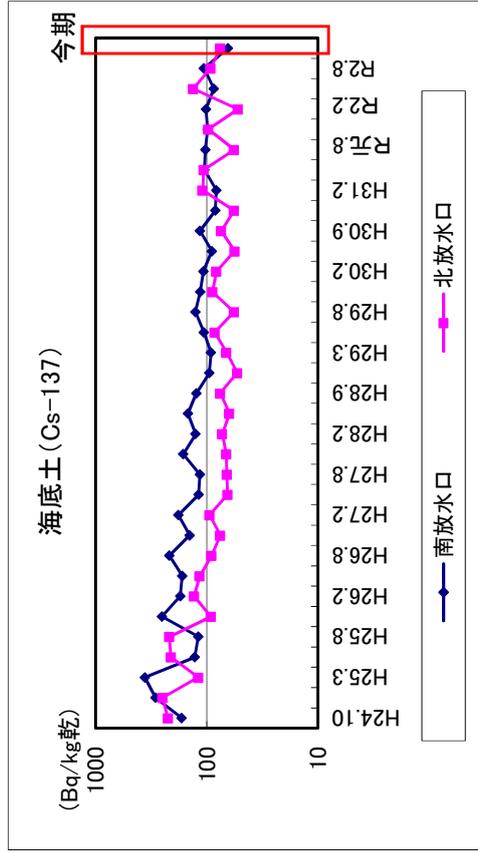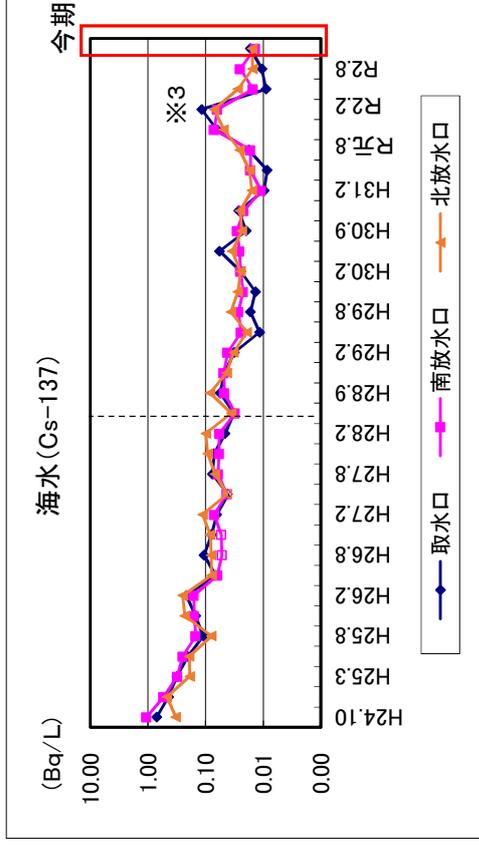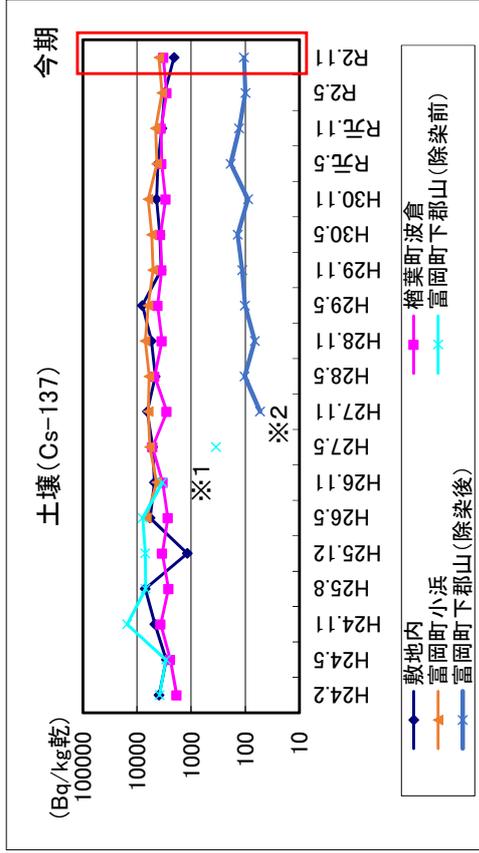

- ・白抜きのプロットは検出下限値未満であるため、検出下限値をプロットしている。
- ・海水については、事故後は緊急時の簡易法で分析しており検出限界値が高かったが、平成28年4月(点線)から分析方法を従来の方法に戻し、検出下限値が低下。
- ※1: 富岡町下郡山地点の除染作業に伴う、表土剥ぎ取りによる減少。(参考値)
- ※2: 富岡町下郡山地点の表土剥ぎ取り後の盛土による減少。
- ※3: 採取前の降雨に伴う、河川からの流入量増加による指示値の変動。

# 福島第二原子力発電所 環境モニタリングトレンドグラフ(3/3)

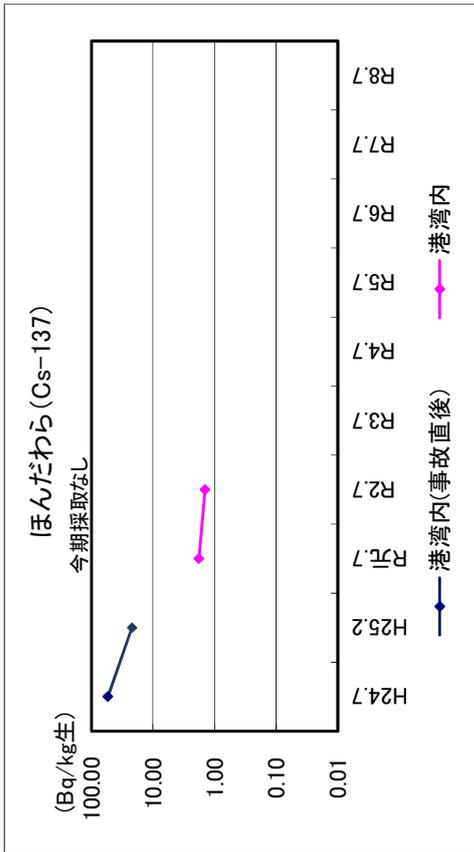

## 第 2 測 定 項 目

### 福 島 第 一 原 子 力 発 電 所 測 定 分

(令和2年10月～令和2年12月)

1 測定項目


(1) 空間放射線

項 目	地点数	測 定 頻 度	実 施 機 関
空 間 線 量 率	8	連 続	東京電力ホールディングス(株) 福島第一廃炉推進カンパニー 福島第一原子力発電所
空 間 積 算 線 量	21	3カ月積算	

(2) 環境試料

区 分	試 料 名	地点数	採取頻度	採取回数 (今期)	測 定 試 料 数							実 施 機 関
					$\gamma$	$^3\text{H}$	$^{90}\text{Sr}$	$^{238}\text{Pu}$	$^{239+240}\text{Pu}$	$^{241}\text{Am}$	$^{244}\text{Cm}$	
大 気 浮 遊 じ ん	大 気 浮 遊 じ ん	2	毎 月	3	6							東京電力ホールディングス(株) 福島第一廃炉推進カンパニー 福島第一原子力発電所
土 壌	土 壌	4	年 2 回	1	4							
海 水	海 水	3	年 4 回	1	3	3						
海 底 土	海 底 土	2	年 4 回	1	2							
指 標 植 物	松 葉	2	年 4 回	1	2							

# 福島第一原子力発電所 環境モニタリング地点図

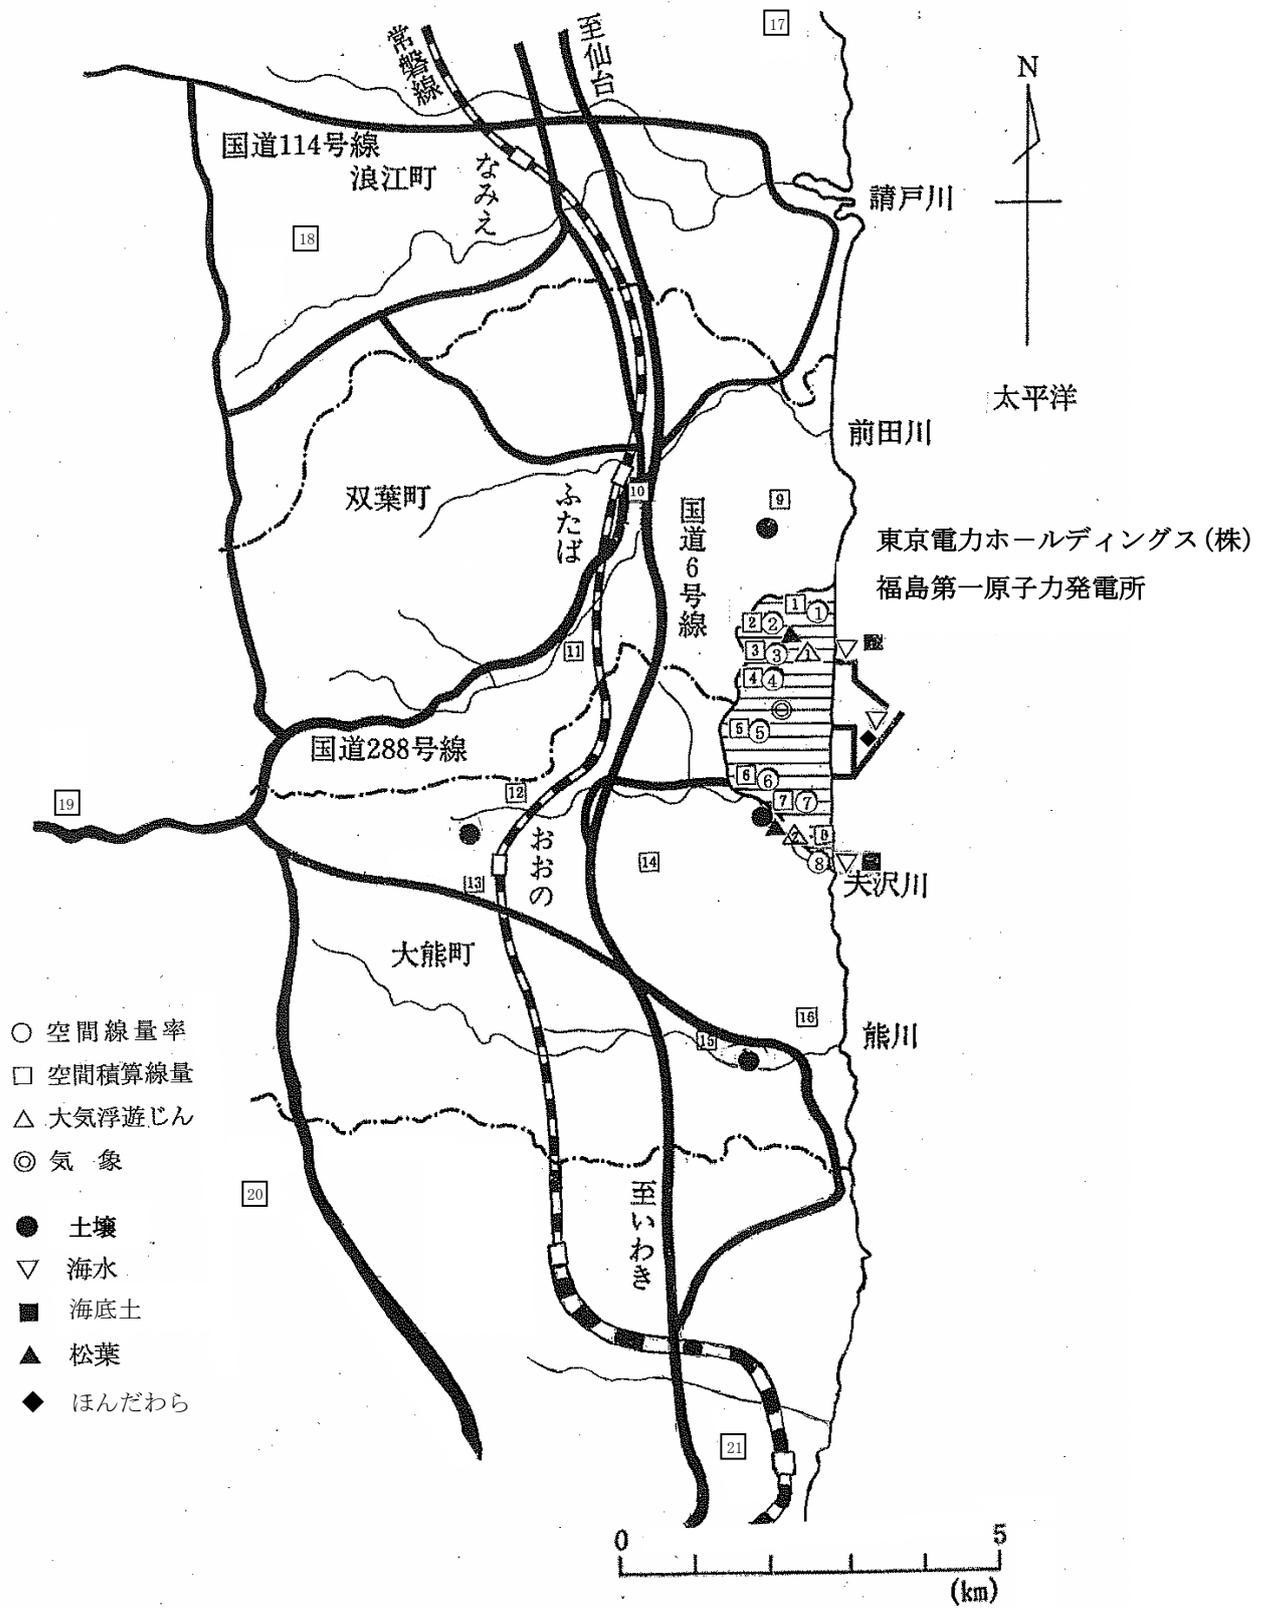

## 福島第二原子力発電所測定分

(令和2年10月～令和2年12月)

### 1. 測定項目


#### (1) 空間放射線

項目	地点数	測定頻度	実施機関
空間線量率	7	連続	東京電力ホールディングス(株) 福島第二原子力発電所
空間積算線量	18	3カ月積算	

#### (2) 環境試料

区分	試料名	地点数	採取頻度	採取回数 (今期)	測定試料数						実施機関	
					$\gamma$	$^3\text{H}$	$^{90}\text{Sr}$	$^{238}\text{Pu}$	$^{239+240}\text{Pu}$	$^{241}\text{Am}$		$^{244}\text{Cm}$
大気浮遊じん	大気浮遊じん	2	毎月	3	6							東京電力ホールディングス (株) 福島第二 原子力発電所
土壌	土壌	4	年2回	1	4							
海水	海水	3	年4回	1	3	3						
海底土	海底土	2	年4回	1	2							
指標植物	松葉	2	年4回	1	2							

福島第二原子力発電所 環境モニタリング地点図

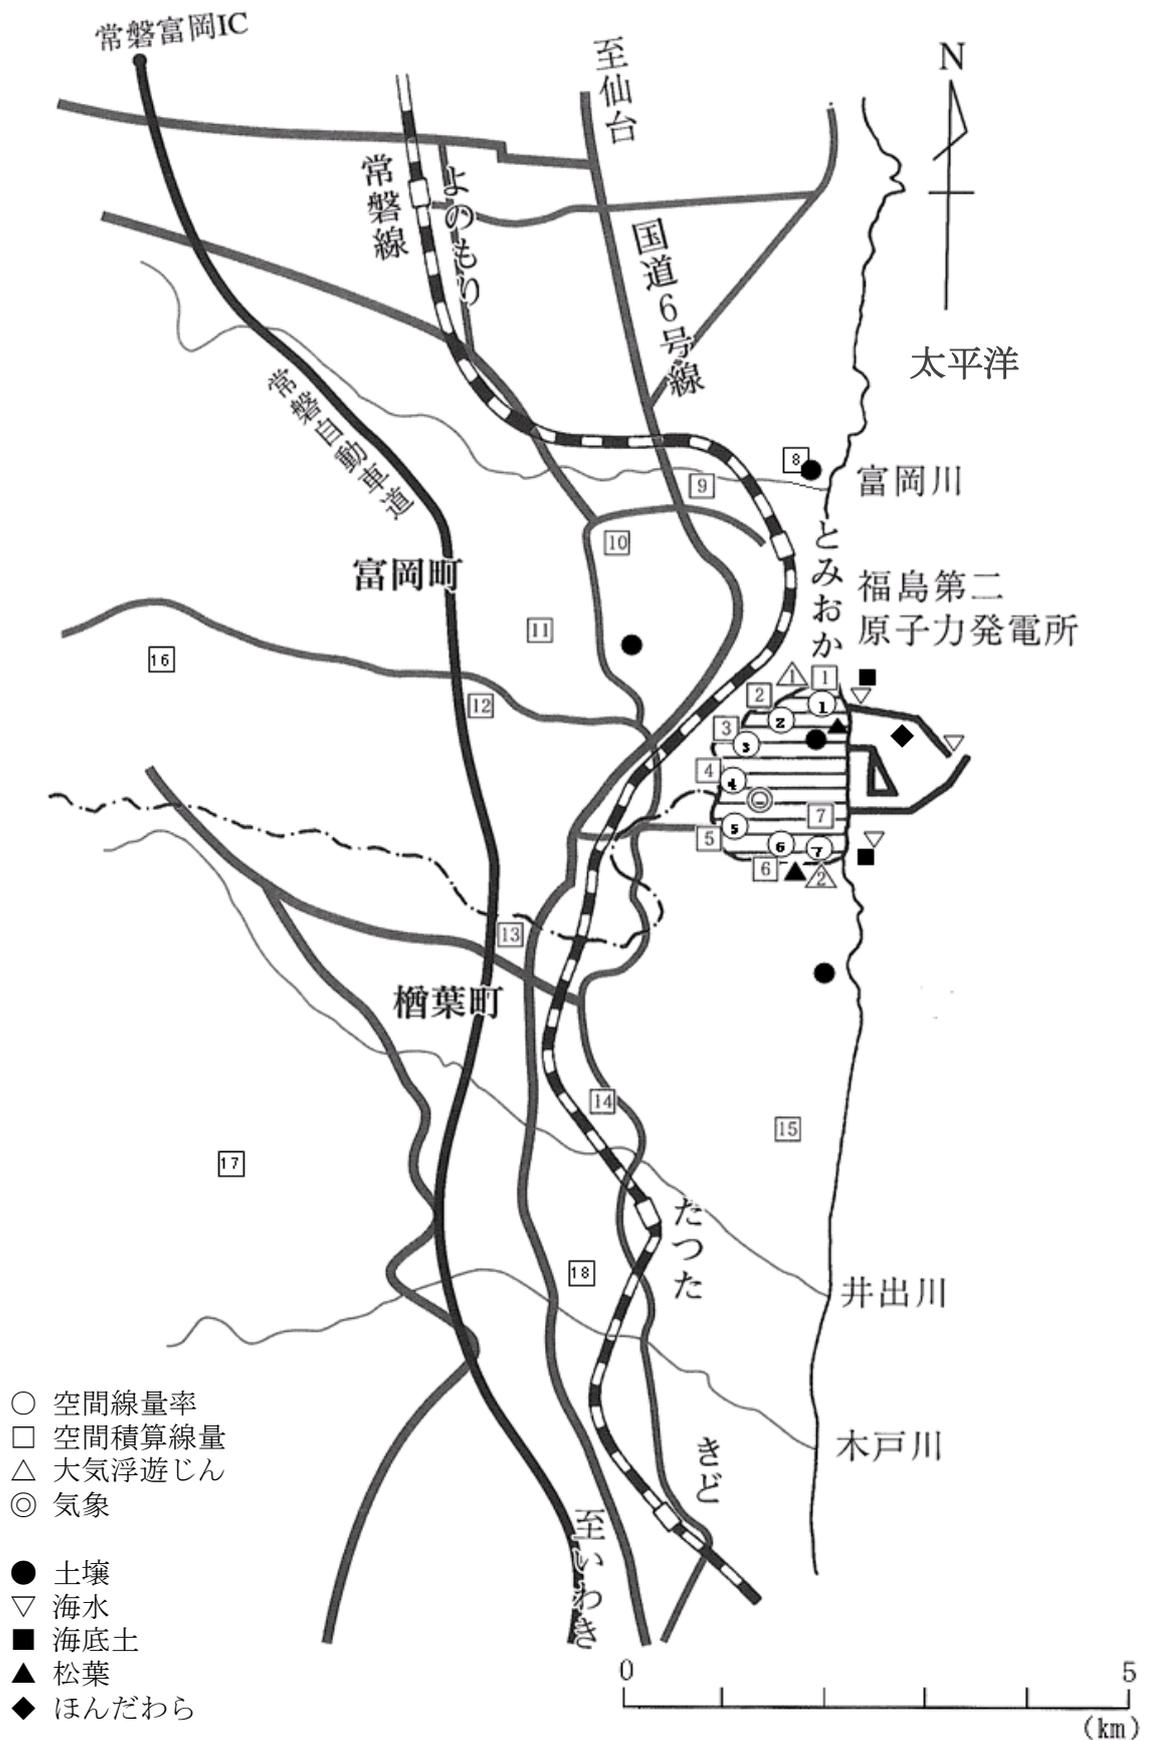

### 第 3 測 定 方 法

福島第一原子力発電所測定方法

測定項目		測定装置	測定方法
空間放射線	空間線量率	モニタリングポスト	検出器：アルゴンガス封入式球形電離箱 (富士電機, 高純度アルゴンガス8気圧140) 測定位置：地表上約1.6m 校正線源：Ra-226
	空間積算線量	蛍光ガラス線量計	測定法：文部科学省編「蛍光ガラス線量計を用いた環境γ線量測定法」 (平成14年制定) 検出器：蛍光ガラス線量計, 旭テクノグラス SC-1 測定器：旭テクノグラス FGD-202 測定位置：地表上約1m 校正線源：Cs-137
環境試料	大気中全アルファ及び全ベータ放射能	ダストモニタ	測定法：6時間連続集じん, 6時間放置後全アルファ及び全ベータ放射能を同時測定 集じん法：ろ紙ステップ式, 使用ろ紙：HE-40T 吸引量：約90m <sup>3</sup> /6時間 検出器：ZnS(Ag)シンチレータとプラスチックシンチレータのほり合わせ検出器 (Aloka ADC-121R2) 採取位置：地表上約3m 校正線源：U <sub>3</sub> O <sub>8</sub> 、Am-241
	核種濃度	Ge半導体検出装置	測定法：文部科学省編「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」(平成4年改訂) 大気浮遊じんは1カ月の集じんろ紙をU8容器に入れ測定。 土壌・海底土は乾燥後に測定。 松葉(指標植物)は生試料により測定。 海水は, リンモリブデン酸アンモニウム法及び二酸化マンガン共沈法で処理後測定。 ほんだわら(指標海洋生物)は乾燥試料により測定。 測定器：Ge半導体検出器 (ORTEC GEM35-76-LB-A-S型) 波高分析器 (SEIKO EG&G MCA-7シリーズ(4096ch))
	ストロンチウム-90濃度	ローバックグラウンドガスフロー計数装置	測定法：文部科学省編「放射性ストロンチウム分析法」のうちイオン交換法(平成15年改訂) 測定器：ローバックグラウンドガスフロー計数装置 (Aloka LBC-4202B型) 校正線源：Sr-90
	プルトニウム-238 プルトニウム-239+240濃度	シリコン半導体検出器	測定法：文部科学省編「放射性プルトニウム分析法」のうちイオン交換法(平成2年改訂) 測定器：ORTEC Alpha Duo 第三者機関(株)化研にて分析
アメリカシウム-241 キュリウム-244濃度	シリコン半導体検出器	測定法：文部科学省編「放射性アメリカシウム分析法」のうちイオン交換法(平成2年改訂) 測定器：ORTEC Alpha Duo 第三者機関(株)化研にて分析	

福島第二原子力発電所測定方法

測定項目		測定装置	測定方法
空間放射線	空間線量率	モニタリングポスト	検出器：2"φ×2"NaI (Tl) シンチレーション検出器 (富士電機, 温度補償・エネルギー補償回路付) 測定位置：地表上約1.6m 校正線源：Cs-137及びRa-226
	空間積算線量	蛍光ガラス線量計	測定法：文部科学省編「蛍光ガラス線量計を用いた環境γ線量測定法」(平成14年制定) 検出器：蛍光ガラス線量計, 旭テクノグラス SC-1 測定器：旭テクノグラス FGD-202 測定位置：地表上約1m 校正線源：Cs-137
環境試料	大気浮遊全放射能 遊ばすじんアルファベータ放射能	ダストモニタ	測定法：6時間連続集じん, 6時間放置後全アルファ及び全ベータ放射能を同時測定 集じん法：ろ紙ステップ式, 使用ろ紙：HE-40T 吸引量：約90m <sup>3</sup> /6時間 検出器：ZnS (Ag) シンチレータとプラスチックシンチレータの はり合わせ検出器 (Aloka ADC-121R2) 採取位置：地表上約3m 校正線源：U <sub>3</sub> O <sub>8</sub>
	核種濃度	Ge半導体検出装置	測定法：文部科学省編「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」(平成4年改訂) 大気浮遊じんは1カ月の集じんろ紙をU8容器に入れ測定。 土壌・海底土は乾燥後に測定。 松葉(指標植物)は生試料により測定。 海水は, リンモリブデン酸アンモニウム法及び二酸化マンガ 共沈法で処理後測定。 ほんだわら(指標海洋生物)は乾燥試料により測定。 測定器：Ge半導体検出器 (ORTEC GEM35-76-LB-A-S型) 波高分析器 (SEIKO EG&G MCA-7シリーズ(4096ch))
	ストロンチウム-90濃度	ローバックグラウンド 液体シンチレーション 検出装置	測定法：文部科学省編「トリチウム分析法」(平成14年改訂) 海水のトリチウムは蒸留後測定。 測定器：ローバックグラウンド液体シンチレーション検出装置 (Aloka LSC-LB7型)
	ストロンチウム-90濃度	ローバックグラウンド ガスフロー計数装置	測定法：文部科学省編「放射性ストロンチウム分析法」 のうちイオン交換法(平成15年改訂) 測定器：Aloka LBC-420, LBC-4202B 校正線源：Sr-90
	プルトニウム-238 プルトニウム- 239+240濃度	シリコン半導体検出器	測定法：文部科学省編「放射性プルトニウム分析法」 のうちイオン交換法(平成2年改訂) 測定器：ORTEC Alpha Duo 第三者機関(株)化研にて分析
アメリシウム-241 キュリウム-244濃度	シリコン半導体検出器	測定法：文部科学省編「放射性アメリシウム分析法」 のうちイオン交換法(平成2年改訂) 測定器：ORTEC Alpha Duo 第三者機関(株)化研にて分析	

**環境試料放射能測定方法詳細一覧表**  
**(Cs-134、Cs-137・ストロンチウム-90・**  
**プルトニウム-238、239+240・アメリシウム-241・キュリウム-244)**

項目	試料名 核種	大気浮遊じん		土壌				
		Cs-134、Cs-137	Cs-134、Cs-137	Sr-90	Pu-238	Pu-238+240	Am-241	Cm-244
試料採取	採取方法	ダストモニタによる連続採取 ・採取位置:地表上約3m	採取は採取器などを用い、裸未耕土の表層深さ(0mmから50mm)から一地点あたり5~6箇所より、採取する。					
	採取容器等	ろ紙(HE-40T)	採土器					
	採取量	11,000m <sup>3</sup> 程度	福島第一:1.0kg程度 福島第二:3kg程度					
	現場での前処理 (酸などの薬品添加を実施しているか)	なし	なし					
	採取器具のコンタミ防止 (試料採取器具を適切に使用しているか)	試料毎に分けて採取している。	福島第一 採土器を地点毎に用意し、使用している。 福島第二 採土器は共用している。なお、採取の都度、洗浄を行っている。					
前処理	方法	1ヶ月分の集じんろ紙の集じん箇所を打ち抜き型を用いて打ち抜き、U8容器に収納する。	105℃に調整した乾燥機で乾燥し放冷し、インクリメント縮分方法により縮分する。	105℃に調整した乾燥機で乾燥し放冷し、インクリメント縮分方法により縮分した試料を用いてイオン交換法。	105℃に調整した乾燥機で乾燥し放冷し、インクリメント縮分方法により縮分した試料を用いてイオン交換法。	105℃に調整した乾燥機で乾燥し放冷し、インクリメント縮分方法により縮分した試料を用いてイオン交換法。	105℃に調整した乾燥機で乾燥し放冷し、インクリメント縮分方法により縮分した試料を用いてイオン交換法。	
	分取、縮分の代表性 (高濃度試料分析の際に、試料を分取して測定している場合)	50φミリの円の中心から47φミリの円を打ち抜き、88.36%を採取する。ろ紙には均一に採取されている。						
	前処理でのコンタミ防止とその確認法	・打ち抜きに使用する器具は、地点ごとに分けて使用している。 ・U8容器は、新品を使用しラッピングしている。 ・定期的に、施設の汚染確認を行い、問題ないことを確認している。	・試料毎に、U8容器は新品を使用しラッピングしている。 ・定期的に、施設の汚染確認を行い、問題ないことを確認している。	・試料毎に、ステンレス皿は新品を使用している。 ・定期的に、施設の汚染確認を行い、問題ないことを確認している。	・分取、縮分については、地点ごと機材を使い分けを実施しコンタミ防止している。 ・使用する機材について確実な洗浄を行っている。 ・電着板については、新品の物を使用している。	・分取、縮分については、地点ごと機材を使い分けを実施しコンタミ防止している。 ・使用する機材について確実な洗浄を行っている。 ・電着板については、新品の物を使用している。	・分取、縮分については、地点ごと機材を使い分けを実施しコンタミ防止している。 ・使用する機材について確実な洗浄を行っている。 ・電着板については、新品の物を使用している。	・分取、縮分については、地点ごと機材を使い分けを実施しコンタミ防止している。 ・使用する機材について確実な洗浄を行っている。 ・電着板については、新品の物を使用している。
	測定装置	Ge半導体検出装置	Ge半導体検出装置	ローバックグラウンドガスフロー計数装置	シリコン半導体検出器			
測定	測定試料状態	生	乾土	鉄共沈物	イオン交換分離溶液 (電着用試料)	イオン交換分離溶液 (電着用試料)	イオン交換分離溶液 (電着用試料)	イオン交換分離溶液 (電着用試料)
	測定容器	U8容器	U8容器	ステンレス皿(25mmφ)	電着板 ステンレス鋼製(35mmφ)	電着板 ステンレス鋼製(35mmφ)	電着板 ステンレス鋼製(35mmφ)	電着板 ステンレス鋼製(35mmφ)
	供試料量	測定吸気量:約90m <sup>3</sup> /6h (ろ紙枚数:約124枚)	約100g	100g	約50g			
	測定時間	80,000秒	福島第一 (敷地内)1,000秒 (その他)3,600秒 福島第二 3,600秒	3,600秒	80,000秒			
	測定下限値	福島第一 Cs-134:0.0047~0.032mBq/m <sup>3</sup> Cs-137:0.0068~0.034mBq/m <sup>3</sup> 福島第二 Cs-134:0.0050~0.0064mBq/m <sup>3</sup> Cs-137:0.0048~0.0070mBq/m <sup>3</sup>	福島第一 Cs-134:46~190Bq/kg乾 Cs-137:40~190Bq/kg乾 福島第二 Cs-134:4.2~18Bq/kg乾 Cs-137:4.2~14Bq/kg乾	福島第一 0.17~0.29Bq/kg乾 福島第二 0.20~0.22 Bq/kg乾	福島第一 0.013Bq/kg乾 福島第二 0.012~0.014Bq/kg乾	福島第一 0.012Bq/kg乾 福島第二 0.011~0.013Bq/kg乾	福島第一 0.011~0.012Bq/kg乾 福島第二 0.011~0.012Bq/kg乾	福島第一 0.010~0.013Bq/kg乾 福島第二 0.011~0.013Bq/kg乾
	測定におけるコンタミ防止とその確認法	定期的にGe半導体検出器においてBG測定を行い、汚染のないことを確認している。	定期的にGe半導体検出器においてBG測定を行い、汚染のないことを確認している。	試料毎に新品のステンレス皿を使用し、検出器の汚染については、測定時にBG測定を行っている。	試料毎に新品の電着板を使用している。また、検出器の汚染については、BG測定を行っている。	試料毎に新品の電着板を使用している。また、検出器の汚染については、BG測定を行っている。	試料毎に新品の電着板を使用している。また、検出器の汚染については、BG測定を行っている。	試料毎に新品の電着板を使用している。また、検出器の汚染については、BG測定を行っている。
	校正	使用線源 Co-58.60Mn-54, Ba-133,Cs-137 日本アイソトープ協会製造のJCSS校正証明書付きの標準線源を使用している。 これによりトレーサビリティを担保している。	Co-58.60Mn-54, Ba-133,Cs-137	Sr-90	Pu-242	Pu-242	Am-243	Am-243
線源校正頻度	(納入時)体積線源で幾何効率校正。 コイン線源で計数効率校正。 (半年毎)コイン線源で計数効率校正。	(納入時)体積線源で幾何効率校正。 コイン線源で計数効率校正。 (半年毎)コイン線源で計数効率校正。	(納入時)メーカーにて効率校正。 (1年毎)メーカー一点検時に密封線源にて効率確認。	1回/年エネルギー校正を実施している。	1回/年エネルギー校正を実施している。	1回/年エネルギー校正を実施している。	1回/年エネルギー校正を実施している。	
BG測定頻度	1回/月 200,000秒	福島第一 1回/月 50,000秒 福島第二 1回/月 200,000秒	測定の都度	本業務開始前 及び1回/月	本業務開始前 及び1回/月	本業務開始前 及び1回/月	本業務開始前 及び1回/月	
備考	【福島第一】 平成29年9月より測定時間変更 (3600秒→80000秒)	【福島第一、福島第二】 平成26年度より乾燥機での前処理を再開	【福島第一、福島第二】 平成25年度より測定を再開	【福島第一、福島第二】 平成26年度より測定を開始				

項目	試料名 核種	海水			海底土		松葉	ほんだわら
		Ce-134, Ce-137	H-3	Sr-90	Ce-134, Ce-137	Sr-90	Ce-134, Ce-137	Ce-134, Ce-137
試料採取	採取方法	採取地点で表面水をポリ容器に汲み取り攪拌し、20Lキュービテナー容器に分取する。	表面水をポリ容器に汲み取り攪拌し、2Lポリ容器に分取する。	表面水をポリ容器に汲み取り攪拌し、20Lキュービテナー容器に分取する。	採取地点で波打ち際の海砂をスコップ等により、ビニール袋に採取する。	採取地点で波打ち際の海砂をスコップ等により、ビニール袋に採取する。	採取地点付近にある樹木より2年葉を採取する。	採取地点付近にあるほんだわらを採取する。 (種類:ほんだわら又はまめだわら)
	採取容器等	キュービテナー	ポリビン	キュービテナー	ビニール袋	ビニール袋	ビニール袋	ビニール袋
	採取量	40L	2L	40L	1kg程度	1kg程度	0.1kg程度	2kg程度
	現場での前処理(酸などの薬品添加を実施しているか)	海水1Lに対し1mLの濃硫酸を添加	なし	海水1Lに対し1mLの濃硫酸を添加	なし	なし	なし	なし
	採取器具のコンタミ防止(試料採取器具を適切に使用しているか)	採取容器については、採取地点毎に新品の容器を使用し、試料水にて共洗いを実施している。	採取容器については、採取地点毎に新品の容器を使用し、試料水にて共洗いを実施している。	採取容器については、採取地点毎に新品の容器を使用し、試料水にて共洗いを実施している。	福島第一探泥器は地点毎に用意し、使用している。 福島第二探泥器は共用している。なお、採取の都度、洗浄を行っている。	福島第一探泥器は地点毎に用意し、使用している。 福島第二探泥器は共用している。なお、採取の都度、洗浄を行っている。	採取地点毎に新品の袋に採取している。	新品の袋に採取している。
前処理	方法	リンモリブデン酸アンモニウム法及び二酸化マンガンを共沈法	減圧蒸留法	イオン交換法	105℃に調整した乾燥機で乾燥し放冷し、インクリメント縮分方法により縮分する。	105℃に調整した乾燥機で乾燥し放冷し、インクリメント縮分方法により縮分した試料を用いてイオン交換法。	はさみを使用し、細かく切断しU8容器に収納する。 (灰化せず生状態で測定)	・ほんだわらを水洗いし、虫やゴミ等を除去する。 ・洗濯ネットに入れ、洗濯機で脱水する。
	分取、縮分の代表性(高濃度試料分析の際に、試料を分取して測定している場合)	20Lキュービテナー2本から15Lずつ分取。	1Lポリビンより上澄水100mLを分取。	20Lキュービテナー2本全量使用。	1地点当たり数箇所から採取した試料から均等に分取している。(インクリメント縮分法)	1地点当たり数箇所から採取した試料を混合し、さらに、その試料から均等に分取している。(インクリメント縮分法)	採取した約100gの松葉から、U8容器に40gを分取している。	・乾燥ほんだわらをステンレスバッドに500g相当を入れ105℃で一晩乾燥する。 ・乾燥ほんだわらをミキサーで粉碎しU8容器に充填する。 【試料は複数の個体から少量ずつ分取し、はさみで切る。その後十分混合してから定量を各容器に充填する。】
	前処理でのコンタミ防止とその確認法	・試料毎に、U8容器は新品を使用しラッピングしている。 ・定期的に、施設の汚染確認を行い、問題ないことを確認している。	・試料の処理前に、使用する器具の洗浄と乾燥を実施している。 ・定期的に、施設の汚染確認を行い、問題ないことを確認している。	・試料毎に、ステンレス皿は新品を使用している。 ・定期的に、施設の汚染確認を行い、問題ないことを確認している。	・試料毎に、U8容器は新品を使用しラッピングしている。 ・定期的に、施設の汚染確認を行い、問題ないことを確認している。	・試料毎に、ステンレス皿は新品を使用している。 ・定期的に、施設の汚染確認を行い、問題ないことを確認している。	・試料毎に、U8容器は新品を使用しラッピングしている。 ・定期的に、施設の汚染確認を行い、問題ないことを確認している。	・U8容器は、新品を使用しラッピングしている。 ・定期的に、施設の汚染確認を行い、問題ないことを確認している。
	測定装置	Ge半導体検出装置	ローバックグラウンド液体シンチレーション検出装置	ローバックグラウンドガスフロー計数装置	Ge半導体検出装置	ローバックグラウンドガスフロー計数装置	Ge半導体検出装置	Ge半導体検出装置
測定	測定試料状態	リンモリブデン酸アンモニウムと二酸化マンガンの混合物	液体シンチレーション混合物	鉄共沈物	乾土	鉄共沈物	生	乾燥物
	測定容器	U8容器	100mLバイアル	ステンレス皿(25mmφ)	U8容器	ステンレス皿(25mmφ)	U8容器	U8容器
	供試料量	約30L	50mL	40L	約100g	100g	約40g	約500g
	測定時間	80,000秒	30,000秒	3,600秒	80,000秒	3,600秒	10,000秒	80,000秒
	測定下限値	福島第一 Ce-134:0.0013~0.0017Bq/L Ce-137:0.0014~0.0018Bq/L 福島第二 Ce-134:0.0013~0.0021Bq/L Ce-137:0.0012~0.0016Bq/L	福島第一 0.34~0.39Bq/L 福島第二 0.34~0.37Bq/L	福島第一 0.00063~0.00065Bq/L 福島第二 0.00058~0.00060Bq/L	福島第一 Ce-134:0.58~0.87Bq/kg乾 Ce-137:0.63~0.91Bq/kg乾 福島第二 Ce-134:0.55~0.68Bq/kg乾 Ce-137:0.59~0.79Bq/kg乾	福島第一 0.19~0.20Bq/kg乾 福島第二 0.18~0.19Bq/kg乾	福島第一 Ce-134:4.8~7.3Bq/kg生 Ce-137:4.6~6.8Bq/kg生 福島第二 Ce-134:3.2~5.9Bq/kg生 Ce-137:3.3~6.2Bq/kg生	福島第一 Ce-134:0.18Bq/kg生 Ce-137:0.21Bq/kg生 福島第二 Ce-134:0.11Bq/kg生 Ce-137:0.14Bq/kg生
	測定におけるコンタミ防止とその確認法	定期的にGe半導体検出器においてBG測定を行い、汚染のないことを確認している。	試料毎に新品のバイアル瓶を使用し、検出器の汚染については、測定時にBG測定を行っている。	試料毎に新品のステンレス皿を使用し、検出器の汚染については、測定時にBG測定を行っている。	定期的にGe半導体検出器においてBG測定を行い、汚染のないことを確認している。	定期的にGe半導体検出器においてBG測定を行い、汚染のないことを確認している。	定期的にGe半導体検出器においてBG測定を行い、汚染のないことを確認している。	定期的にGe半導体検出器においてBG測定を行い、汚染のないことを確認している。
	使用線源	Co-58.60,Mn-54, Ba-133,Cs-137	H-3	Sr-90	Co-58.60,Mn-54, Ba-133,Cs-137	Sr-90	Co-58.60,Mn-54, Ba-133,Cs-137	Co-58.60,Mn-54, Ba-133,Cs-137
校正	日本アイントープ協会製造のJCSS校正証明書付きの標準線源を使用している。 これによりトレーサビリティを担保している。							
	線源校正頻度	(納入時)体積線源で幾何効率校正。コイン線源で計数効率校正。 (半年毎)コイン線源で計数効率校正。	(納入時)メーカーにて効率校正。 (1年毎)メーカー一点検時に密封線源にて効率確認。	(納入時)メーカーにて効率校正。 (1年毎)メーカー一点検時に密封線源にて効率確認。	(納入時)体積線源で幾何効率校正。コイン線源で計数効率校正。 (1年毎)メーカー一点検時に密封線源にて効率確認。	(納入時)メーカーにて効率校正。 (半年毎)コイン線源で計数効率校正。	(納入時)体積線源で幾何効率校正。コイン線源で計数効率校正。 (半年毎)コイン線源で計数効率校正。	(納入時)体積線源で幾何効率校正。コイン線源で計数効率校正。 (半年毎)コイン線源で計数効率校正。
	BG測定頻度	1回/月 200,000秒	測定の都度	測定の都度	1回/月 200,000秒	測定の都度	福島第一 1回/月 50,000秒 福島第二 1回/月 200,000秒	1回/月 200,000秒
備考	【福島第一、福島第二】 平成28年第1四半期より前処理を再開(マリネリ-リンモリブデン酸アンモニウム法及び二酸化マンガンを共沈法)	-	【福島第一、福島第二】 平成25年度より測定を再開	【福島第一、福島第二】 平成26年度より乾燥機での前処理を再開及び測定時間変更(3600秒→8000秒)	【福島第一、福島第二】 平成25年度より測定を再開	【福島第一】 平成29年第1四半期より測定時間変更(3600秒→10000秒)	【福島第二】 平成26年第3四半期より測定時間変更(3600秒→10000秒)	令和元年度より測定を再開

## 第 4 測 定 結 果

### 1. 空間放射線

#### (1) 空間線量率

東京電力ホールディングス（株）福島第一原子力発電所敷地境界 8 地点、福島第二原子力発電所敷地境界 7 地点で電離箱検出器またはNaIシンチレーション検出器により空間線量率を常時測定しました。

各地点の測定結果は以下のとおりです。

詳細な測定値は、福島第一25ページ、福島第二30ページを参照

#### ア. 月間平均値

各測定地点における月間平均値は、全ての地点において福島第一原子力発電所の事故（以下「事故」という。）の影響により、依然として事故前の月間平均値を上回っています。また、9月と10月は降雨が多く、11月と12月は降雨が少なかったことから、線量率に変動が見られますが、概ね前四半期と同程度の値となっています。

空間線量率の月間平均値

(単位：nGy/h)

機関名	測定地点数	月間平均値			過去の月間平均値		
		10 月	11 月	12 月	H26～	事故直後	事故前
福島第一原子力発電所	*1 8	381～ 1,146	385 ～ 1,203	382 ～ 1,216	384 ～ 4,893	1,785 ～ 204,134	31 ～ 45
		事故直後の最大値と比較すると今期最大値は約1/168に減少					
福島第二原子力発電所	7	83 ～ 252	85 ～ 261	86 ～ 260	81 ～ 767	274 ～ 13,695	37 ～ 49
		事故直後の最大値と比較すると今期最大値は約1/52に減少					

(注) 1. 「過去の測定値の範囲」は、

H26～：平成26年度から前四半期まで。

事故直後：事故後（平成23年3月11日）から平成25年度まで。

事故前：平成13年9月から事故前（平成23年3月10日）まで。

- \* 1. 福島第一原子力発電所 MP-7, 8 については、高線量率の環境下にあることから、新たな放出によって上空を通過する放射性物質を検知しやすくするため、検出器廻りに遮へいを設置し、地表面等からの放射線の影響を抑えています。

#### イ. 1時間値の変動状況

各測定地点における1時間値は、降雨等の影響による変動があるものの発電所からの放射性物質の放出などに由来する変動はありませんでした。

また、1時間値は、従来降雨により線量率の上昇があると考えられますが、事故以降の線量の高い点においては、降雨によって地表からの放射線が遮へいされることによる線量低下の方が大きいため、一時的に線量率が低下し、その後の地表面の乾燥に伴って降雨前の線量レベルにまで回復する変動が見られます。

なお、線量率の下がってきた地点においては、従来通りに降雨による線量率の上昇が見られます。

空間線量率の最大値（1時間値）

(単位：nGy/h)

機関名	測定地点数	各地点の最大値の範囲			過去の最大値		
		10 月	11 月	12 月	H26～	事故直後	事故前
福島第一原子力発電所	*1 8	391 ～ 1,200	391 ～ 1,229	393 ～ 1,235	5,084	327,467	188
		事故直後の最大値と比較すると今期最大値は約1/265に減少					
福島第二原子力発電所	7	104 ～ 266	92 ～ 269	100 ～ 271	795	182,000	162
		事故直後の最大値と比較すると今期最大値は約1/672に減少					

- \* 1. 福島第一原子力発電所 MP-7, 8 については、高線量率の環境下にあることから、新たな放出によって上空を通過する放射性物質を検知しやすくするため、検出器廻りに遮へいを設置し、地表面等からの放射線の影響を抑えています。

(2) 空間積算線量

今期間は、令和2年10月8日から令和3年1月7日までの91日間で、福島第一原子力発電所21地点、福島第二原子力発電所18地点で蛍光ガラス線量計（RPLD）により空気中の放射線量を測定しました。90日換算値は、全ての地点において事故前の最大値を上回る値が観測されました。

なお、事故以降は、年月の経過とともに減少傾向にありました。

詳細な測定値は、福島第一26ページ、福島第二31ページを参照

単位：(mGy/90日)

機関名	測定地点数	積算線量 (令和2年10月8日～ 令和3年1月7日)	過去の測定値		
			H26～	事故直後	事故前
福島第一 原子力発電所	21	0.23 ～ 7.80	0.22 ～ 35.00	0.42 ～ 312.25	0.10 ～ 0.16
		事故直後の最大値と比較すると 今期最大値は約1/40に減少			
福島第二 原子力発電所	18	0.19 ～ 0.62	0.18 ～ 3.24	0.44 ～ 12.15	0.11 ～ 0.15
		事故直後の最大値と比較すると 今期最大値は約1/20に減少			

(注) 1. 「過去の測定値」は、

H26～：平成26年度から前四半期まで。

事故直後：事故後（平成22年度第4四半期）から平成25年度まで。

事故前：平成15年度第1四半期から事故前の平成22年度第3四半期まで。

## 2. 環境試料

### (1) 大気浮遊じん

福島第一原子力発電所のダストモニタ（2地点）については、機器本体及びダスト吸入配管等の取り替えが完了し、MP 3地点は平成28年10月から全アルファ放射能及び全ベータ放射能の連続測定を開始し、MP 8地点については、平成29年10月から全アルファ放射能及び全ベータ放射能の連続測定を開始しました。

福島第二原子力発電所のダストモニタ（2地点）は、平成24年度より測定器を更新して、大気浮遊じんの全アルファ放射能及び全ベータ放射能の連続測定を開始しました。また、MP 1地点については、平成31年2月～4月で局舎移設を行いました。

各地点の測定値は、以下のとおりです。  
 詳細な測定値は、福島第一27ページ、福島第二32ページを参照

#### ア. 月間平均値

福島第一原子力発電所の月間平均値は、全アルファ放射能については事故前の測定値と同程度でした。全ベータ放射能については、事故前の月間平均値を若干上回りましたが、周辺土壌の一時的な舞い上がりの影響と思われます。

福島第二原子力発電所の月間平均値は、いずれも事故前の月間平均値と同等であり、事故の影響による測定値の変動は見られませんでした。

大気浮遊じんの全アルファ放射能及び全ベータ放射能の月間平均値

(単位：Bq/m<sup>3</sup>)

機関名	項目	測定地点数	月間平均値			過去の月間平均値		
			10月	11月	12月	H26～	事故直後	事故前
福島第一原子力発電所	全アルファ放射能	2	0.012～0.015	0.015～0.021	0.013～0.018	0.005～0.027	※	0.014～0.022
	全ベータ放射能	2	0.037～0.052	0.045～0.080	0.044～0.062	0.020～0.091	※	0.028～0.039
福島第二原子力発電所	全アルファ放射能	2	0.015	0.018～0.020	0.016	0.007～0.029	0.008～0.035	0.005～0.030
	全ベータ放射能	2	0.030～0.032	0.035～0.040	0.033～0.035	0.018～0.055	0.021～0.061	0.019～0.058

(注) 「過去の測定値の範囲」は、

H26～：平成26年度から前四半期まで。(尚、福島第一原子力発電所は平成28年度第3四半期から)

事故直後：事故後(平成23年3月11日)から平成25年度まで。

事故前：平成13年から事故前(平成23年3月10日)まで。

※は測定値なし(機器周辺の空間線量が高い事及び機器本体及び吸入配管の取り替えを実施し、MP 3地点は平成28年10月、MP 8地点は平成29年10月から運用開始したため)

#### イ. 変動状況

福島第一原子力発電所において最大値は、事故前の最大値と同程度でした。また、全アルファ・全ベータ放射能に相関が見られることから、変動の要因は自然放射能の影響と思われます。

ただし、一部の測定結果において相関に変動が見られますが、周辺土壌の一時的な舞い上がりの影響と思われます。

福島第二原子力発電所の各地点の最大値は、事故前の最大値を下回りました。また、全アルファ・全ベータ放射能に良い相関が見られることから、変動の要因は自然放射能の影響と思われます。

大気浮遊じんの全アルファ放射能及び全ベータ放射能の最大値

(単位：Bq/m<sup>3</sup>)

機関名	項目	測定地点数	最大値			過去の最大値		
			10月	11月	12月	H26～	事故直後	事故前
福島第一原子力発電所	全アルファ放射能	2	0.051～0.078	0.043～0.088	0.045～0.062	0.17	※	0.17
	全ベータ放射能	2	0.11～0.15	0.095～0.27	0.094～0.27	0.65	※	0.24
福島第二原子力発電所	全アルファ放射能	2	0.058～0.066	0.059～0.065	0.054～0.056	0.15	0.14	0.20
	全ベータ放射能	2	0.094～0.11	0.10～0.11	0.088～0.095	0.22	0.23	0.29

※は測定値なし(機器周辺の空間線量が高い事及び機器本体及び吸入配管の取り替えを実施し、MP 3地点は平成28年10月、MP 8地点は平成29年10月から運用開始したため)

## (2) 環境試料の核種濃度

福島第一原子力発電所が今期間に測定した環境試料は、大気浮遊じんが2地点6試料、土壌が4地点4試料、海水が3地点3試料、海底土が2地点2試料、松葉が2地点2試料の5品目で合計17試料でした。

福島第二原子力発電所が今期間に測定した環境試料は、大気浮遊じんが2地点6試料、土壌が4地点4試料、海水が3地点3試料、海底土が2地点2試料、松葉が2地点2試料の5品目で合計17試料でした。

詳細な測定値は、福島第一28～29ページ、福島第二33～34ページを参照

### ア. 福島第一原子力発電所測定分

福島第一原子力発電所測定分の環境試料のうち、大気浮遊じん、土壌、海水、海底土、松葉の5品目合計17試料から、セシウム-134・セシウム-137が検出されました。

すべての試料において測定値の変動はありますが、概ね横ばい傾向にあります。

なお、海水のトリチウムについては3試料のうち北放水口の1試料から検出されましたが、事故直後、H26～の測定値と比較すると低く、事故前の測定値と同程度の値でした。

「福島第一原子力発電所測定分」 環境試料中のガンマ線放出核種濃度

試料名	地点数	ガンマ線 放出核種	測定値	過去の測定値		
				H26～	事故直後	事故前
大気浮遊じん (mBq / m <sup>3</sup> )	2	Cs-134	0.12 ～ 1.8	0.052 ～ 18	1.7 ～ 88	ND
		Cs-137	2.2 ～ 39	0.65 ～ 76	2.6 ～ 200	ND
土 壌 (Bq/kg 乾)	4	Cs-134	130 ～ 7,100	180 ～ 110,000	1,400 ～ 330,000	ND
		Cs-137	2,800 ～ 150,000	2,800 ～ 460,000	2,600 ～ 680,000	2.4 ～ 28
海 水 (Bq/L)	3	Cs-134	0.003 ～ 0.022	ND ～ 6.0	ND ～ 76	ND
		Cs-137	0.083 ～ 0.45	0.036 ～ 18	ND ～ 110	ND ～ 0.003
海 底 土 (Bq/kg 乾)	2	Cs-134	6.2 ～ 15	8.2 ～ 350	110 ～ 1,200	ND
		Cs-137	130 ～ 310	130 ～ 1,100	210 ～ 1,800	ND ～ 1.2
松 葉 (Bq/kg 生)	2	Cs-134	10 ～ 15	8.1 ～ 2,100	890 ～ 220,000	ND
		Cs-137	240 ～ 290	90 ～ 5,900	1,600 ～ 310,000	ND ～ 0.14

※は測定値なし（令和元年度より測定再開）

- (注) 1. 「過去の測定値の範囲」は、  
H26～：平成26年度から前四半期まで。  
事故直後：事故後（平成23年3月11日）から平成25年度まで。  
事故前：平成13年から事故前（平成23年3月10日）まで。
2. NDは検出限界未満。  
「ND～（数値）」とあるのは、検出限界未満の試料と検出限界を超えて検出された試料とがあることを示し、検出された試料の中での最大値を右側に表記しました。

「福島第一原子力発電所測定分」 環境試料中のベータ線放出核種濃度

試料名	地点数	ベータ線 放出核種	測定値	過去の測定値		
				H26～	事故直後	事故前
海 水 (Bq/L)	3	H-3	ND ～ 1.4	ND ～ 340	ND ～ 180	ND ～ 0.67

イ. 福島第二原子力発電所測定分

福島第二原子力発電所測定分の環境試料のうち、大気浮遊じん、土壌、海水、海底土、松葉の5品目合計

17試料から、セシウム-137が検出され、土壌、海底土の2品目6試料から、セシウム-134が検出されました。すべての試料において測定値の変動はありますが、概ね横ばい傾向にあります。なお、海水のトリチウムについてはすべての試料から検出されませんでした。

「福島第二原子力発電所測定分」 環境試料中のガンマ線放出核種濃度

試料名	地点数	ガンマ線 放出核種	測定値	過去の測定値		
				H26～	事故直後	事故前
大気浮遊じん (mBq / m <sup>3</sup> )	2	Cs-134	ND	ND ~ 0.070	ND ~ 0.75	ND
		Cs-137	0.017 ~ 0.037	ND ~ 0.20	ND ~ 1.1	ND
土 壌 (Bq/kg 乾)	4	Cs-134	6.9 ~ 190	4.5 ~ 2,800	490 ~ 9,000	ND
		Cs-137	110 ~ 3,900	53 ~ 8,000	900 ~ 15,000	1.1 ~ 15
海 水 (Bq/L)	3	Cs-134	ND	ND ~ 0.043	ND ~ 0.36	ND
		Cs-137	0.014 ~ 0.017	ND ~ 0.12	0.079 ~ 1.1	ND ~ 0.003
海 底 土 (Bq/kg 乾)	2	Cs-134	3.5 ~ 3.7	3.6 ~ 74	41 ~ 200	ND
		Cs-137	64 ~ 75	52 ~ 220	92 ~ 360	ND ~ 1.5
松 葉 (Bq/kg 生)	2	Cs-134	ND	ND ~ 120	60 ~ 17,160	ND
		Cs-137	16 ~ 19	12 ~ 330	130 ~ 22,840	ND ~ 0.060

- (注) 1. 「過去の測定値の範囲」は、  
H26～：平成26年度から前四半期まで。  
事故直後：事故後（平成23年3月11日）から平成25年度まで。  
事故前：平成13年から事故前（平成23年3月10日）まで。
2. NDは検出限界未満。  
「ND～（数値）」とあるのは、検出限界未満の試料と検出限界を超えて検出された試料とがあることを示し、検出された試料の中での最大値を右側に表記しました。

「福島第二原子力発電所測定分」 環境試料中のベータ線放出核種濃度

試料名	地点数	ベータ線 放出核種	測定値	過去の測定値		
				H26～	事故直後	事故前
海 水 (Bq/L)	3	H-3	ND	ND	ND	ND ~ 0.77

**ウ. 福島第一原子力発電所測定分(第1四半期採取分)**

土壌のアルファ線放出核種について、4試料からプルトニウム-239+240及びアメリシウム-241が検出され、1試料から(福島第一原子力発電所敷地内)プルトニウム-238が検出されました。  
 プルトニウム-239+240については、事故前に福島県内で測定された値と同程度です。(福島県測定値参照)  
 また、プルトニウム-238においては、福島第一原子力発電所の事故の影響と思われます。  
 なお、検出された核種については、事故直後と比較し測定値の変動はありますが、概ね横ばい傾向にあります。  
 これらの核種は、事故後から測定を開始しています。

「福島第一原子力発電所測定分」 環境試料中のアルファ線放出核種濃度

試料名	地点数	アルファ線 放出核種	測定値	過去の測定値		
				H26～	事故直後	事故前
土 壤 (Bq/kg乾)	4	P u-238	ND～0.03	ND ～ 0.07	ND ～ 0.11	—
		P u-239+240	0.08～0.39	0.08 ～ 0.56	0.19 ～ 0.39	—
		A m-241	0.04～0.16	0.04 ～ 0.22	0.45 ～ 1.2	—
		C m-244	ND	ND ～ 0.03	ND ～ 0.05	—

(注) 1. 「過去の測定値の範囲」は、  
 H26～：平成26年度から前四半期まで。  
 事故直後：事故後(平成23年3月11日)から平成25年度まで。

**エ. 福島第二原子力発電所測定分(第1四半期採取分)**

土壌のアルファ線放出核種について、4試料からプルトニウム-239+240及びアメリシウム-241が検出されました。  
 プルトニウム-239+240については、事故前に福島県内で測定された値と同程度です。(福島県測定値参照)  
 また、プルトニウム-238及びキュリウム-244は検出されませんでした。  
 なお、検出された核種については、事故直後と比較し測定値の変動はありますが、概ね横ばい傾向にあります。  
 これら核種は、事故後から測定を開始しています。

「福島第二原子力発電所測定分」 環境試料中のアルファ線放出核種濃度

試料名	地点数	アルファ線 放出核種	測定値	過去の測定値		
				H26～	事故直後	事故前
土 壤 (Bq/kg乾)	4	P u-238	ND	ND	ND	—
		P u-239+240	0.04～0.33	0.03 ～ 0.36	0.11 ～ 0.28	—
		A m-241	0.02～0.13	0.01 ～ 0.15	0.36 ～ 0.53	—
		C m-244	ND	ND	ND	—

(注) 1. 「過去の測定値の範囲」は、  
 H26～：平成26年度から前四半期まで。  
 事故直後：事故後(平成23年3月11日)から平成25年度まで。

第5 原子力発電所周辺環境放射能測定値一覧表

福島第一原子力発電所  
1. 空間放射線  
(1) 空間線量率

単位：  
線量率：mGy/h  
測定時間：h

上段：平均値  
中段：(最大値)  
下段：(最小値)

測定年月 測定 地点名	R2.4		5		6		7		8		9		10		11		12		R3.1		2		3		
	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	
	No.																								
1	M P - 1	685 (706) (648)	720	699 (724) (655)	744	697 (728) (662)	720	649 (677) (608)	744	692 (723) (644)	744	665 (695) (620)	720	656 (684) (622)	744	673 (690) (646)	720	673 (688) (652)	733						
2	M P - 2	981 (1,026) (891)	720	1,003 (1,045) (919)	744	995 (1,041) (925)	720	921 (968) (845)	744	991 (1,029) (917)	744	942 (991) (865)	720	936 (982) (871)	744	970 (994) (925)	720	964 (980) (926)	733						
3	M P - 3	653 (682) (587)	720	656 (685) (611)	744	637 (660) (609)	720	588 (620) (557)	744	624 (650) (579)	744	605 (629) (571)	720	595 (619) (563)	731	613 (625) (593)	720	613 (625) (594)	744						
4	M P - 4	1,189 (1,236) (1,098)	720	1,219 (1,274) (1,130)	744	1,215 (1,266) (1,134)	720	1,115 (1,169) (1,025)	744	1,203 (1,264) (1,109)	744	1,163 (1,215) (1,061)	720	1,146 (1,200) (1,062)	733	1,203 (1,229) (1,151)	720	1,216 (1,235) (1,175)	744						
5	M P - 5	845 (889) (756)	720	869 (912) (773)	744	874 (915) (814)	720	793 (845) (681)	744	870 (921) (787)	744	833 (882) (726)	720	821 (864) (737)	733	860 (879) (822)	720	855 (868) (823)	744						
6	M P - 6	395 (405) (382)	720	400 (410) (382)	744	399 (409) (383)	720	388 (399) (273)	744	396 (405) (376)	744	384 (394) (358)	720	381 (391) (369)	743	385 (391) (376)	710	382 (393) (372)	744						
7	M P - 7	687 (701) (659)	720	693 (710) (661)	744	690 (706) (667)	720	661 (680) (630)	744	687 (706) (658)	744	671 (687) (637)	720	663 (680) (637)	744	677 (685) (663)	709	676 (683) (666)	744						
8	M P - 8	652 (664) (628)	720	654 (667) (628)	744	645 (658) (626)	720	623 (638) (593)	744	643 (657) (621)	744	631 (645) (606)	720	627 (639) (606)	744	636 (643) (626)	706	636 (641) (627)	744						

注) ・空間線量率の測定は高線量率モニタリングポストによる。

・次測時には代替測定器にて測定し、指示値に異常がないことを確認している。

※点検に伴う次測期間は下記の通り。

MP-1：令和2年12月4日・8日・9日・10日 MP-2：令和2年12月11日・15日・16日・17日 MP-3：令和2年10月2日・6日・7日・8日 MP-4：令和2年10月9日・13日・14日・15日

MP-5：令和2年10月23日・27日・28日・29日 MP-6：令和2年10月30日, 11月4日・5日・6日 MP-7：令和2年11月13日・17日・18日・19日 MP-8：令和2年11月20日・25日・26日・27日

・震災後MP-6, 7, 8については、高線量率の環境下にあることから、新たな放出によって上空を通過する放射性物質を検知しやすくなるため、検出器廻りに遮へいを設置し、地表面等からの放射線の影響を抑えていた。

尚、MP-6については事務棟工事などにより周辺環境の線量率が低下したことから、平成25年7月に検出器廻りの遮へいを撤去している。

(2)空間積算線量

(単位：mG.y)

No.	測定地点名	R2.4.9		R2.7.9		R2.7.9		R2.10.8		R2.10.8		R3.1.7	
		積算線量	測定日数										
1	M P - 1	1.23 ( 1.22 )	91	1.17 ( 1.16 )	91	1.18 ( 1.17 )	91	1.78 ( 1.76 )	91	1.13 ( 1.12 )	91	1.22 ( 1.21 )	91
2	M P - 2	1.81 ( 1.79 )	91	1.78 ( 1.76 )	91	1.78 ( 1.76 )	91	1.13 ( 1.12 )	91	1.22 ( 1.21 )	91	1.66 ( 1.64 )	91
3	M P - 3	1.49 ( 1.47 )	91	1.29 ( 1.28 )	91	1.29 ( 1.28 )	91	0.99 ( 0.98 )	91	0.98 ( 0.97 )	91	4.02 ( 3.98 )	91
4	M P - 4	1.25 ( 1.24 )	91	1.16 ( 1.15 )	91	1.16 ( 1.15 )	91	7.72 ( 7.64 )	91	7.89 ( 7.80 )	91	0.84 ( 0.83 )	91
5	M P - 5	1.69 ( 1.67 )	91	1.62 ( 1.60 )	91	1.62 ( 1.60 )	91	0.68 ( 0.67 )	91	0.66 ( 0.65 )	91	1.49 ( 1.47 )	91
6	M P - 6	1.05 ( 1.04 )	91	0.99 ( 0.98 )	91	0.99 ( 0.98 )	91	3.36 ( 3.32 )	91	3.32 ( 3.28 )	91	3.02 ( 2.99 )	91
7	M P - 7	4.23 ( 4.18 )	91	3.87 ( 3.83 )	91	3.87 ( 3.83 )	91	5.07 ( 5.01 )	91	5.10 ( 5.04 )	91	6.85 ( 6.77 )	91
8	M P - 8	8.15 ( 8.06 )	91	7.72 ( 7.64 )	91	7.72 ( 7.64 )	91	5.05 ( 4.99 )	91	5.07 ( 5.01 )	91	5.07 ( 5.01 )	91
9*	双葉町郡山塚ノ腰	0.85 ( 0.84 )	91	0.81 ( 0.80 )	91	0.81 ( 0.80 )	91	0.23 ( 0.23 )	91	0.23 ( 0.22 )	91	0.23 ( 0.23 )	91
10	双葉町長塚ノ鬼	0.72 ( 0.71 )	91	0.68 ( 0.67 )	91	0.68 ( 0.67 )	91	0.42 ( 0.42 )	91	0.41 ( 0.41 )	91	0.40 ( 0.40 )	91
11	双葉町山田西郷内	1.54 ( 1.52 )	91	1.43 ( 1.41 )	91	1.43 ( 1.41 )	91	0.94 ( 0.93 )	91	0.90 ( 0.89 )	91	0.91 ( 0.90 )	91
12	大熊町夫沢中央台	3.38 ( 3.34 )	91	3.36 ( 3.32 )	91	3.36 ( 3.32 )	91	0.94 ( 0.93 )	91	0.90 ( 0.89 )	91	0.91 ( 0.90 )	91
13	大熊町役場	3.15 ( 3.12 )	91	3.06 ( 3.03 )	91	3.06 ( 3.03 )	91	0.45 ( 0.45 )	91	0.43 ( 0.43 )	91	0.43 ( 0.43 )	91
14*	大熊町小入野東大和久	5.21 ( 5.15 )	91	5.07 ( 5.01 )	91	5.07 ( 5.01 )	91	0.94 ( 0.93 )	91	0.90 ( 0.89 )	91	0.91 ( 0.90 )	91
15	大熊町熊川緑ヶ丘	7.14 ( 7.06 )	91	6.85 ( 6.77 )	91	6.85 ( 6.77 )	91	0.94 ( 0.93 )	91	0.90 ( 0.89 )	91	0.91 ( 0.90 )	91
16*	大熊町熊川久麻川	5.16 ( 5.10 )	91	5.05 ( 4.99 )	91	5.05 ( 4.99 )	91	0.94 ( 0.93 )	91	0.90 ( 0.89 )	91	0.91 ( 0.90 )	91
17	浪江町北棚塩総合集会所	0.23 ( 0.23 )	91	0.22 ( 0.22 )	91	0.22 ( 0.22 )	91	0.94 ( 0.93 )	91	0.90 ( 0.89 )	91	0.91 ( 0.90 )	91
18	浪江町川漆中上ノ原	0.42 ( 0.42 )	91	0.41 ( 0.41 )	91	0.41 ( 0.41 )	91	0.94 ( 0.93 )	91	0.90 ( 0.89 )	91	0.91 ( 0.90 )	91
19	大熊町野上湯ノ神	0.94 ( 0.93 )	91	0.90 ( 0.89 )	91	0.90 ( 0.89 )	91	0.94 ( 0.93 )	91	0.90 ( 0.89 )	91	0.91 ( 0.90 )	91
20	富岡町新福島変電所	0.94 ( 0.93 )	91	0.90 ( 0.89 )	91	0.90 ( 0.89 )	91	0.94 ( 0.93 )	91	0.90 ( 0.89 )	91	0.91 ( 0.90 )	91
21	富岡町東京電力西原寮	0.45 ( 0.45 )	91	0.43 ( 0.43 )	91	0.43 ( 0.43 )	91	0.45 ( 0.45 )	91	0.43 ( 0.43 )	91	0.43 ( 0.43 )	91

(注) 1. ( )内は、90日換算値。

※No9:郡山堂ノ上から郡山塚ノ腰へ地点変更 (国の中間貯蔵施設造成対象区域となったことによる変更；平成28年度第3四半期より)

※No14:東大和久およびNo16:久麻川地点については、国の中間貯蔵施設造成対象区域となったことにより測定地点変更 (令和元年度第1四半期より)

2. 環境試料  
(1) 大気浮遊じん<sup>1</sup>の全アルファ及び全ベータ放射能

測定値: Bq/m<sup>3</sup> 上段: 平均値  
単位: 測定時間: h 下段: (最大値)

測定年月	R2.4		5		6		7		8		9		10		11		12		R3.1		2		3	
	測定項目	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	
1 MP-3*	全アルファ放射能	0.011 (0.078)	720	0.018 (0.12)	744	0.014 (0.097)	720	0.006 (0.033)	720	0.025 (0.17)	744	0.009 (0.066)	719	0.015 (0.078)	744	0.021 (0.088)	718	0.018 (0.062)	744					
	全ベータ放射能	0.041 (0.13)	720	0.075 (0.47)	744	0.047 (0.16)	720	0.020 (0.066)	720	0.055 (0.28)	744	0.031 (0.12)	719	0.052 (0.15)	744	0.080 (0.27)	718	0.062 (0.27)	744					
	全アルファ放射能	0.009 (0.052)	720	0.013 (0.073)	744	0.011 (0.062)	720	0.005 (0.028)	720	0.020 (0.11)	744	0.008 (0.063)	720	0.012 (0.051)	744	0.015 (0.043)	718	0.013 (0.045)	744					
	全ベータ放射能	0.032 (0.11)	720	0.039 (0.13)	744	0.036 (0.12)	720	0.025 (0.069)	720	0.050 (0.21)	744	0.030 (0.12)	720	0.037 (0.11)	744	0.045 (0.095)	718	0.044 (0.094)	744					
2 MP-8*																								

※ 福島第一原子力発電所のダストモニタ: MP3については、平成28年10月より本運用開始。

: MP8については、平成29年10月より本運用開始。

・ 次測時には、可搬型連続ダストモニタにて測定し、指示値に異常がないことを確認している。

\*点検に伴う次測期間は下記の通り。

MP-3: 令和2年7月16日・17日、9月9日、11月18日

MP-8: 令和2年7月29日・30日、11月10日

(2) 大気浮遊じんの核種濃度

No.	採取地点名	採取時期	核種								濃度 (mBq/m <sup>3</sup> )																															
			<sup>51</sup> Cr	<sup>54</sup> Mn	<sup>58</sup> Co	<sup>59</sup> Fe	<sup>60</sup> Co	<sup>95</sup> Zr	<sup>95</sup> Nb	<sup>106</sup> Ru	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>144</sup> Ce																													
1	MP-3	R2. 4. 1 ~ R2. 4. 30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND																		
		R2. 5. 1 ~ R2. 5. 31	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND																
		R2. 6. 1 ~ R2. 6. 30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND															
		R2. 7. 1 ~ R2. 7. 31	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND														
		R2. 8. 1 ~ R2. 8. 31	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND														
		R2. 9. 1 ~ R2. 9. 30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND													
		R2. 10. 1 ~ R2. 10. 31	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND												
		R2. 11. 1 ~ R2. 11. 30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND											
		R2. 12. 1 ~ R2. 12. 31	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND										
		2	MP-8	R2. 4. 1 ~ R2. 4. 30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
				R2. 5. 1 ~ R2. 5. 31	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
R2. 6. 1 ~ R2. 6. 30	ND			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
R2. 7. 1 ~ R2. 7. 31	ND			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
R2. 8. 1 ~ R2. 8. 31	ND			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
R2. 9. 1 ~ R2. 9. 30	ND			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
R2. 10. 1 ~ R2. 10. 31	ND			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
R2. 11. 1 ~ R2. 11. 30	ND			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
R2. 12. 1 ~ R2. 12. 31	ND			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	

(注) 1. 「ND」は検出限界未満である。



福島第二原子力発電所  
1. 空間放射線  
(1) 空間線量率

単位：  
線量率：nGy/h  
測定時間：h

上段：平均値  
中段：(最大値)  
下段：(最小値)

測定年月	R2.4		5		6		7		8		9		10		11		12		R3.1		2		3		
	測定地点名	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率																	
1	MP-1	177 (189) (168)	710	176 (185) (164)	744	173 (186) (164)	720	166 (175) (155)	744	178 (190) (163)	744	176 (184) (163)	720	174 (188) (164)	744	179 (183) (174)	719	178 (192) (174)	744						
2	MP-2	161 (176) (155)	710	161 (171) (152)	744	159 (173) (151)	720	152 (163) (146)	744	163 (175) (149)	744	158 (165) (151)	720	155 (170) (148)	744	159 (165) (153)	719	160 (175) (156)	744						
3	MP-3	266 (281) (251)	720	266 (284) (244)	734	259 (274) (243)	720	243 (252) (228)	744	268 (284) (239)	744	259 (275) (244)	720	252 (266) (241)	744	261 (269) (249)	719	260 (271) (254)	744						
4	MP-4	243 (256) (231)	720	248 (262) (233)	734	247 (261) (233)	720	233 (242) (224)	744	255 (269) (230)	744	246 (260) (231)	720	239 (254) (228)	744	247 (255) (236)	719	246 (255) (240)	744						
5	MP-5	256 (270) (250)	720	254 (266) (239)	736	246 (257) (239)	720	240 (251) (235)	744	248 (257) (238)	744	244 (251) (238)	720	242 (258) (236)	744	245 (250) (237)	719	240 (250) (236)	744						
6	MP-6	138 (155) (130)	720	139 (148) (130)	735	137 (151) (130)	720	130 (142) (124)	744	140 (149) (129)	744	138 (145) (131)	720	136 (157) (129)	744	141 (150) (135)	719	142 (156) (138)	744						
7	MP-7	84 (101) (81)	720	85 (96) (80)	736	84 (98) (80)	720	81 (95) (78)	744	85 (92) (79)	744	83 (91) (80)	720	83 (104) (79)	744	85 (92) (82)	719	86 (100) (84)	744						

注) 欠測時には、可搬型モニタリングポストを設置し、指示値に異常がないことを確認している。

※点検に伴う欠測期間は下記の通り。  
MP-1：令和2年4月21日、22日、11月18日  
MP-3：令和2年5月12日、13日、11月20日  
MP-5：令和2年5月19日、20日、11月26日  
MP-7：令和2年5月26日、27日、11月28日

MP-2：令和2年4月23日、24日、11月18日  
MP-4：令和2年5月14日、15日、11月20日  
MP-6：令和2年5月21日、22日、11月26日

福島第二原子力発電所

(2) 空間積算線量

(単位：mGy)

No.	測定地点名	測定期間		R2.4.9		R2.7.9		R2.10.8		R2.10.8		R3.1.7	
		測定項目	積算線量	測定日数	積算線量	測定日数	積算線量	測定日数	積算線量	測定日数	積算線量	測定日数	
1	M P - 1	0.51 (0.50)	91	0.51 (0.50)	91	0.50 (0.50)	91	0.50 (0.50)	91				
2	M P - 2	0.39 (0.39)	91	0.39 (0.39)	91	0.39 (0.39)	91	0.39 (0.39)	91				
3	M P - 3	0.65 (0.64)	91	0.65 (0.64)	91	0.65 (0.64)	91	0.63 (0.62)	91				
4	M P - 4	0.55 (0.54)	91	0.55 (0.54)	91	0.55 (0.54)	91	0.54 (0.54)	91				
5	M P - 5	0.58 (0.57)	91	0.59 (0.58)	91	0.59 (0.58)	91	0.57 (0.56)	91				
6	M P - 6	0.31 (0.31)	91	0.31 (0.31)	91	0.31 (0.31)	91	0.32 (0.32)	91				
7	M P - 7	0.19 (0.19)	91	0.18 (0.18)	91	0.18 (0.18)	91	0.19 (0.19)	91				
8	富岡町小こはま浜	0.43 (0.42)	91	0.43 (0.43)	91	0.43 (0.43)	91	0.42 (0.42)	91				
9	富岡町富岡第一中学校	0.34 (0.34)	91	0.34 (0.34)	91	0.34 (0.34)	91	0.32 (0.32)	91				
10	富岡町上の町社宅	0.41 (0.40)	91	0.37 (0.37)	91	0.37 (0.37)	91	0.37 (0.37)	91				
11	富岡町上郡山清水	0.45 (0.44)	91	0.46 (0.45)	91	0.46 (0.45)	91	0.44 (0.44)	91				
12	富岡町上郡山上郡	0.52 (0.51)	91	0.53 (0.52)	91	0.53 (0.52)	91	0.51 (0.50)	91				
13	榎葉町上郡繁岡山根	0.47 (0.47)	91	0.46 (0.45)	91	0.46 (0.45)	91	0.47 (0.46)	91				
14	榎葉町井出浄光	0.42 (0.42)	91	0.43 (0.43)	91	0.43 (0.43)	91	0.42 (0.42)	91				
15	榎葉町下繁岡一丁坪	0.44 (0.44)	91	0.45 (0.45)	91	0.45 (0.45)	91	0.44 (0.43)	91				
16	富岡町上郡山岩井戸	0.45 (0.44)	91	0.45 (0.45)	91	0.45 (0.45)	91	0.45 (0.45)	91				
17	榎葉町井出八石	0.24 (0.24)	91	0.24 (0.24)	91	0.24 (0.24)	91	0.24 (0.24)	91				
18	榎葉町榎葉中学校	0.19 (0.19)	91	0.20 (0.20)	91	0.20 (0.20)	91	0.19 (0.19)	91				

注) ( ) 内は、90日換算値。

福島第二原子力発電所

測定値: Bq/m<sup>3</sup> 上段: 平均値  
単位: 測定時間: h 下段: (最大値)

2. 環境試料  
(1) 大気浮遊じんの全アルファ及び全ベータ放射能

No.	測定地点名	測定年月	R2.4		5		6		7		8		9		10		11		12		R3.1		2		3				
			測定項目	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間	測定値	測定時間		
1	MP-1	全アルファ放射能	0.010	720	0.017	744	0.014	708	0.007	744	0.031	744	0.014	720	0.015	744	0.020	720	0.016	744									
			(0.050)		(0.078)		(0.066)		(0.032)		(0.15)		(0.093)		(0.066)		(0.065)		(0.056)										
			0.025	720	0.036	744	0.032	708	0.020	744	0.065	744	0.030	720	0.032	744	0.040	720	0.035	744									
2	MP-7	全アルファ放射能	0.010	720	0.016	744	0.011	708	0.007	744	0.027	744	0.012	720	0.015	744	0.018	720	0.016	744									
			(0.063)		(0.081)		(0.052)		(0.035)		(0.13)		(0.078)		(0.058)		(0.059)		(0.054)										
			0.023	720	0.033	744	0.026	708	0.018	744	0.047	744	0.026	720	0.030	744	0.035	720	0.033	744									

注) 欠測時には、モニタリングポスト指示値、スタックモニタ指示値に異常がないこと、及びプラントに放射性物質の放出に係る事象が発生していないことを確認している。

※点検に伴う欠測期間は下記の通り。

MP-1 : 令和2年6月24日

MP-7 : 令和2年6月26日

(2) 大気浮遊じんの核種濃度

No.	採取地点名	採取時期	核種濃度 (mBq/m <sup>3</sup> )																				
			<sup>51</sup> Cr	<sup>54</sup> Mn	<sup>58</sup> Co	<sup>59</sup> Fe	<sup>60</sup> Co	<sup>95</sup> Zr	<sup>95</sup> Nb	<sup>106</sup> Ru	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>144</sup> Ce										
1	MP-1	R2. 4. 1 ~ R2. 4. 30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
		R2. 5. 1 ~ R2. 5. 31	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		R2. 6. 1 ~ R2. 6. 30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		R2. 7. 1 ~ R2. 7. 31	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		R2. 8. 1 ~ R2. 8. 31	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		R2. 9. 1 ~ R2. 9. 30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		R2. 10. 1 ~ R2. 10. 31	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		R2. 11. 1 ~ R2. 11. 30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		R2. 12. 1 ~ R2. 12. 31	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
		2	MP-7	R2. 4. 1 ~ R2. 4. 30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
R2. 5. 1 ~ R2. 5. 31	ND			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
R2. 6. 1 ~ R2. 6. 30	ND			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
R2. 7. 1 ~ R2. 7. 31	ND			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
R2. 8. 1 ~ R2. 8. 31	ND			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
R2. 9. 1 ~ R2. 9. 30	ND			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
R2. 10. 1 ~ R2. 10. 31	ND			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
R2. 11. 1 ~ R2. 11. 30	ND			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
R2. 12. 1 ~ R2. 12. 31	ND			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		

注) 「ND」は検出限界未満である。



添付資料

## 放射性廃棄物管理状況及び試料採取時の付帯データ

自 令和2年10月

至 令和2年12月

東京電力ホールディングス株式会社

福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所

福島第二原子力発電所

福島第一原子力発電所  
放射性廃棄物管理状況（令和2年度 第3四半期報）  
（1）放射性気体廃棄物の放出量（1～4号機）

a. 1～4号機原子炉建屋及び1～3号機格納容器からの追加放出量

(単位：Bq)

	粒子状物質		備考
	$^{134}\text{Cs}$	$^{137}\text{Cs}$	
1～4号機合計※1	分析中	分析中	「福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画」において、「1～4号機原子炉建屋及び1～3号機原子炉格納容器以外からの追加的放出は、極めて少ないと考えられる」と評価されていることから、1～4号機における気体廃棄物の放出量としては、1～4号機原子炉建屋及び1～3号機格納容器から放出される $^{134}\text{Cs}$ 及び $^{137}\text{Cs}$ を対象としている。
内訳	1号機	分析中	
	2号機	分析中	
	3号機	分析中	
	4号機※2	分析中	
放出管理の目標値 (年間)	$4.3 \times 10^{10}$	$4.3 \times 10^{10}$	月1回以上の試料採取により得られた放射能濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )に排気設備風量又は風量推定値(m <sup>3</sup> /h)を乗ずることによって放出率(Bq/h)を求め、その放出率に報告対象期間の時間(h)を乗ずることによって、追加放出量を求めている。

※1 四捨五入の関係より、「号機毎の合計値」と「1～4号機合計」が合わない場合がある。

※2 4号機は $^{134}\text{Cs}$ 、 $^{137}\text{Cs}$ どちらも検出されおらず検出限界値を用いて放出量を算出している。

(2) 放射性気体及び放射性液体廃棄物の放出量

a. 放射性気体廃棄物の放出量

		(単位：Bq)					備考
		全希ガス	$^{131}\text{I}$	$^{133}\text{I}$	全粒子状物質	$^3\text{H}$	
原子炉施設合計		分析中	分析中	分析中	分析中	分析中	
5, 6号機共用排気筒		分析中	分析中	分析中	分析中	分析中	放射性気体廃棄物の放出放射能(Bq)は、排気中の放射性物質の濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )に排気量(m <sup>3</sup> )を乗じて求められている。
焼却炉建屋排気筒		—	分析中	分析中	分析中	分析中	なお、放射性物質が検出されない場合は、放出放射能(Bq)の算出は実施せず”検出されず”と表示した。
大型機器除染設備排気口 及び 汚染拡大防止ハウス排気口		—	—	—	分析中	—	検出されずとは、以下の濃度未満の場合をいう。 全希ガス： $2 \times 10^{-2}$ (Bq/cm <sup>3</sup> ) $^{131}\text{I}$ ： $7 \times 10^{-9}$ (Bq/cm <sup>3</sup> ) $^{133}\text{I}$ ： $7 \times 10^{-8}$ (Bq/cm <sup>3</sup> ) 全粒子状物質： $4 \times 10^{-9}$ (Bq/cm <sup>3</sup> ) ( $^{137}\text{Cs}$ で代表した) $^3\text{H}$ ： $4 \times 10^{-5}$ (Bq/cm <sup>3</sup> )
使用済燃料共用プール排気口		分析中	分析中	分析中	分析中	分析中	
年間放出管理目標値 <sup>※1</sup>		$2.8 \times 10^{15}$	$1.4 \times 10^{11}$	—	—	—	

※1 特定原子力施設に係る実施計画値(5, 6号機の合計値)。

※2 汚染拡大防止ハウス排気口は排気設備停止中。

b. 放射性液体廃棄物の放出量

(単位：Bq)

	全核種 ( <sup>3</sup> Hを除く)	核 種 別						
		<sup>51</sup> Cr	<sup>54</sup> Mn	<sup>59</sup> Fe	<sup>58</sup> Co	<sup>60</sup> Co	<sup>131</sup> I	<sup>134</sup> Cs
原子炉施設合計	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし
排水口	1号機排水口	放出実績なし						
	2号機排水口	放出実績なし						
	3号機排水口	放出実績なし						
	4号機排水口	放出実績なし						
	5号機排水口	放出実績なし						
	6号機排水口	放出実績なし						
年間放出管理目標値 <sup>※1</sup>	7.4 × 10 <sup>10</sup>							

(続き)

	全核種 ( <sup>3</sup> Hを除く)	核 種 別						備考	
		<sup>89</sup> Sr	<sup>90</sup> Sr	アルファ線を放出する放射性物質	ベータ線を放出する放射性物質	<sup>3</sup> H			
原子炉施設合計	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	・1～4号機排水口は、閉塞済み。
排水口	1号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	
	2号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	
	3号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	
	4号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	
	5号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	
	6号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	
年間放出管理目標値 <sup>※1</sup>	7.4 × 10 <sup>12</sup> <sup>※2</sup>								

※1 5号機排水口および6号機排水口の放出管理目標値を示す。

なお、現在、実施計画においては1号機排水口～4号機排水口の放出管理目標値を設定していない。

※2 トリチウムについては、放出管理の年間基準値を記載。

2. 試料採取時の付帯データ

(ア) 海水

採取地点名	採取年月日	気温(°C)	水温(°C)	pH	Cl <sup>-</sup> (%)
第一(発)取水口	R2. 5. 14	16. 9	14. 3	8. 0	18. 5
	R2. 8. 21	30. 6	23. 8	8. 1	17. 8
	R2. 11. 20	20. 9	16. 7	8. 1	18. 9
第一(発)南放水口	R2. 5. 13	16. 2	16. 5	8. 0	16. 7
	R2. 8. 20	30. 0	24. 1	8. 1	17. 8
	R2. 11. 19	18. 8	16. 8	8. 1	18. 9
第一(発)北放水口	R2. 5. 13	17. 7	16. 1	8. 1	18. 5
	R2. 8. 20	30. 5	25. 7	8. 1	17. 8
	R2. 11. 19	20. 8	16. 4	8. 1	18. 6

令和2年度月別降水データ表

福島第一原子力発電所			
月	日数 (d)	時間 (h)	降水量 (mm)
R2.4	11	65	178.5
5	12	76	133.5
6	14	55	79.5
7	24	154	337.5
8	6	24	49.0
9	15	70	190.5
10	9	82	124.5
11	3	11	8.0
12	4	8	9.0
R3.1			
2			
3			
合計	98	545	1110.0

環境試料測定日

試料名	採取地点名	採取年月日	測定年月日	
			全α・β放射能	γ
大気浮遊じん	M P - 3	R2.10.1 ～ R2.10.31	連続	R2.11.11
		R2.11.1 ～ R2.11.30	連続	R2.12.10
		R2.12.1 ～ R2.12.31	連続	R3.1.19
		R2.10.1 ～ R2.10.31	連続	R2.11.11
	M P - 8	R2.11.1 ～ R2.11.30	連続	R2.12.8
		R2.12.1 ～ R2.12.31	連続	R3.1.18

(注) 「/」は測定対象外。

試料名	採取地点名	採取年月日	測定年月日						
			γ	<sup>3</sup> H	<sup>90</sup> Sr	<sup>238</sup> Pu ※-1	<sup>239+240</sup> Pu ※-1	<sup>241</sup> Am ※-1	<sup>244</sup> Cm ※-1
土	敷地内	R2.11.12	R2.11.13	/	/	R2.10.20	R2.10.20	R2.11.19	R2.11.19
		R2.11.12	R2.11.13	/	/	R2.10.20	R2.10.20	R2.11.18	R2.11.18
	大熊町下野上 <small>おのみかのの</small>	R2.11.12	R2.11.13	/	/	R2.10.21	R2.10.21	R2.11.19	R2.11.19
		R2.11.12	R2.11.13	/	/	R2.10.21	R2.10.21	R2.11.18	R2.11.18
海	取放水	R2.11.20	R2.12.16	R2.12.5	/	/	/	/	/
		R2.11.19	R2.12.17	R2.12.6	/	/	/	/	/
	北放水	R2.11.19	R2.12.16	R2.12.5	/	/	/	/	/
		R2.11.19	R2.12.1	/	/	/	/	/	/
	南放水	R2.11.19	R2.11.30	/	/	/	/	/	/
		R2.11.11	R2.11.12	/	/	/	/	/	/
海底土	M P - 3 付近 環境管理棟付近	R2.11.11	R2.11.12	/	/	/	/	/	/
		R2.11.11	R2.11.12	/	/	/	/	/	/

(注) 「/」は測定対象外。

※-1はR2年度第1四半期(5月18日)採取分。

福島第二原子力発電所

放射性廃棄物管理状況(令和2年度,第3四半期)

1. 放射性気体廃棄物の放出量

(単位:Bq)

	全希ガス	<sup>131</sup> I	<sup>133</sup> I	全粒子状物質	<sup>3</sup> H	備考
原子炉施設合計	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	4.1×10 <sup>10</sup>	放射性気体廃棄物の放出放射能(Bq)は、排気中の放射性物質の濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )に排気量(m <sup>3</sup> )を乗じて求めている。 なお、放射性物質が検出されない場合は、放出放射能(Bq)の算出は実施せず”検出されず”と表示した。 検出されずとは、以下の濃度未満の場合をいう。 全希ガス:2×10 <sup>-2</sup> (Bq/cm <sup>3</sup> ) <sup>131</sup> I:7×10 <sup>-9</sup> (Bq/cm <sup>3</sup> ) <sup>133</sup> I:7×10 <sup>-8</sup> (Bq/cm <sup>3</sup> ) 全粒子状物質:4×10 <sup>-9</sup> (Bq/cm <sup>3</sup> ) <sup>3</sup> H:4×10 <sup>-5</sup> (Bq/cm <sup>3</sup> ) ( <sup>60</sup> Coで代表した)
1号機排気筒	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	6.7×10 <sup>9</sup>	
2号機排気筒	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	8.0×10 <sup>9</sup>	
3号機排気筒	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	1.1×10 <sup>10</sup>	
4号機排気筒	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	1.4×10 <sup>10</sup>	
廃棄物処理建屋換気系排気筒	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	1.5×10 <sup>9</sup>	
サイパンカ建屋排気口	——	——	——	検出されず	——	
焼却設備排気筒	——	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	
年間放出管理目標値 <sup>※1</sup>	5.5×10 <sup>15</sup>	2.3×10 <sup>11</sup>	——	——	——	

※1 放出管理目標値は「発電用軽水炉施設周辺の線量目標値に関する指針(原子力委員会決定)」に定められた公衆の線量目標値(50μSv/年)を下回るように設定した年間の放出放射能である。

2. 放射性液体廃棄物の放出量(第3四半期)

(単位: Bq)

	全核種 ( <sup>3</sup> Hを除く)	核種別								
		<sup>51</sup> Cr	<sup>54</sup> Mn	<sup>59</sup> Fe	<sup>58</sup> Co	<sup>60</sup> Co	<sup>131</sup> I	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	
原子炉施設合計	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
排水口 別内訳	1号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし						
	2号機排水口	検出されず	検出されず	検出されず						
	3号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし						
	4号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし						
年間放出管理目標値*1	1.4×10 <sup>11</sup>									

(続き)

	核種別		<sup>3</sup> H	備考
	<sup>89</sup> Sr	アルファ線を放出する放射性物質		
原子炉施設合計	検出されず	検出されず	検出されず	放射性液体廃棄物の放出放射能(Bq)は、排水中の放射性物質の濃度(Bq/cm <sup>3</sup> )に排水量(m <sup>3</sup> )を乗じて求められている。 なお、放射性物質が検出されない場合は、放出放射能(Bq)の算出は実施せず”検出されず”と表示した。 検出されずとは、以下の濃度未満の場合をいう。 全核種( <sup>3</sup> Hを除く): 2×10 <sup>-2</sup> (Bq/cm <sup>3</sup> ) ( <sup>60</sup> Coで代表した) <sup>89</sup> Sr, <sup>90</sup> Sr: 7×10 <sup>-4</sup> (Bq/cm <sup>3</sup> ) ( <sup>90</sup> Srで代表した) アルファ線を放出する放射性物質: 4×10 <sup>-3</sup> (Bq/cm <sup>3</sup> ) ベータ線を放出する放射性物質: 4×10 <sup>-2</sup> (Bq/cm <sup>3</sup> ) <sup>3</sup> H: 2×10 <sup>-1</sup> (Bq/cm <sup>3</sup> )
排水口 別内訳	1号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	
	2号機排水口	検出されず	検出されず	
	3号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	
	4号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	
年間放出管理目標値*1			1.4×10 <sup>13</sup> *2	

\*1 放出管理目標値は「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針(原子力委員会決定)」に定められた公衆の線量目標値(50 μSv/年)を下回るように設定した

年間の放出放射能である。

\*2 トリチウムについては、放出管理の年間基準値を記載。

トリチウムは公衆への影響が比較的小さく、上記指針に定められた線量目標値を年間の放出放射能として設定したものである。

## 試料採取時の付帯データ

## (ア) 海水

採取地点名	採取年月日	気温(°C)	水温(°C)	pH	Cl <sup>-</sup> (%)
第二(発)取水口	R2. 5. 15	19.2	14.0	8.1	18.6
	R2. 8. 21	26.1	22.5	8.1	18.8
	R2. 11. 16	19.7	15.3	8.1	18.6
第二(発)南放水口	R2. 5. 15	23.7	14.3	8.2	18.3
	R2. 8. 21	31.0	23.8	8.1	18.9
	R2. 11. 16	19.0	15.2	8.1	18.6
第二(発)北放水口	R2. 5. 15	21.0	14.7	8.1	18.6
	R2. 8. 21	31.0	23.2	8.2	18.4
	R2. 11. 16	17.4	15.0	8.1	18.6

令和2年度月別降水データ表

月	日数(d)	時間(h)	降水量(mm)
R2.4	11	62	197.0
5	12	86	147.0
6	17	68	99.5
7	23	136	298.0
8	3	9	11.0
9	13	67	150.5
10	8	87	112.5
11	3	13	10.0
12	6	17	9.0
R3.1			
2			
3			
合計	96	545	1034.5

環境試料測定日

試料名	採取地点名	採取年月日	測定年月日	
			全α・β 放射能	γ
大気浮遊じん	M P - 1	R2.10.1 ~R2.10.31	連続	R2.11.12
		R2.11.1 ~R2.11.30	連続	R2.12.15
		R2.12.1 ~R2.12.31	連続	R3.1.20
	M P - 7	R2.10.1 ~R2.10.31	連続	R2.11.10
		R2.11.1 ~R2.11.30	連続	R2.12.15
		R2.12.1 ~R2.12.31	連続	R3.1.20

試料名	採取地点名	採取年月日	測定年月日							
			γ	<sup>3</sup> H	<sup>90</sup> Sr	<sup>238</sup> Pu※1	<sup>239+240</sup> Pu※1	<sup>241</sup> Am※1	<sup>244</sup> Cm※1	
土	発電所敷地内	R2.11.5	R2.11.12				R2.10.13	R2.10.13	R2.11.12	R2.11.12
	榎葉町 <small>なみくら</small> 波倉	R2.11.5	R2.11.12				R2.10.14	R2.10.14	R2.11.12	R2.11.12
	富岡町 <small>こはま</small> 小浜	R2.11.5	R2.11.12				R2.10.13	R2.10.13	R2.11.12	R2.11.12
	富岡町 <small>しもこおりやま</small> 下郡山	R2.11.5	R2.11.12				R2.10.13	R2.10.13	R2.11.12	R2.11.12
海水	取水口	R2.11.16	R2.12.14	R2.12.6						
	南放水口	R2.11.16	R2.12.9	R2.12.5						
	北放水口	R2.11.16	R2.12.14	R2.12.5						
海底土	南放水口	R2.11.16	R2.12.2							
	北放水口	R2.11.16	R2.12.1							
松葉	敷地の南境界付近	R2.11.6	R2.11.12							
	敷地の北境界付近	R2.11.6	R2.11.12							

(注)「/」は測定対象外。

※1：令和2年度第一四半期（5月13日）採取分。

# 令和2年度 第3四半期 空間線量率等の変動グラフ

東京電力ホールディングス株式会社

福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所


福島第二原子力発電所

## 目次

空間線量率			
1	福島第一原子力発電所 MP-1	・・・	49
2	福島第一原子力発電所 MP-2	・・・	50
3	福島第一原子力発電所 MP-3	・・・	51
4	福島第一原子力発電所 MP-4	・・・	52
5	福島第一原子力発電所 MP-5	・・・	53
6	福島第一原子力発電所 MP-6	・・・	54
7	福島第一原子力発電所 MP-7	・・・	55
8	福島第一原子力発電所 MP-8	・・・	56
9	福島第二原子力発電所 MP-1	・・・	57
10	福島第二原子力発電所 MP-2	・・・	58
11	福島第二原子力発電所 MP-3	・・・	59
12	福島第二原子力発電所 MP-4	・・・	60
13	福島第二原子力発電所 MP-5	・・・	61
14	福島第二原子力発電所 MP-6	・・・	62
15	福島第二原子力発電所 MP-7	・・・	63
	大気浮遊じん (推移)		
1	福島第一原子力発電所 MP-3	・・・	64
2	福島第一原子力発電所 MP-8	・・・	65
3	福島第二原子力発電所 MP-1	・・・	66
4	福島第二原子力発電所 MP-7	・・・	67
	大気浮遊じん (相関図)		
1	福島第一原子力発電所 MP-3	・・・	68
2	福島第一原子力発電所 MP-8	・・・	68
3	福島第二原子力発電所 MP-1	・・・	69
4	福島第二原子力発電所 MP-7	・・・	69


# 空間線量率の変動グラフ (MP-1)

福島第一原子力発電所

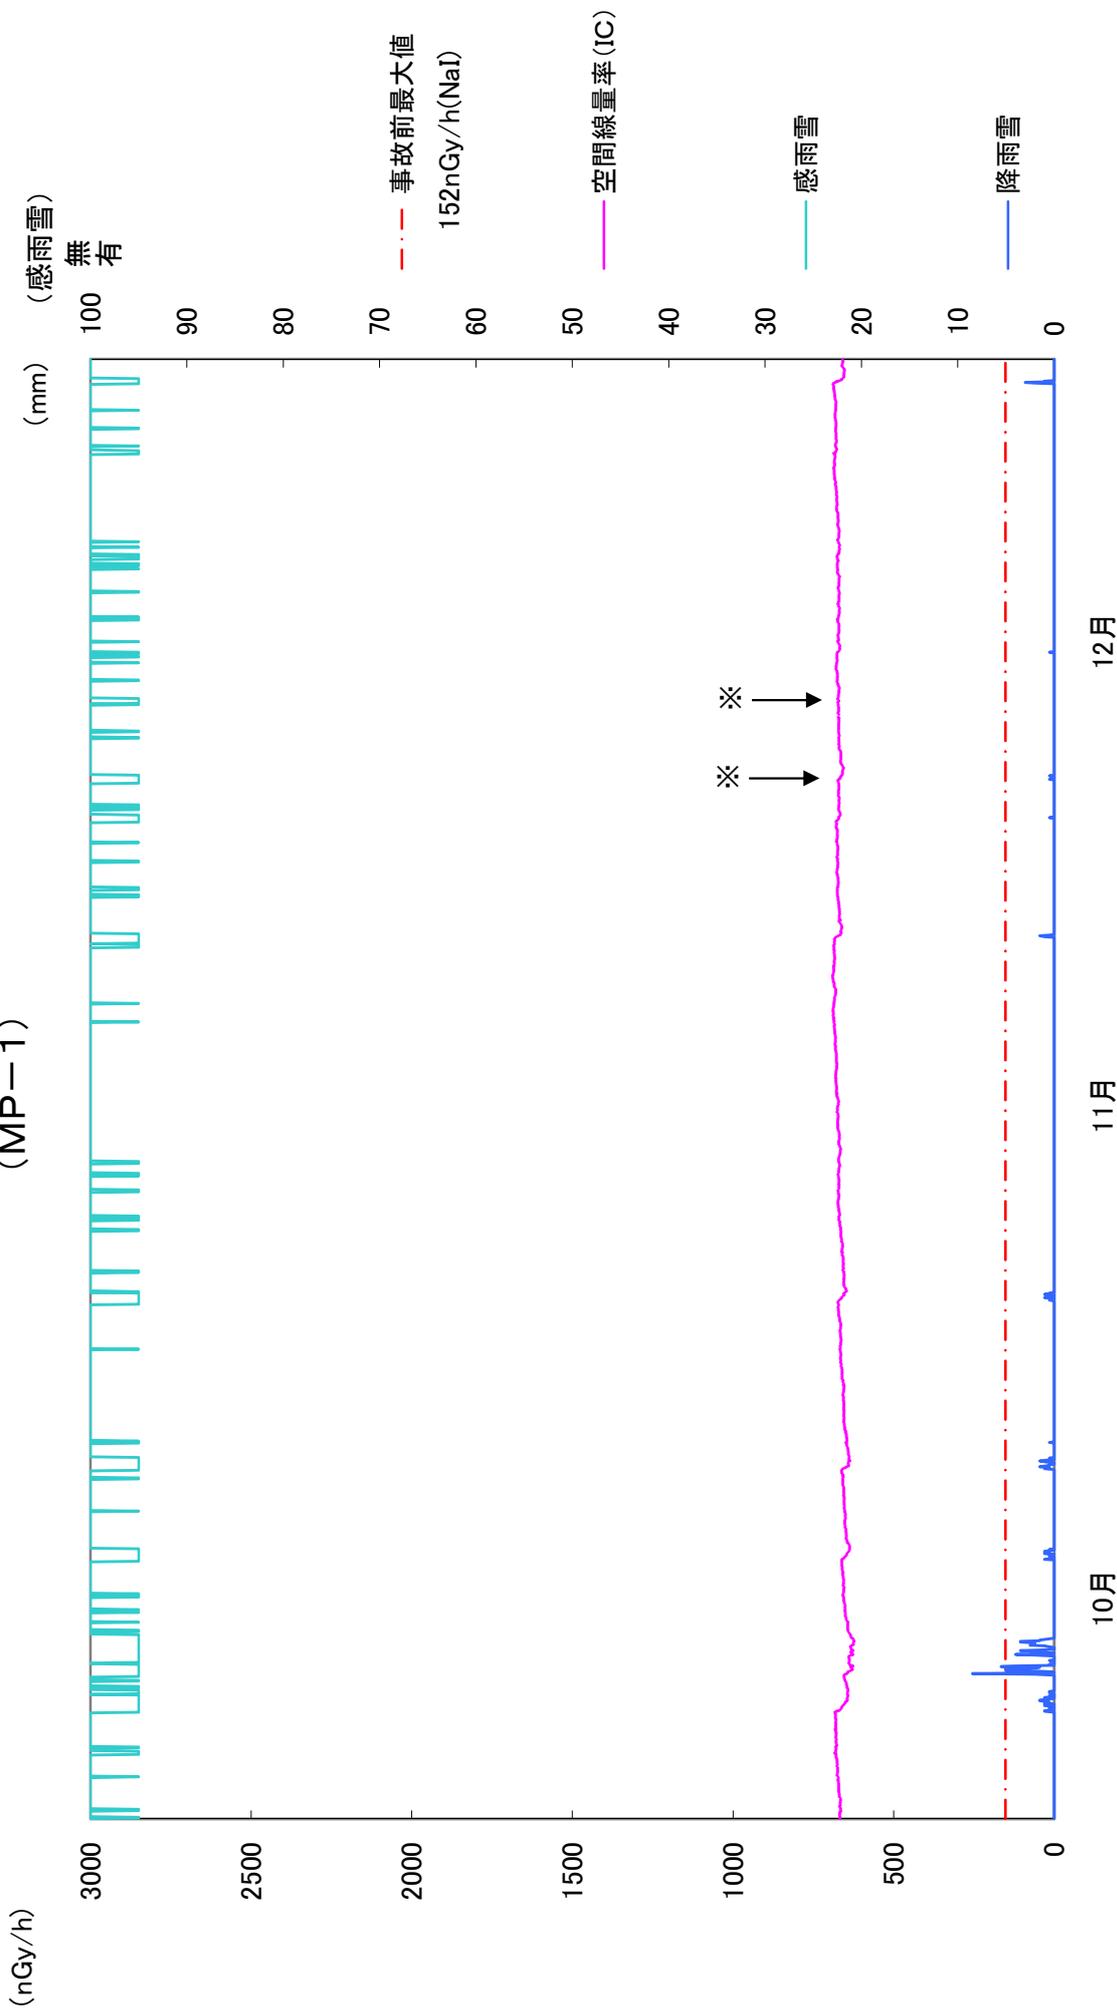

※点検及び定期保守作業に伴う欠測：12月4日・8日・9日・10日  
 欠測時には、代替測定器にて測定し、指示値に異常がないことを確認している。  
 周辺環境線量率のバックグラウンドが事故の影響で上昇したことにより、測定を電離箱式検出器(IC)にて行っている。


空間線量率の変動グラフ  
(MP-2)

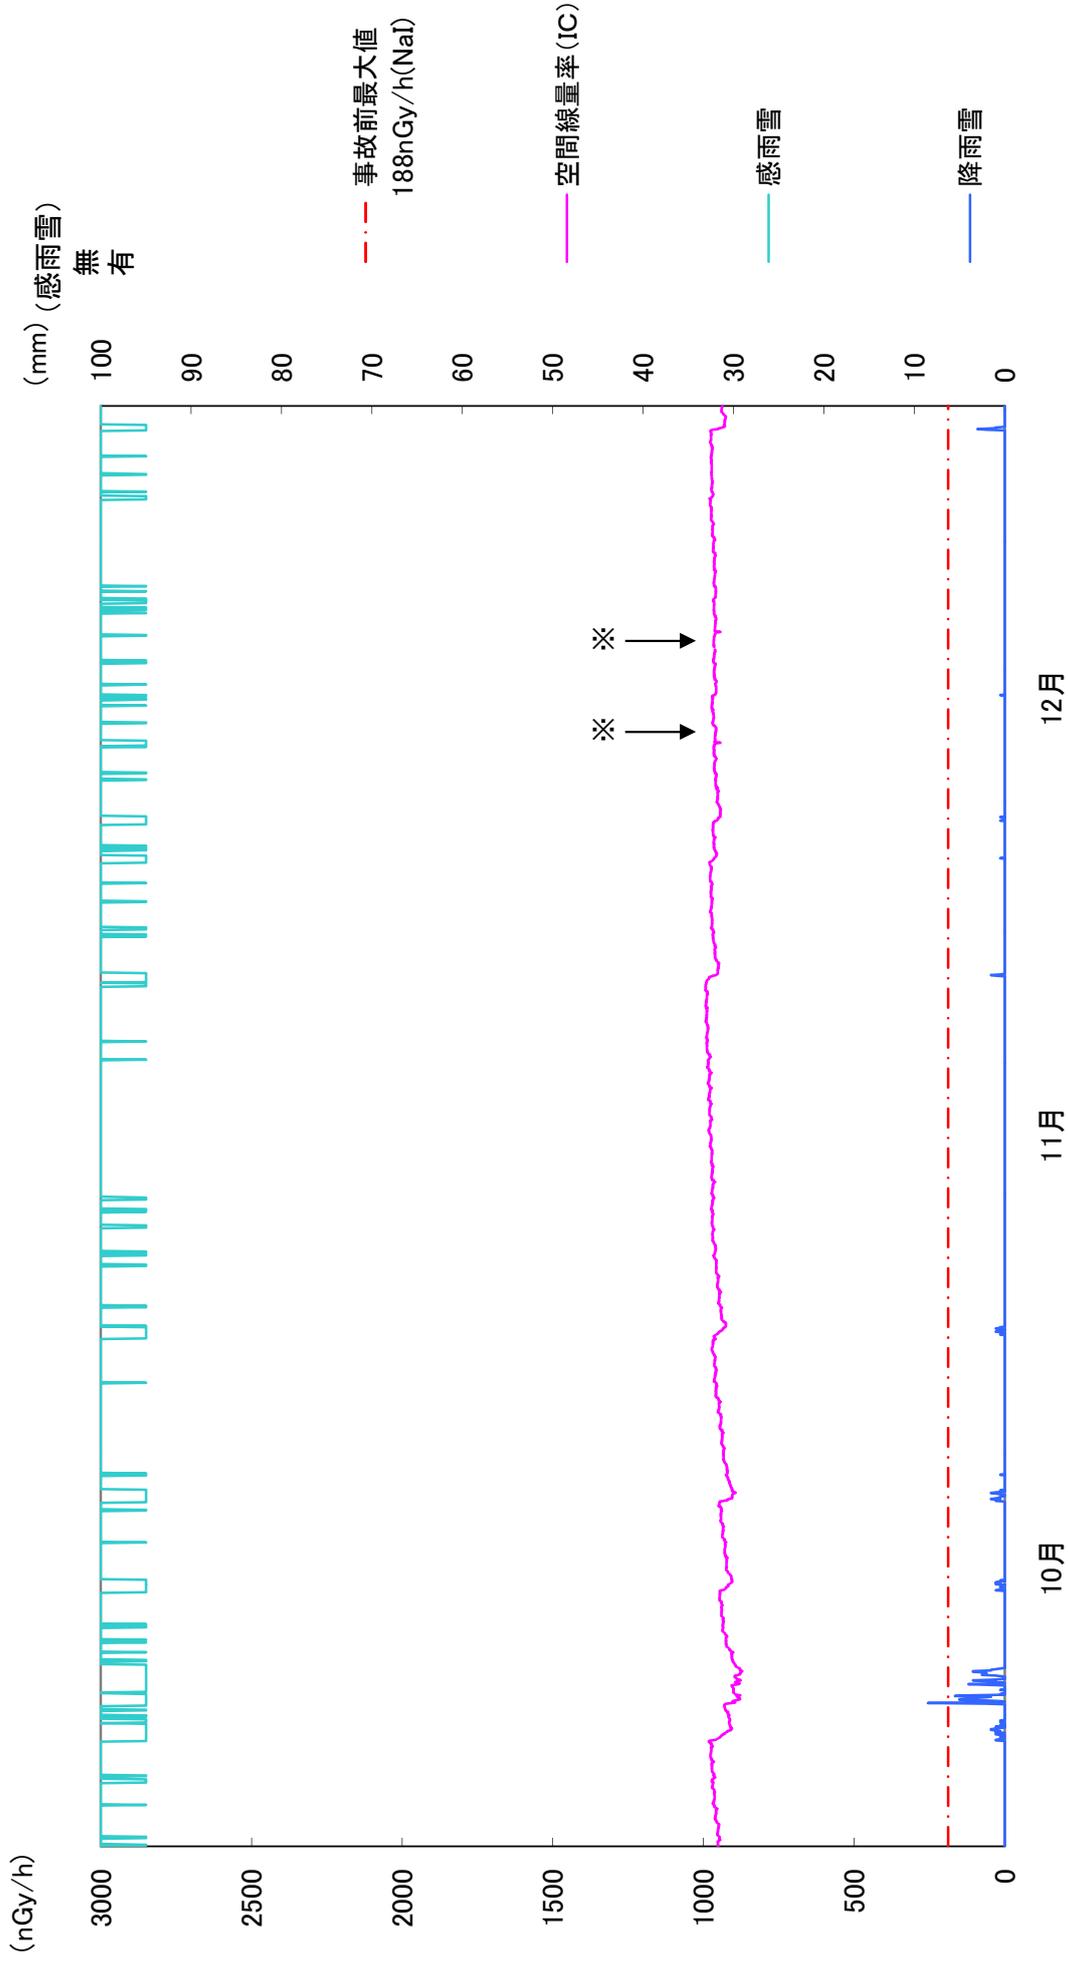

※点検及び定期保守作業に伴う欠測:12月11日・15日・16日・17日  
 欠測時には、代替測定器にて測定し、指示値に異常がないことを確認している。  
 周辺環境線量率のバックグラウンドが事故の影響で上昇したことにより、測定を電離箱式検出器(IC)にて行っている。

# 空間線量率の変動グラフ (MP-3)


福島第一原子力発電所

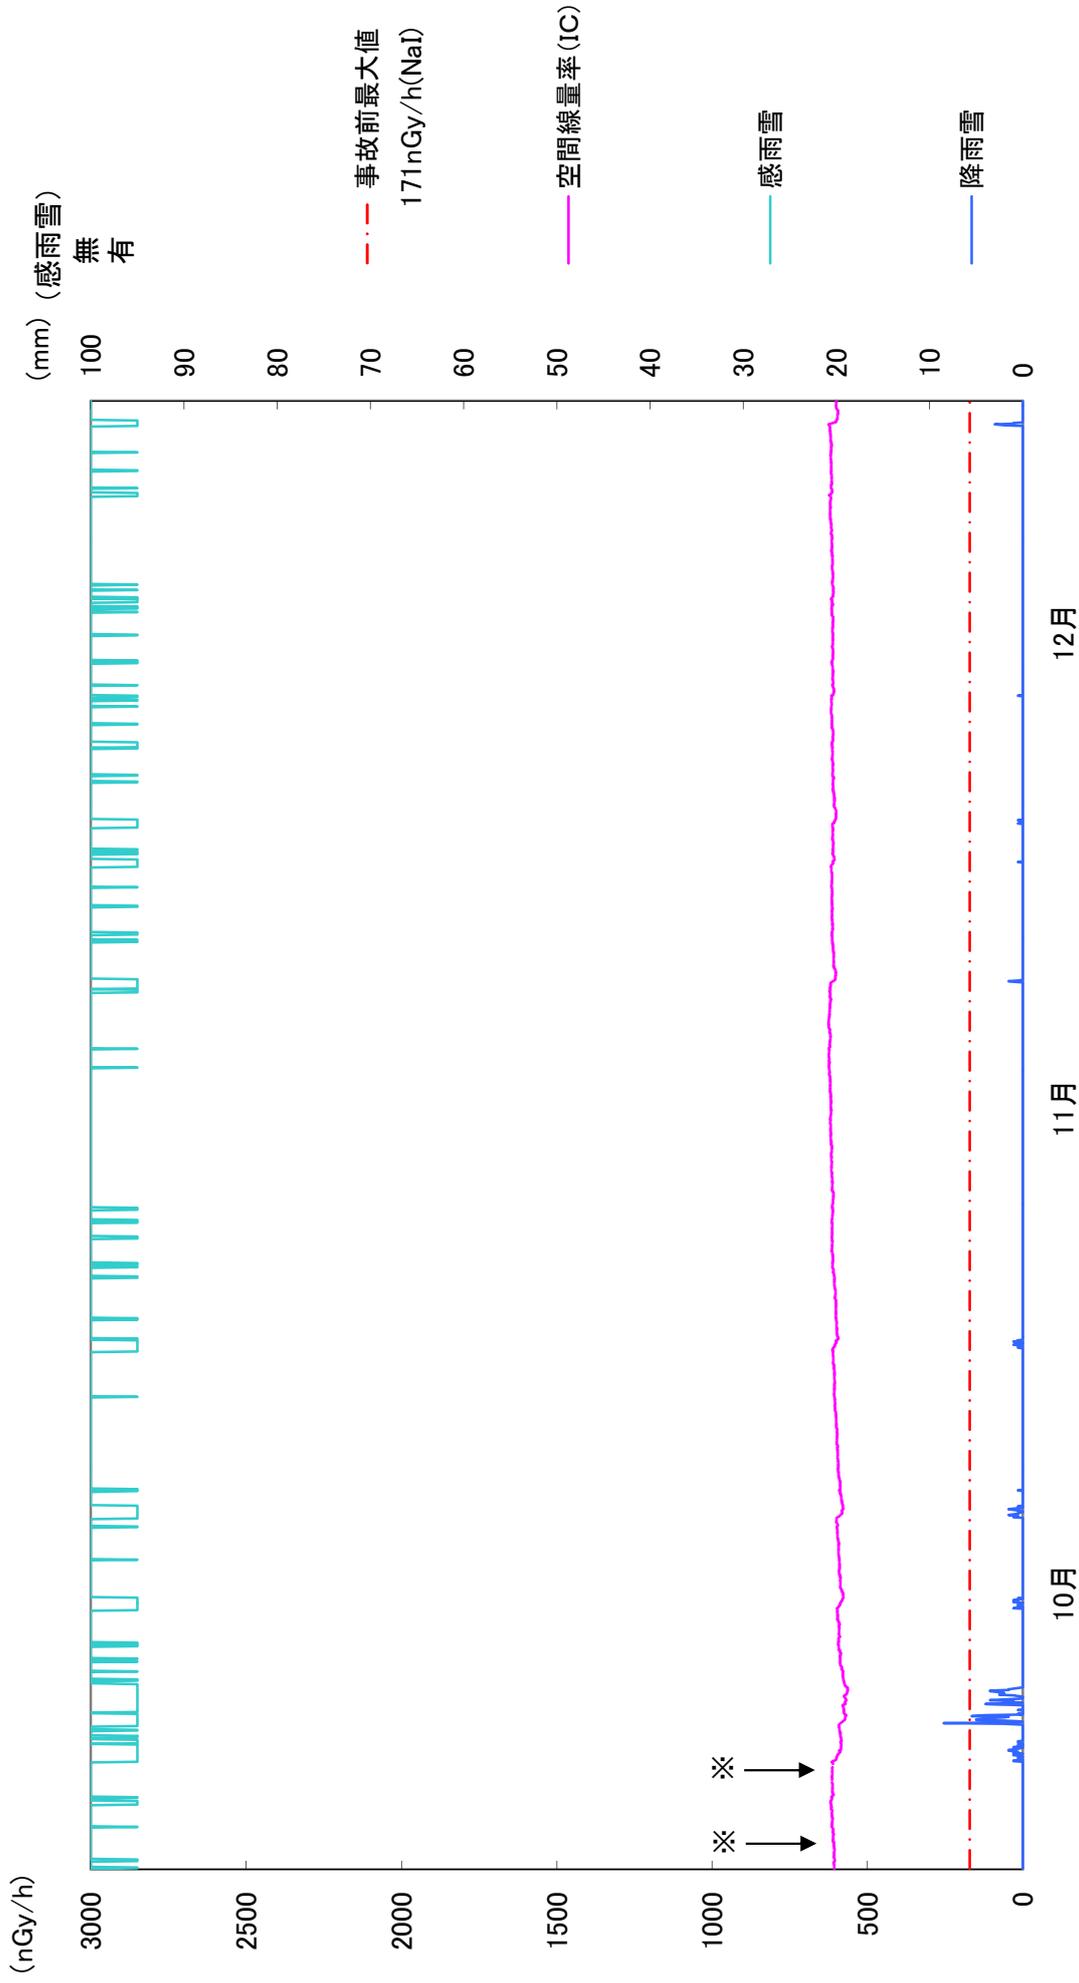

※点検及び定期保守作業に伴う欠測:10月2日・6日・7日・8日  
 欠測時には、代替測定器にて測定し、指示値に異常がないことを確認している。  
 周辺環境線量率のバックグラウンドが事故の影響で上昇したことにより、測定を電離箱式検出器(IC)にて行っている。

空間線量率の変動グラフ


(MP-4)

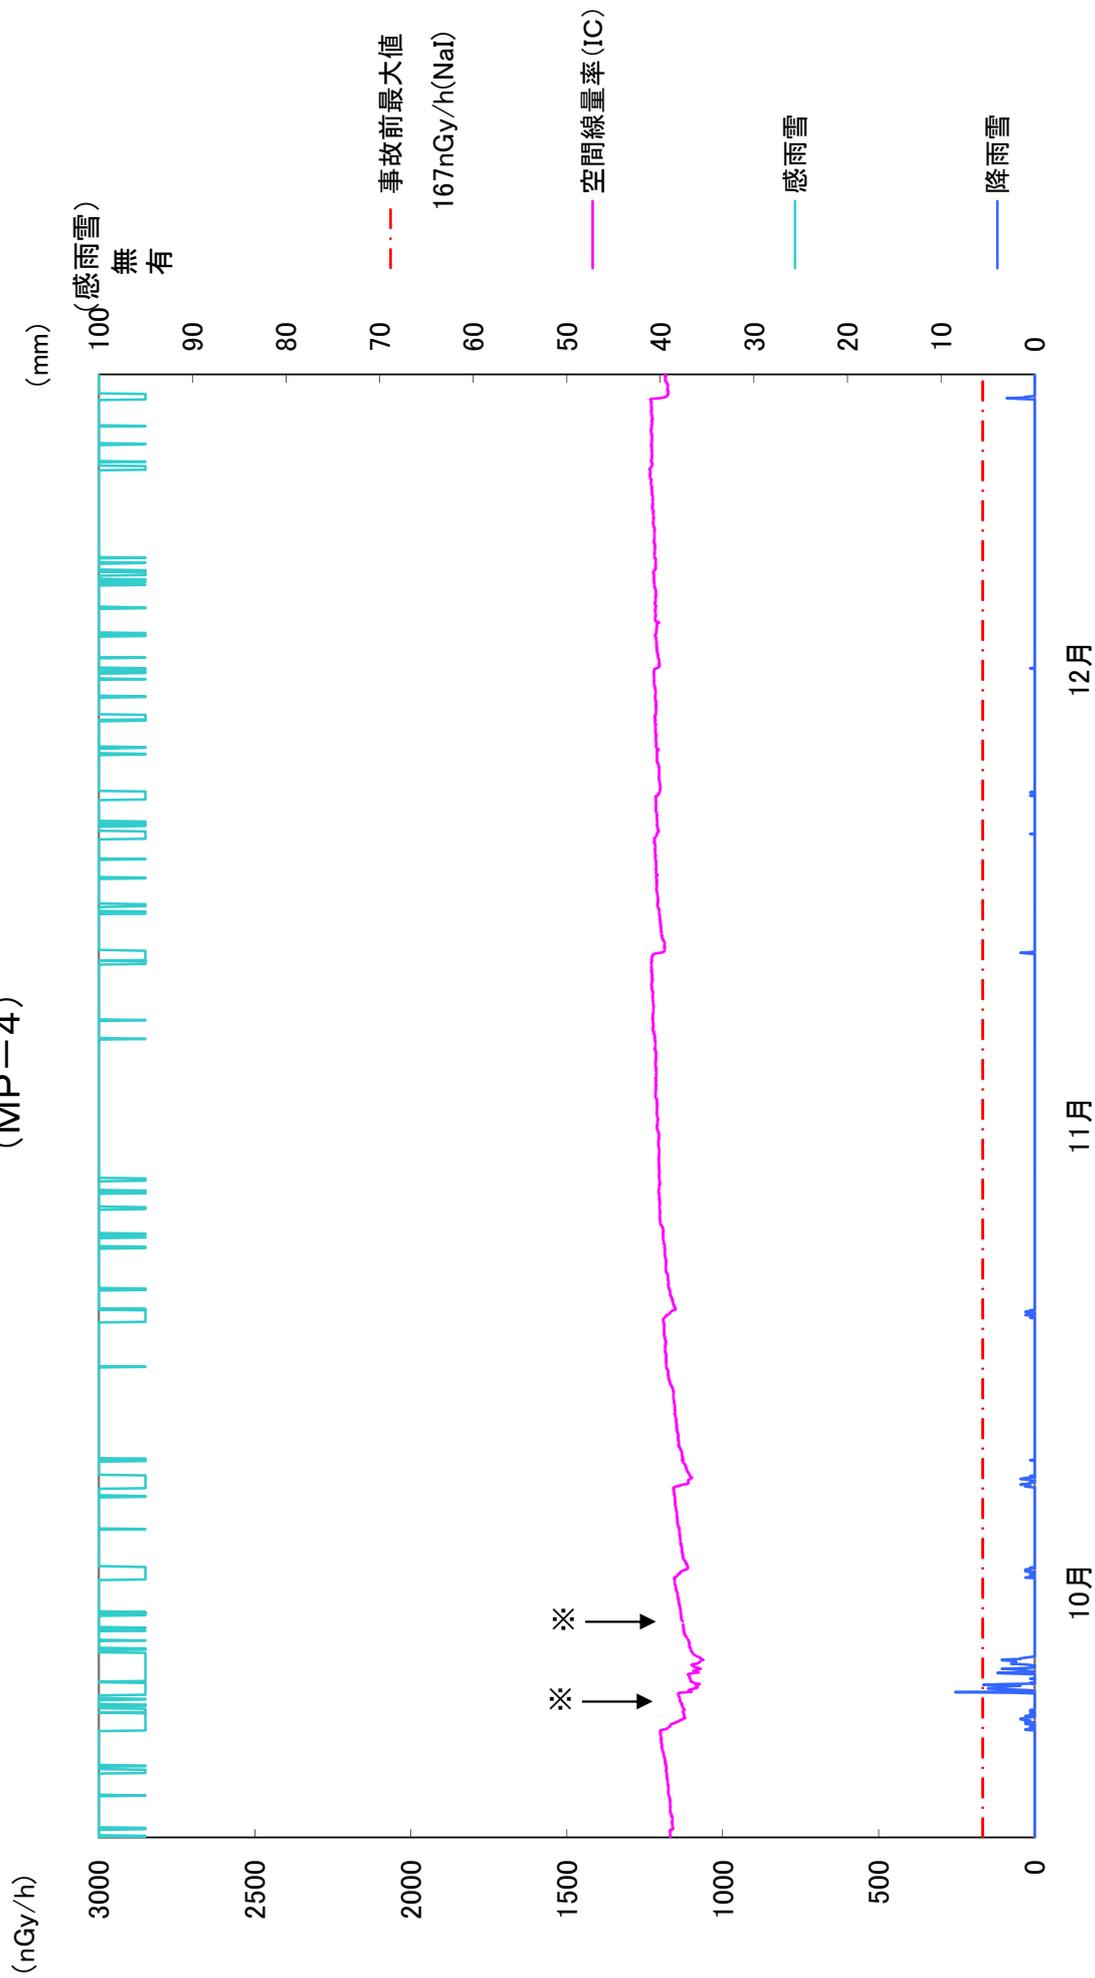

※点検及び定期保守作業に伴う欠測:10月9日・13日・14日・15日  
 欠測時には、代替測定器にて測定し、指示値に異常がないことを確認している。  
 周辺環境線量率のバックグラウンドが事故の影響で上昇したことにより、測定を電離箱式検出器(1C)にて行っている。

# 空間線量率の変動グラフ


福島第一原子力発電所

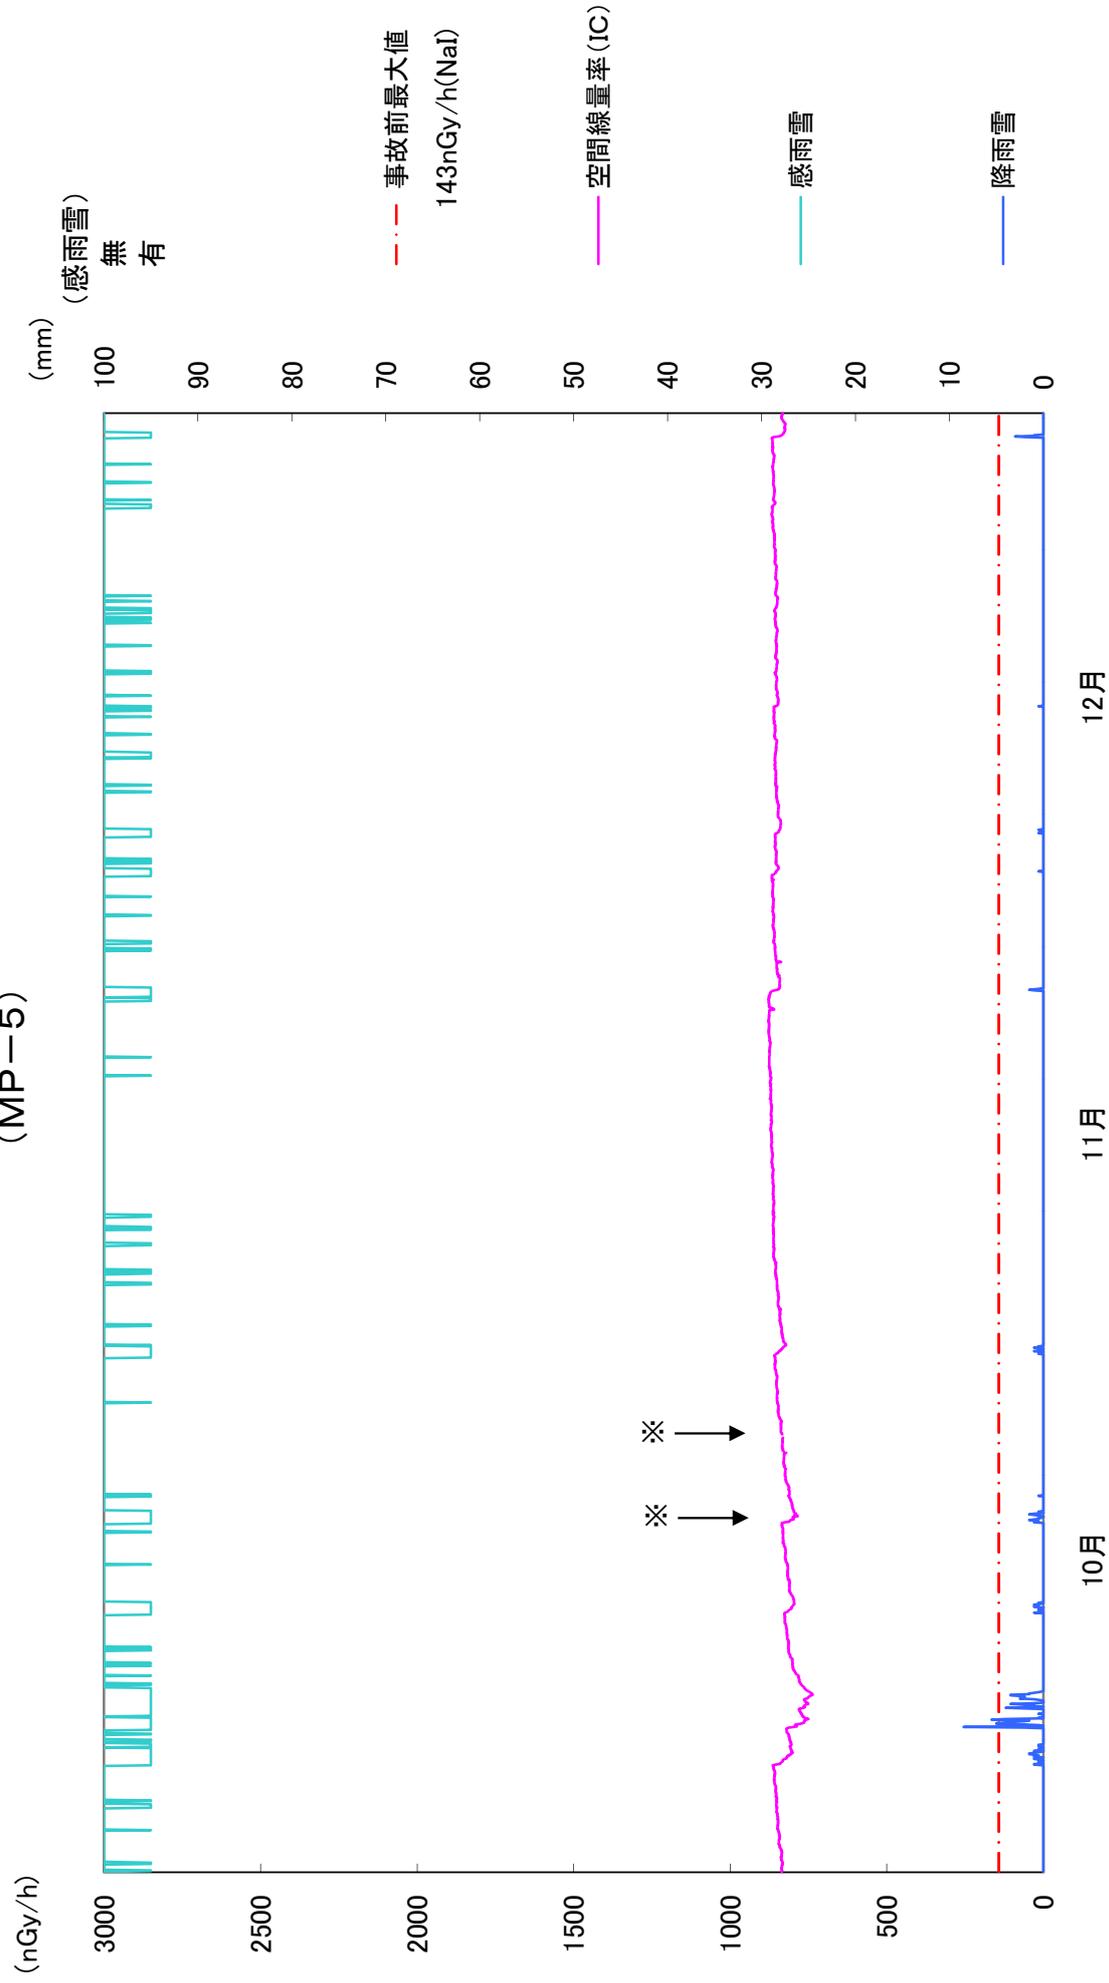

※点検及び定期保守作業に伴う欠測：10月23日・27日・28日・29日  
 欠測時には、代替測定器にて測定し、指示値に異常がないことを確認している。  
 周辺環境線量率のバックグラウンドが事故の影響で上昇したことにより、測定を電離箱式検出器(IC)にて行っている。

# 空間線量率の変動グラフ (MP-6)


福島第一原子力発電所

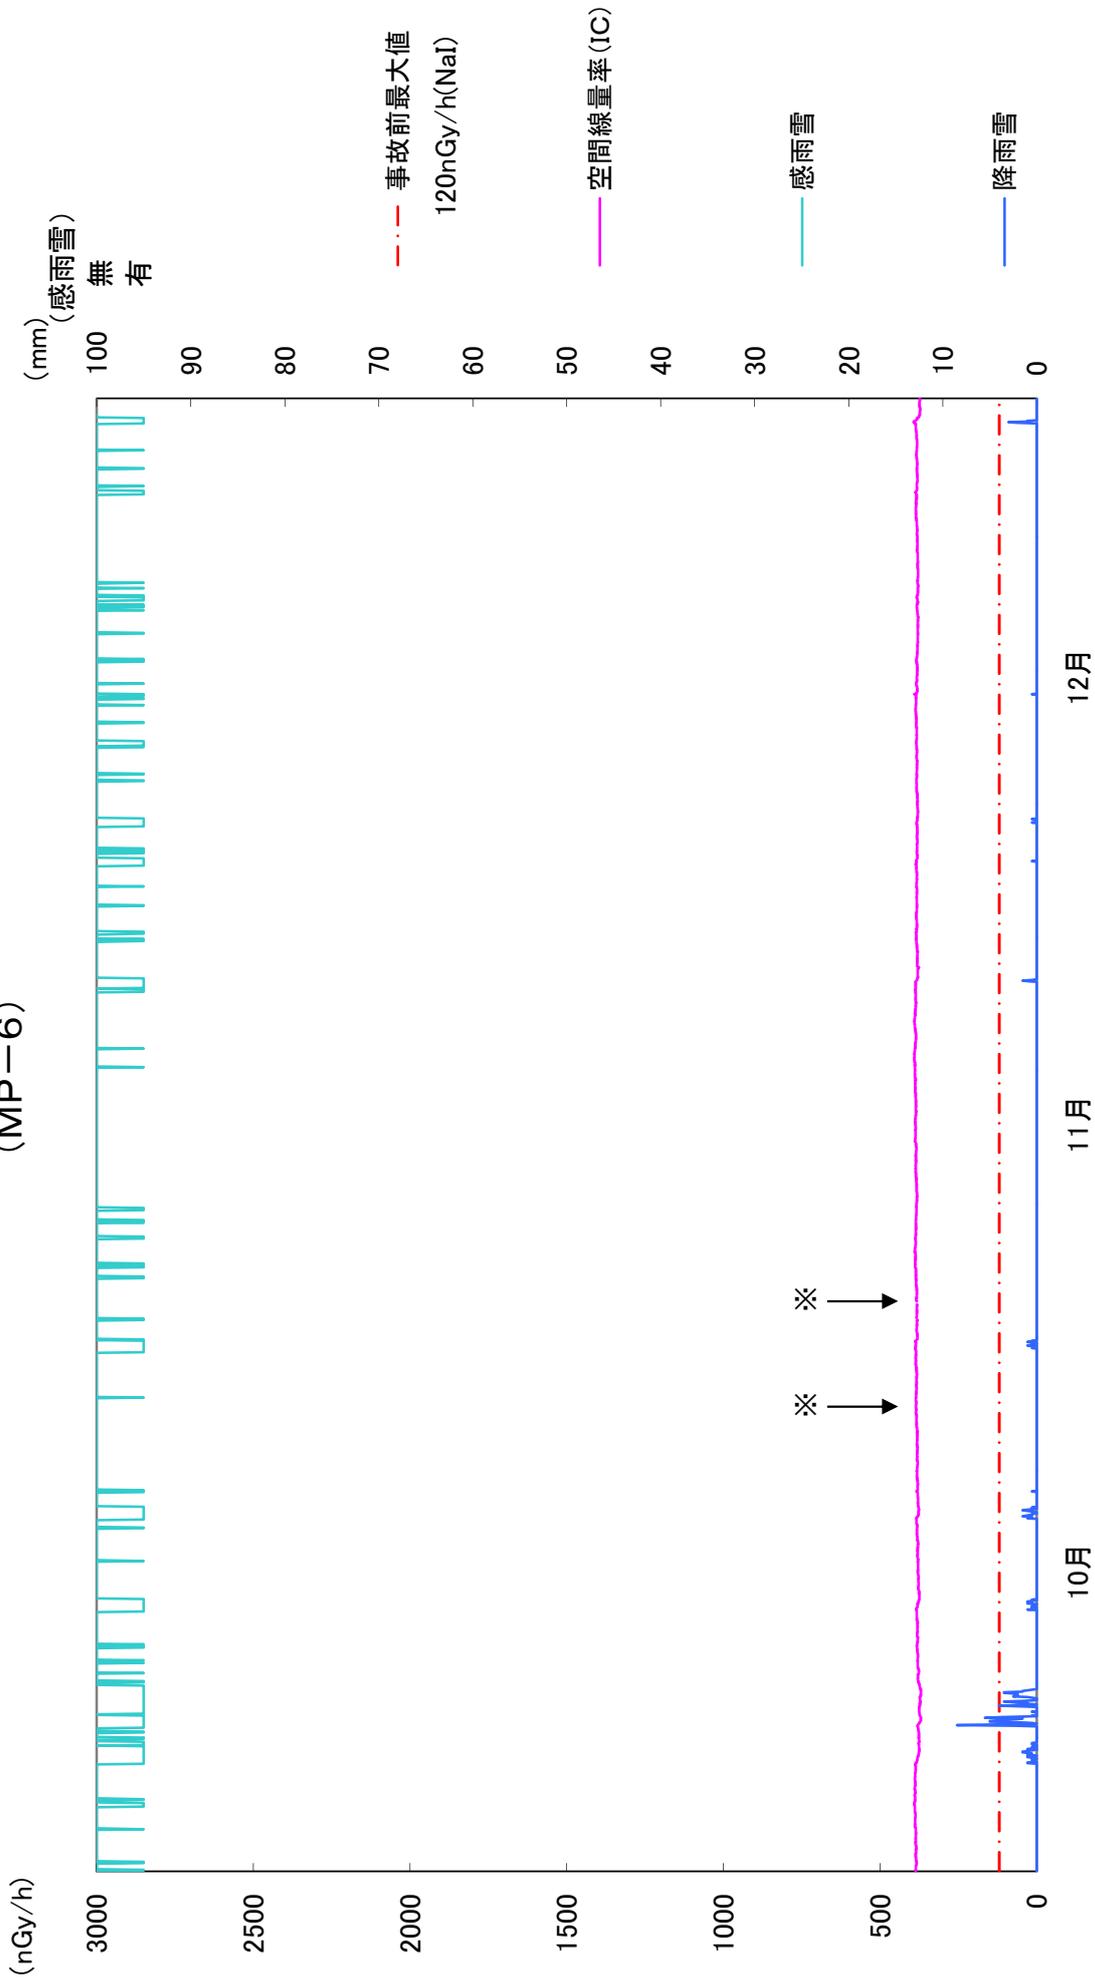

※点検及び定期保守作業に伴う欠測:10月30日、11月4日・5日・6日  
 欠測時には、代替測定器にて測定し、指示値に異常がないことを確認している。  
 周辺環境線量率のバックグラウンドが事故の影響で上昇したことにより、測定を電離箱式検出器(IC)にて行っている。

# 空間線量率の変動グラフ (MP-7)


福島第一原子力発電所

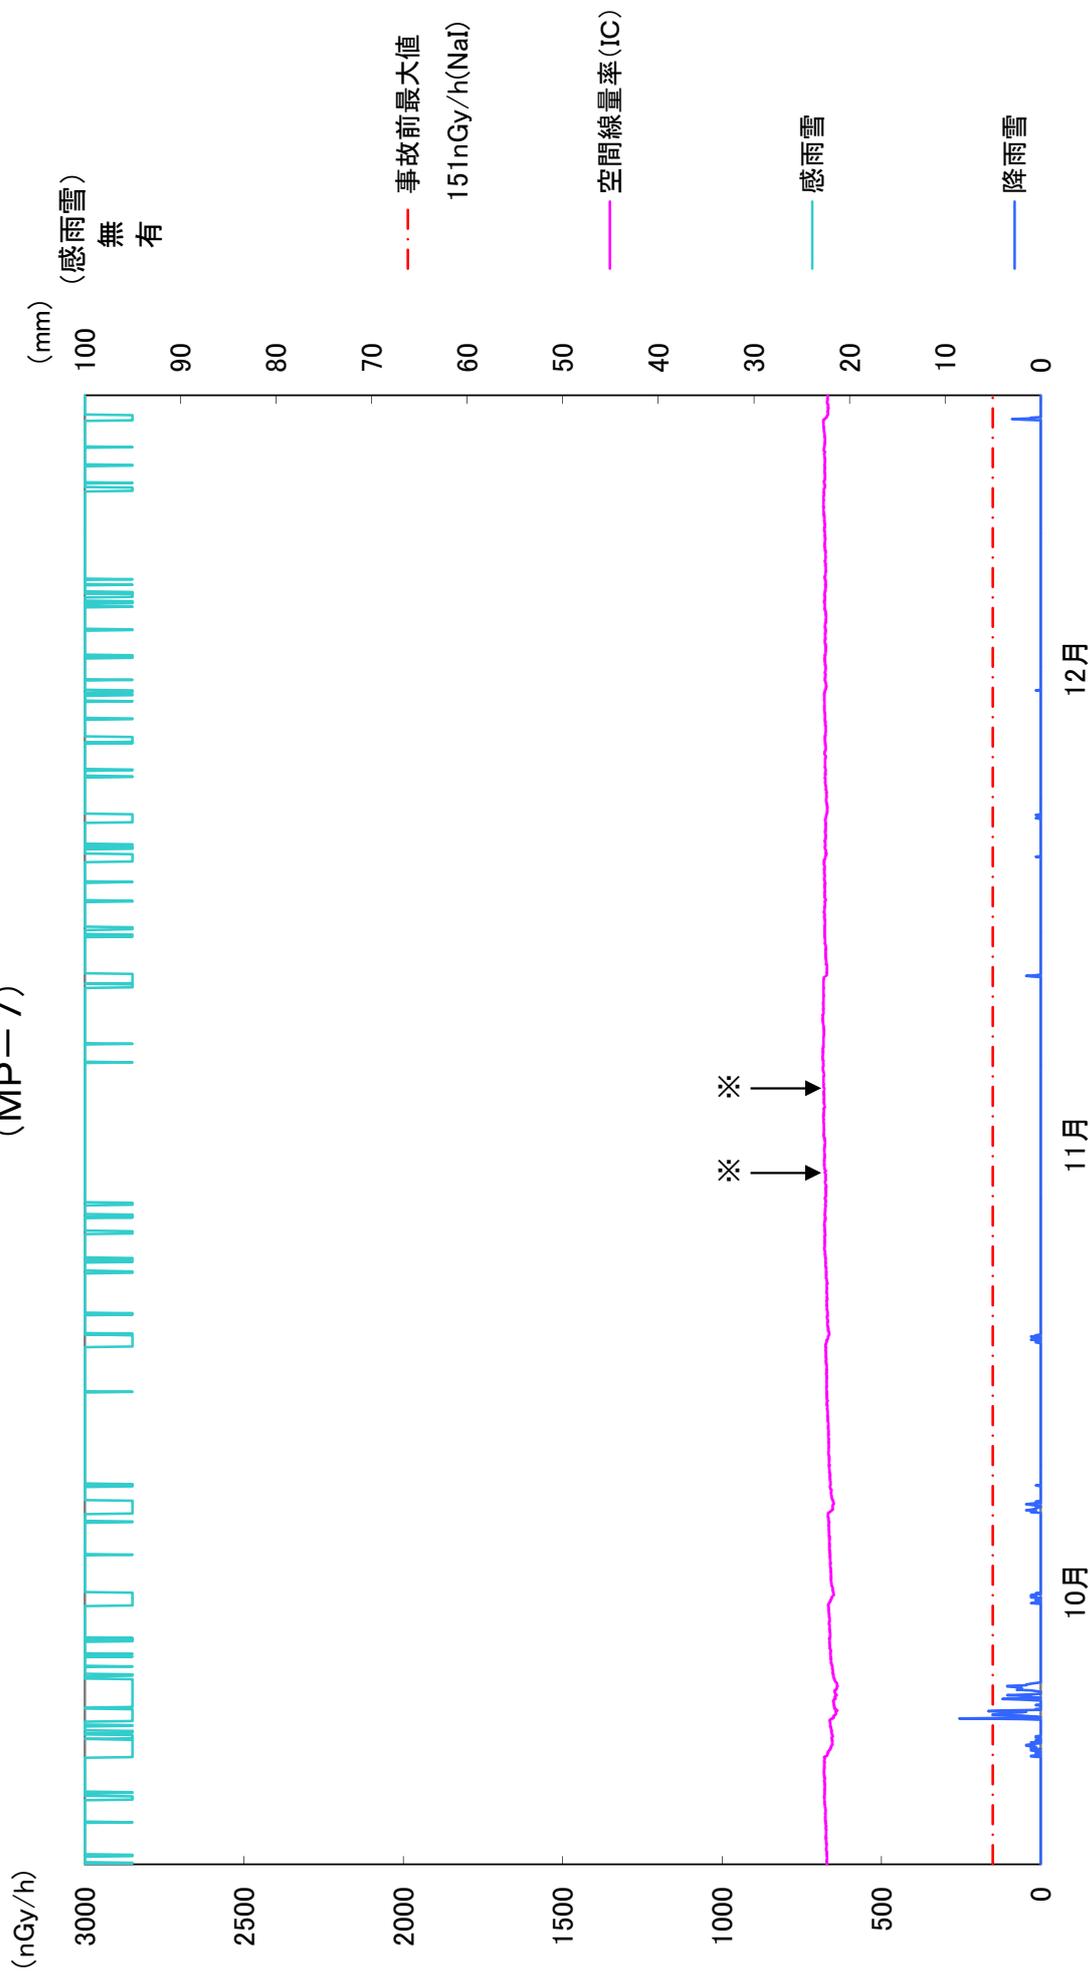

※点検及び定期保守作業に伴う欠測：11月13日・17日・18日・19日  
 欠測時には、代替測定器にて測定し、指示値に異常がないことを確認している。  
 MP-7、8については、高線量率の環境下にあることから、新たな放出によって上空を通過する放射性物質を検知しやすくするため、  
 検出器廻りに遮へいを設置し、地表面等からの放射線の影響を抑えている。  
 周辺環境線量率のバックグラウンドが事故の影響で上昇したことにより、測定を電離箱式検出器(IC)にて行っている。


# 空間線量率の変動グラフ (MP-8)

福島第一原子力発電所

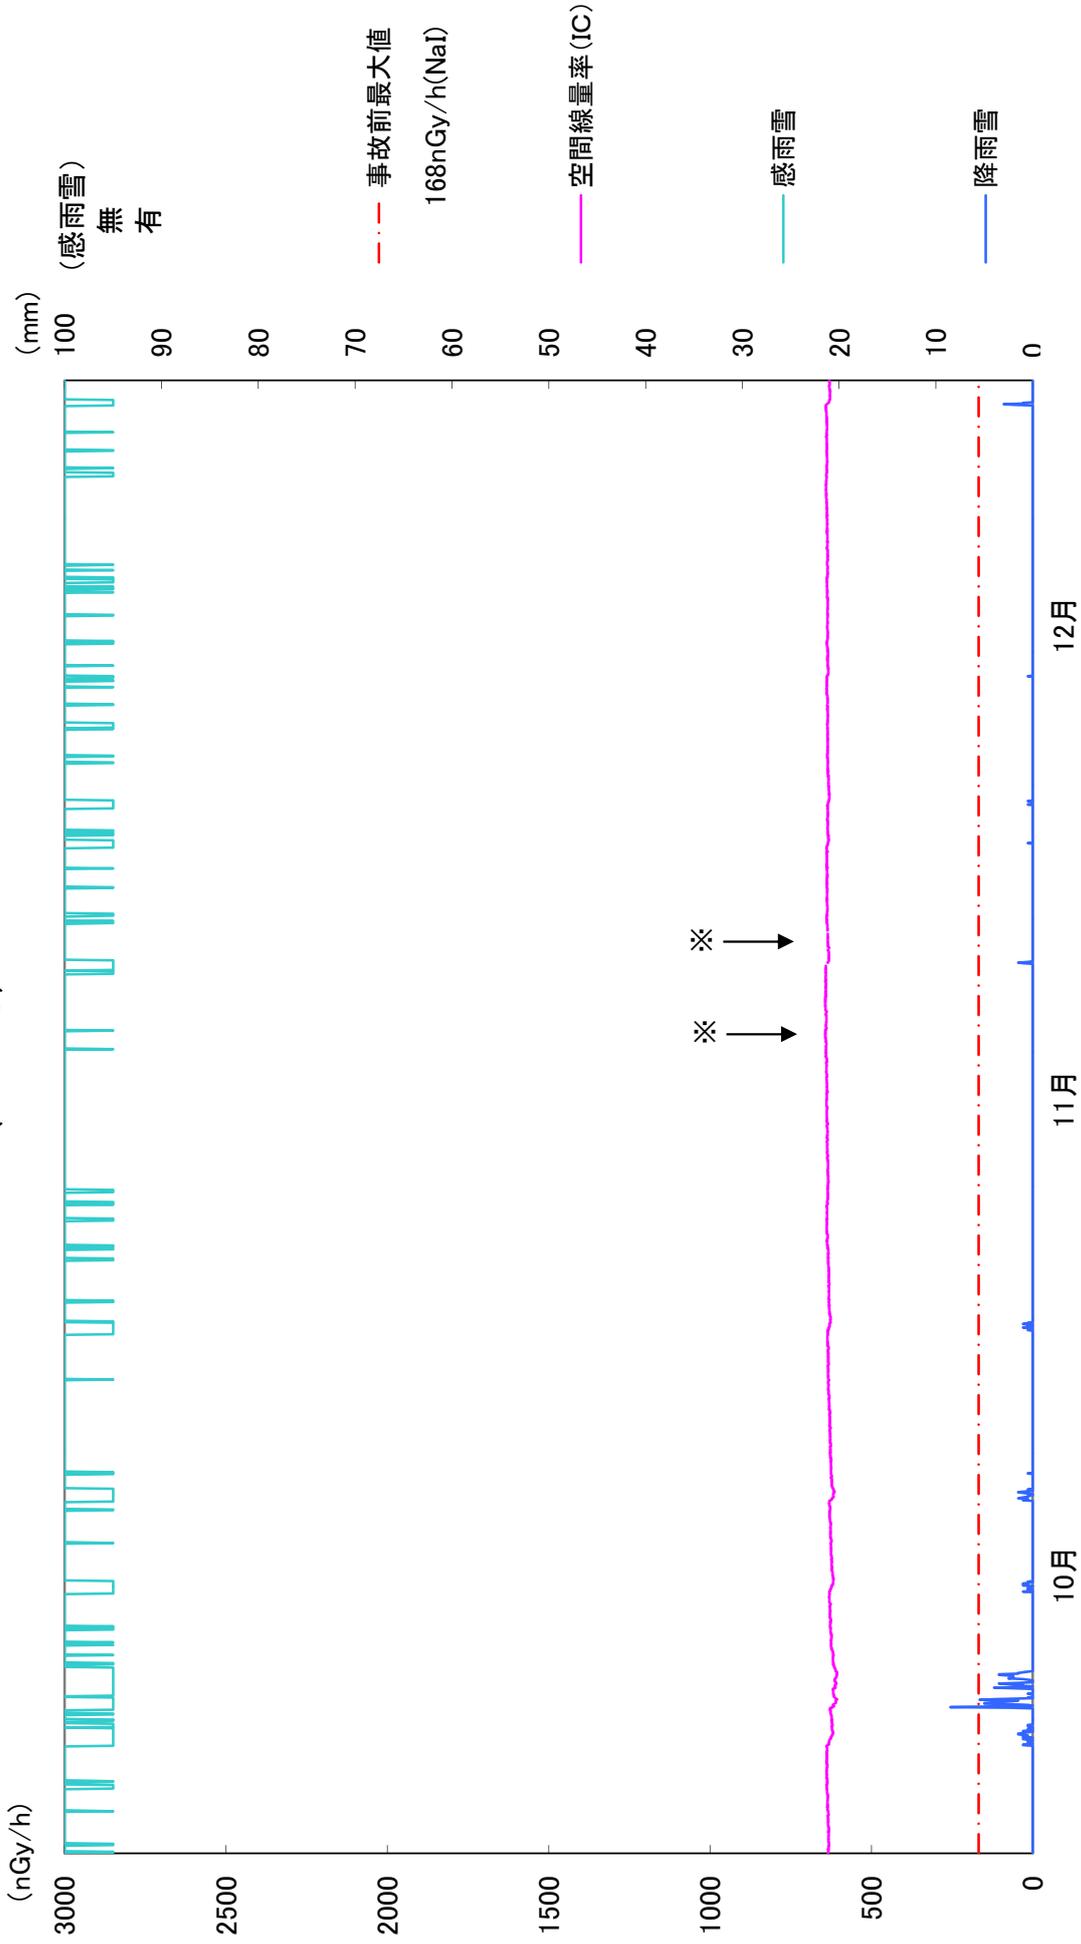


※点検及び定期保守作業に伴う欠測：11月20日・25日・26日・27日  
欠測時には、代替測定器にて測定し、指示値に異常がないことを確認している。  
MP-7, 8については、高線量率の環境下にあることから、新たな放出によって上空を通過する放射性物質を検知しやすくするため、  
検出器廻りに遮へいを設置し、地表面等からの放射線の影響を抑えている。  
周辺環境線量率のバックグラウンドが事故の影響で上昇したことにより、測定を電離箱式検出器(IC)にて行っている。

### 空間線量率の変動グラフ (MP-1)

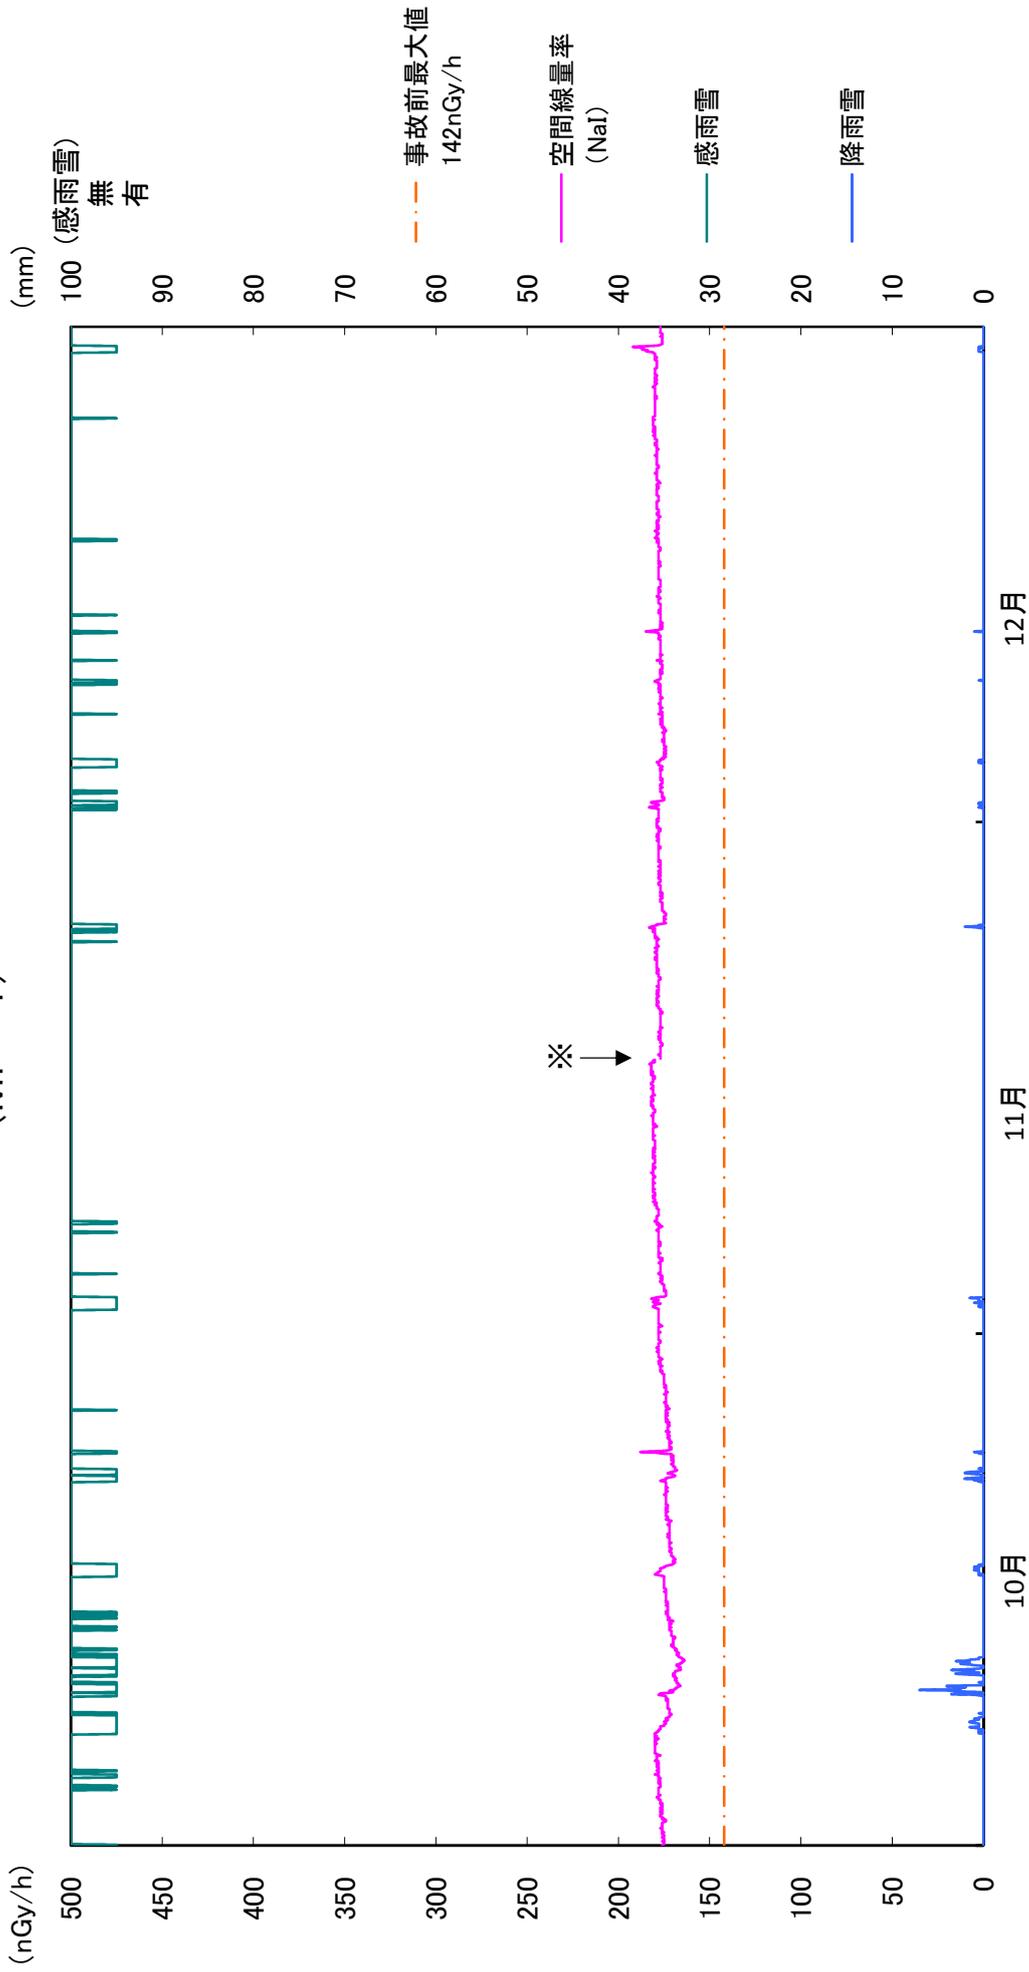


※点検に伴う欠測:11月17日  
欠測時には、可搬型モニタリングポストを設置し、指示値に異常がないことを確認している。

空間線量率の変動グラフ  
(MP-2)

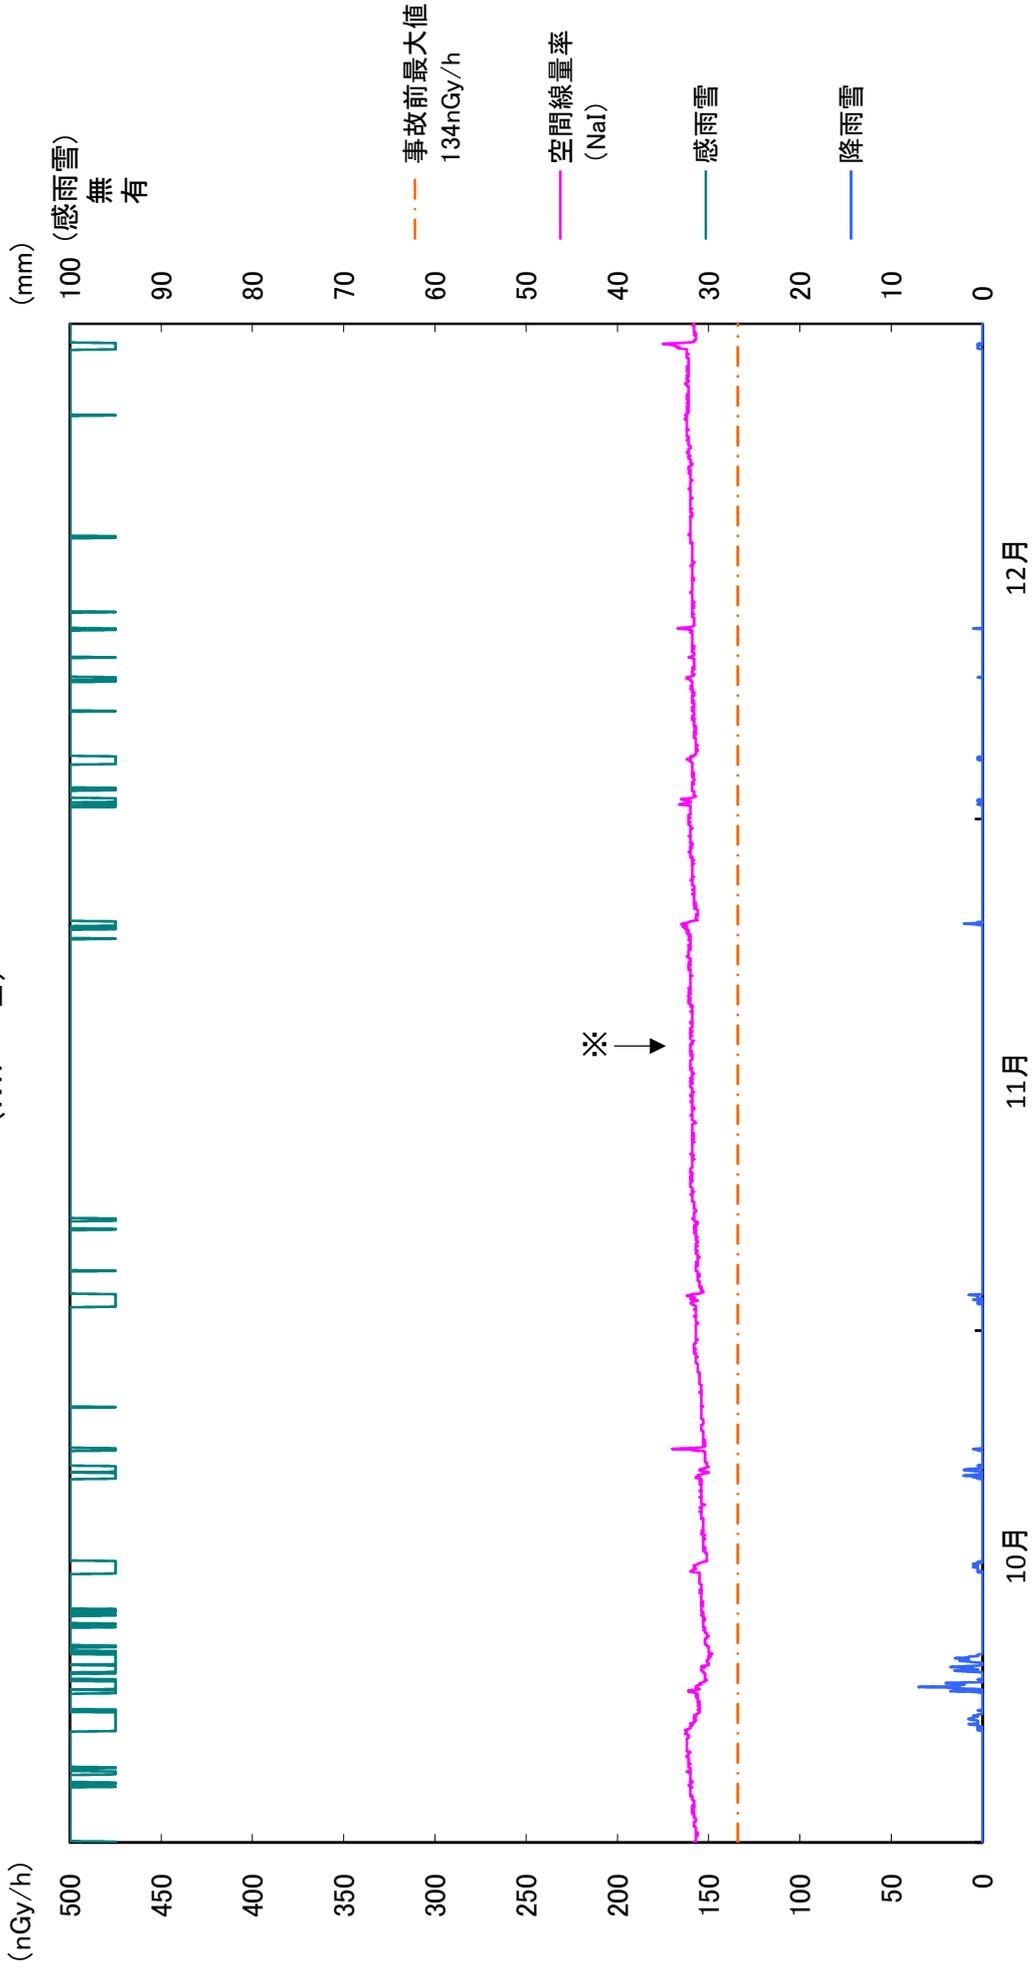


※点検に伴う欠測:11月18日  
欠測時には、可搬型モニタリングポストを設置し、指示値に異常がないことを確認している。

### 空間線量率の変動グラフ (MP-3)

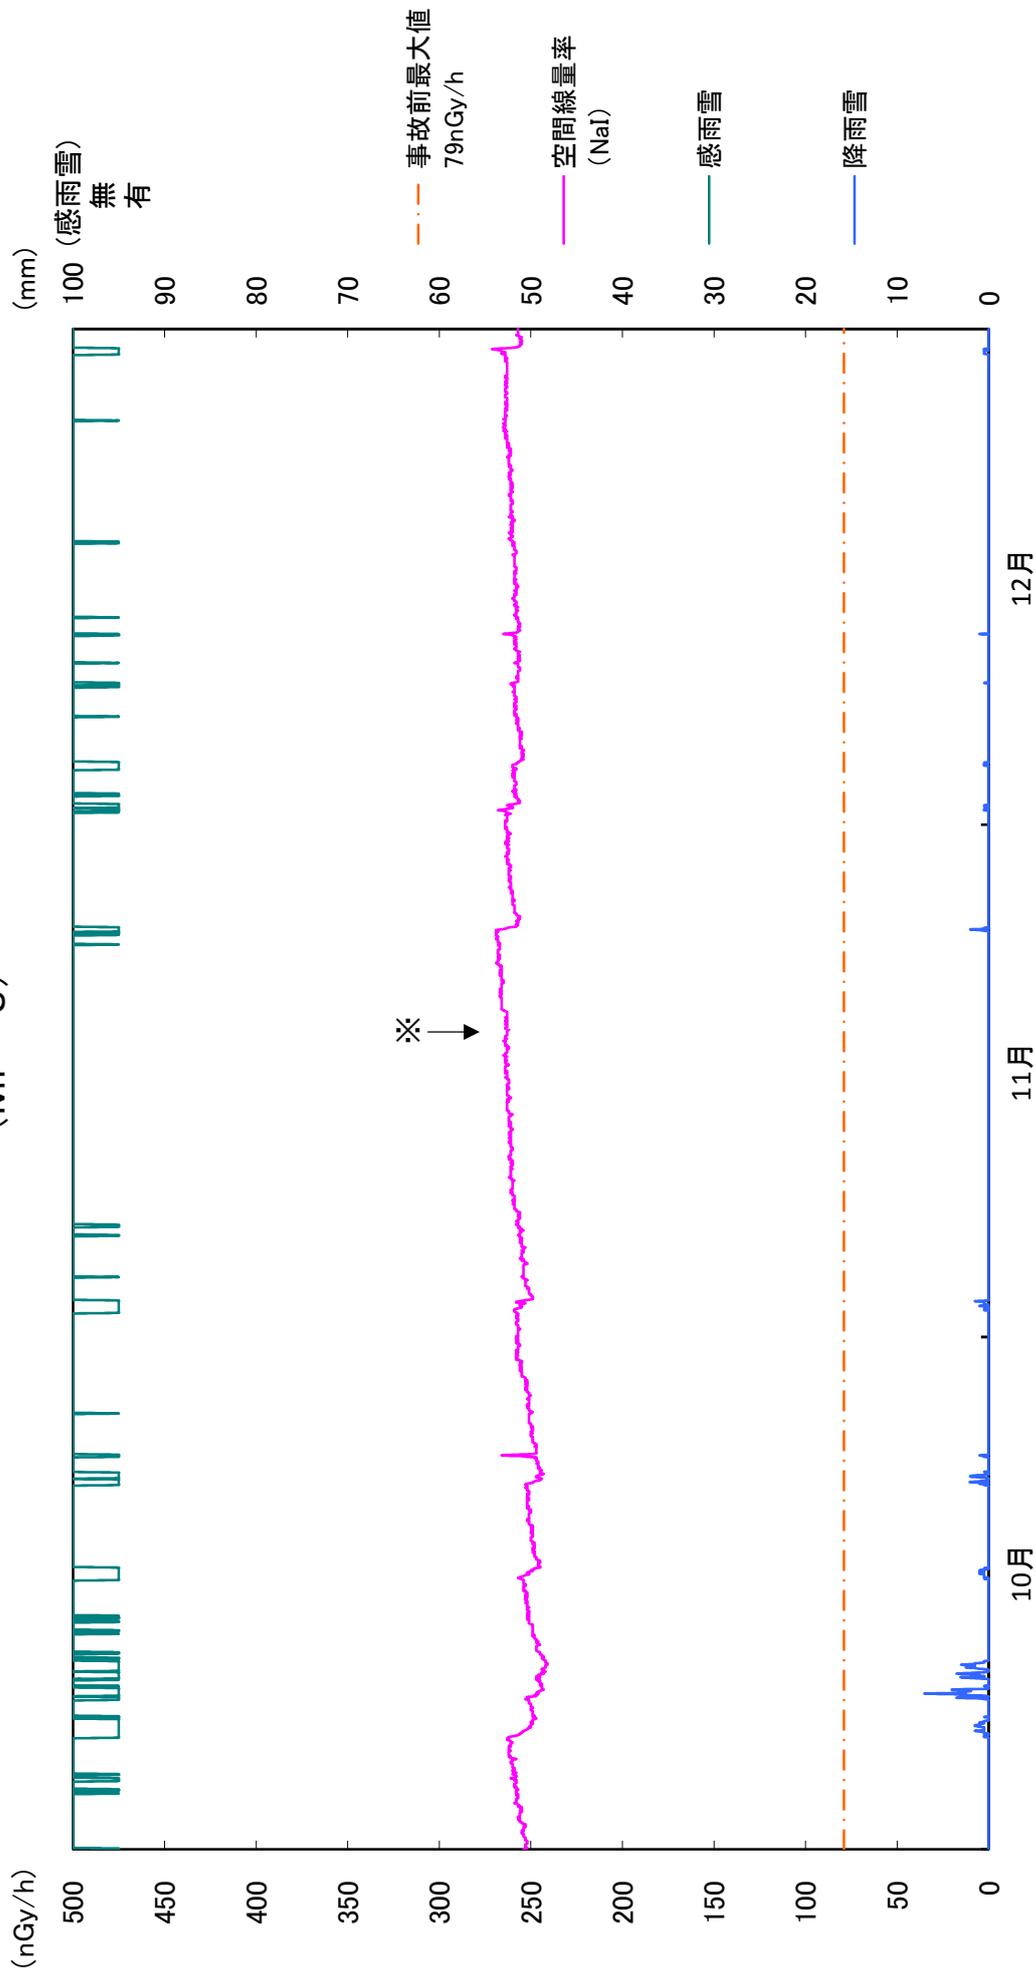


※点検に伴う欠測:11月19日  
欠測時には、可搬型モニタリングポストを設置し、指示値に異常がないことを確認している。

### 空間線量率の変動グラフ (MP-4)

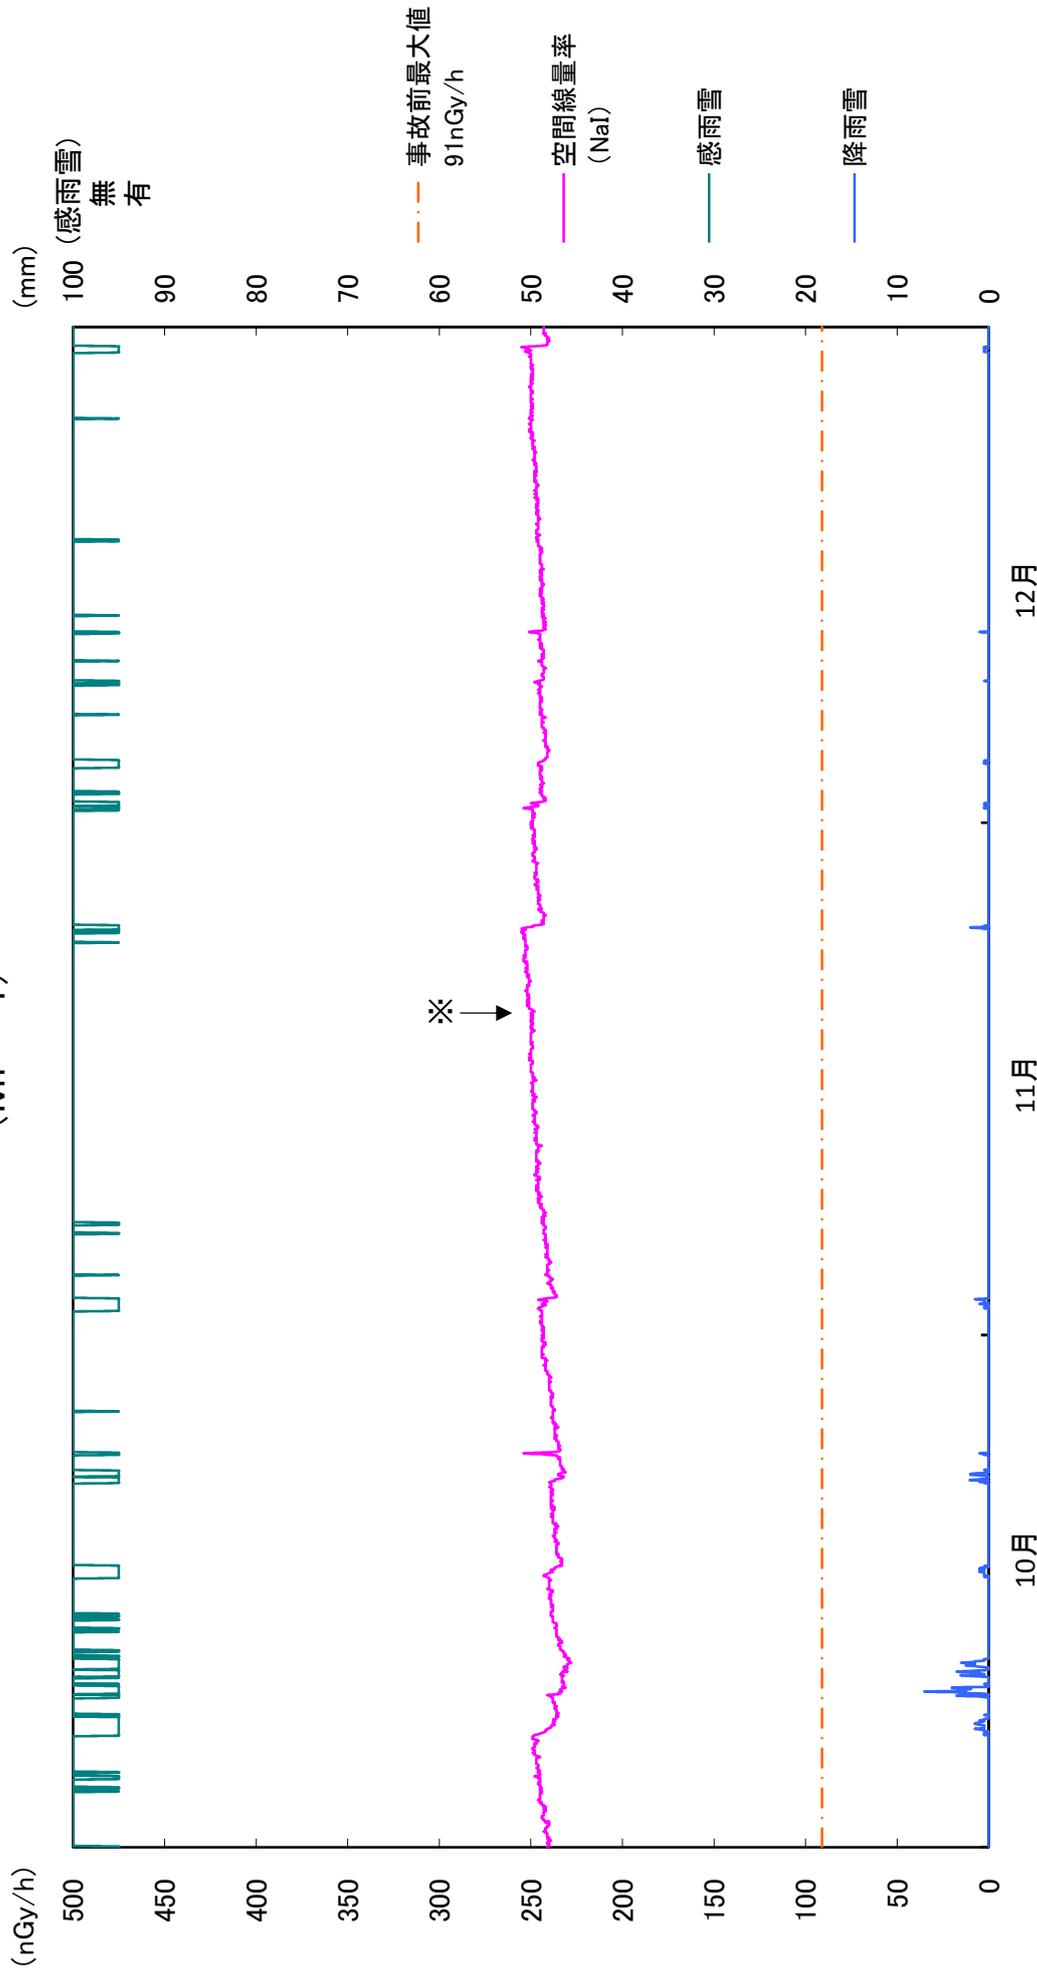


※点検に伴う欠測:11月20日  
欠測時には、可搬型モニタリングポストを設置し、指示値に異常がないことを確認している。

空間線量率の変動グラフ  
(MP-5)

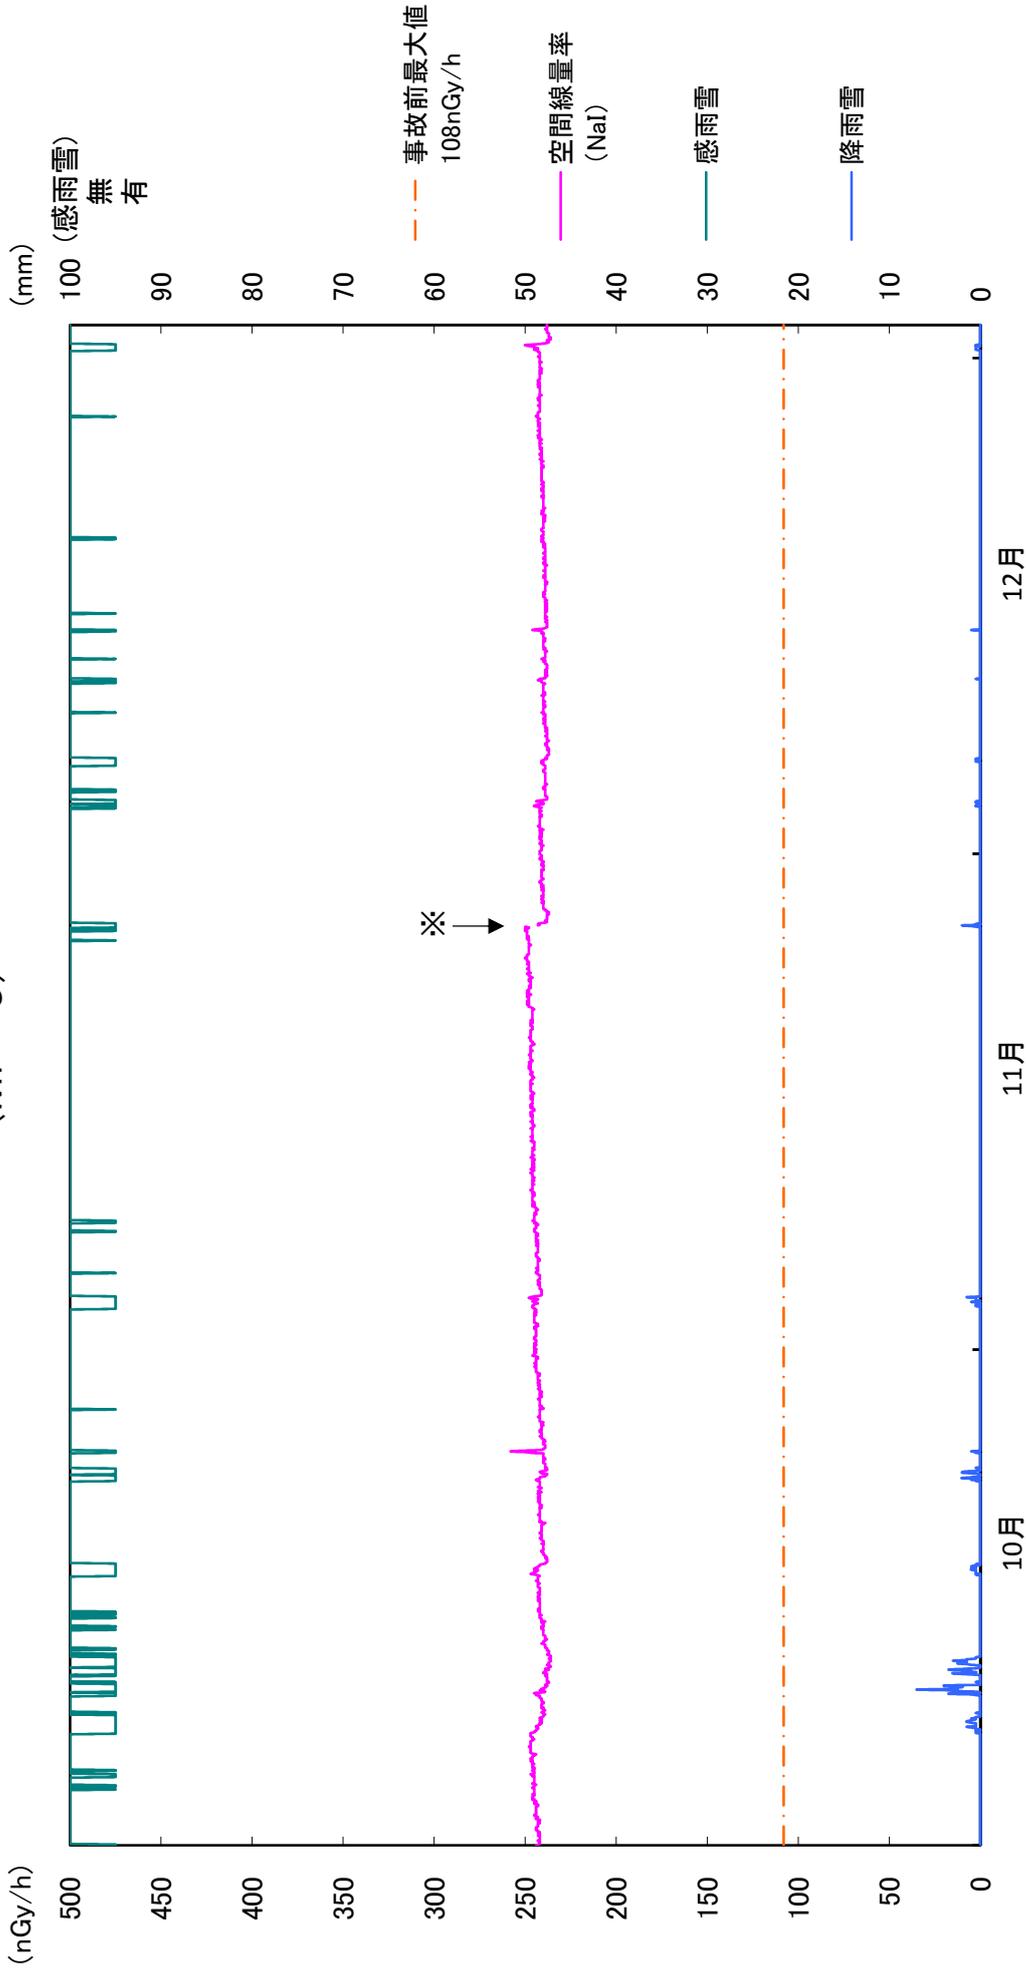


※点検に伴う欠測:11月25日  
欠測時には、可搬型モニタリングポストを設置し、指示値に異常がないことを確認している。

空間線量率の変動グラフ  
(MP-6)

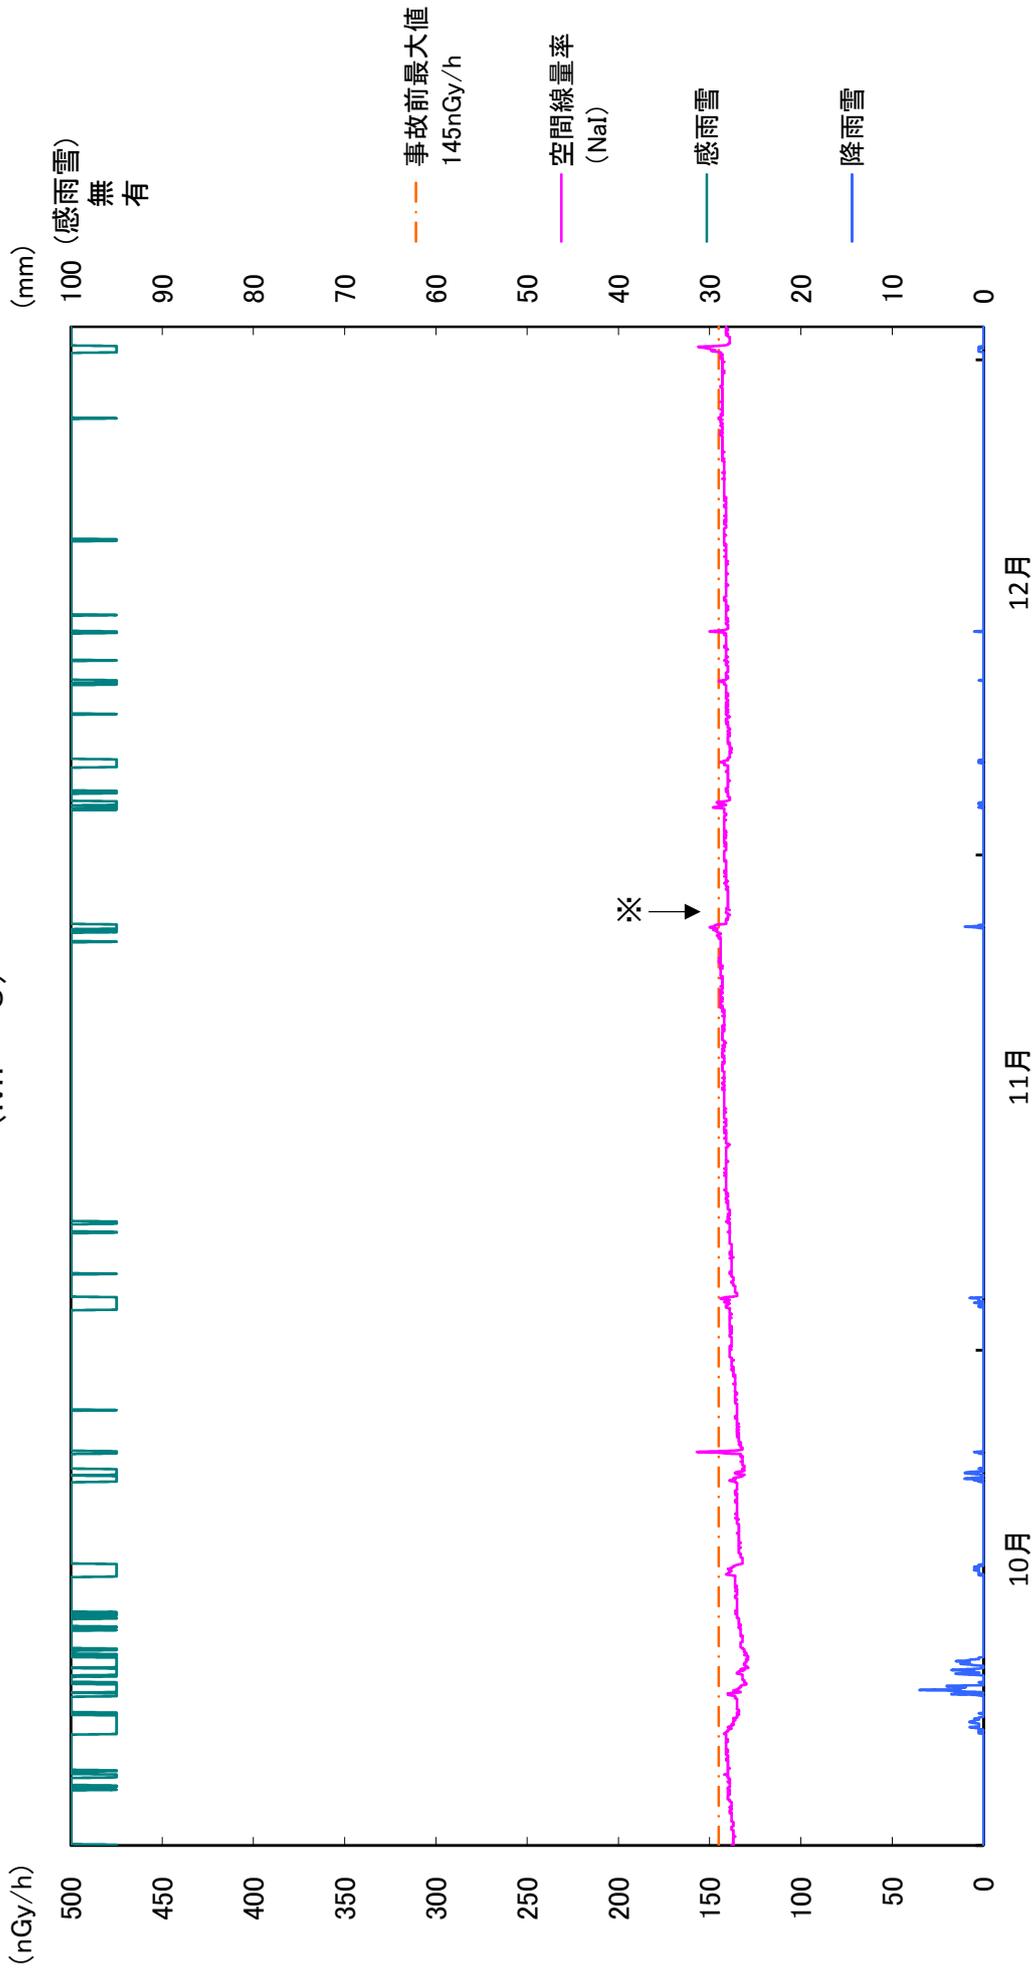

※点検に伴う欠測:11月26日  
欠測時には、可搬型モニタリングポストを設置し、指示値に異常がないことを確認している。

空間線量率の変動グラフ  
(MP-7)

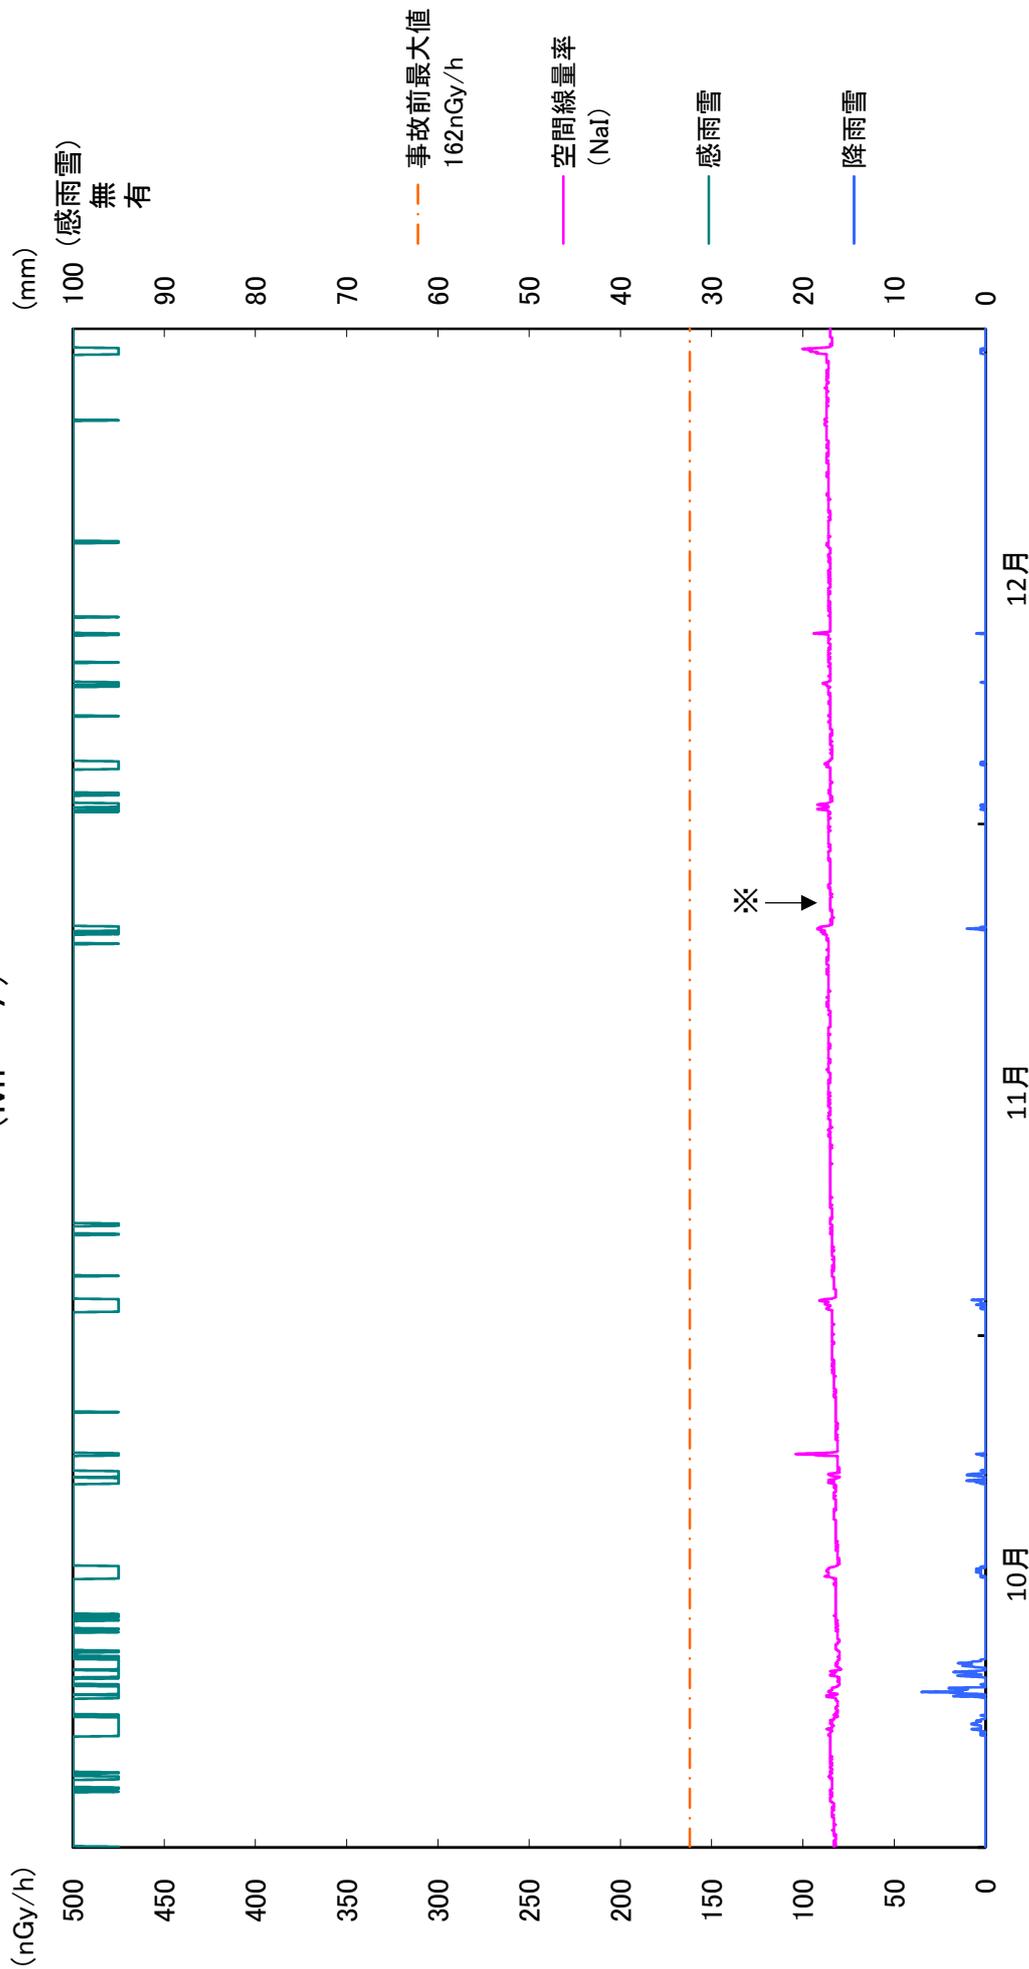


※点検に伴う欠測:11月27日  
欠測時には、可搬型モニタリングポストを設置し、指示値に異常がないことを確認している。

# 大気浮遊じんの全アルファ及び全ベータ放射能の推移

MP-3

(令和2年10月1日～令和2年12月31日)

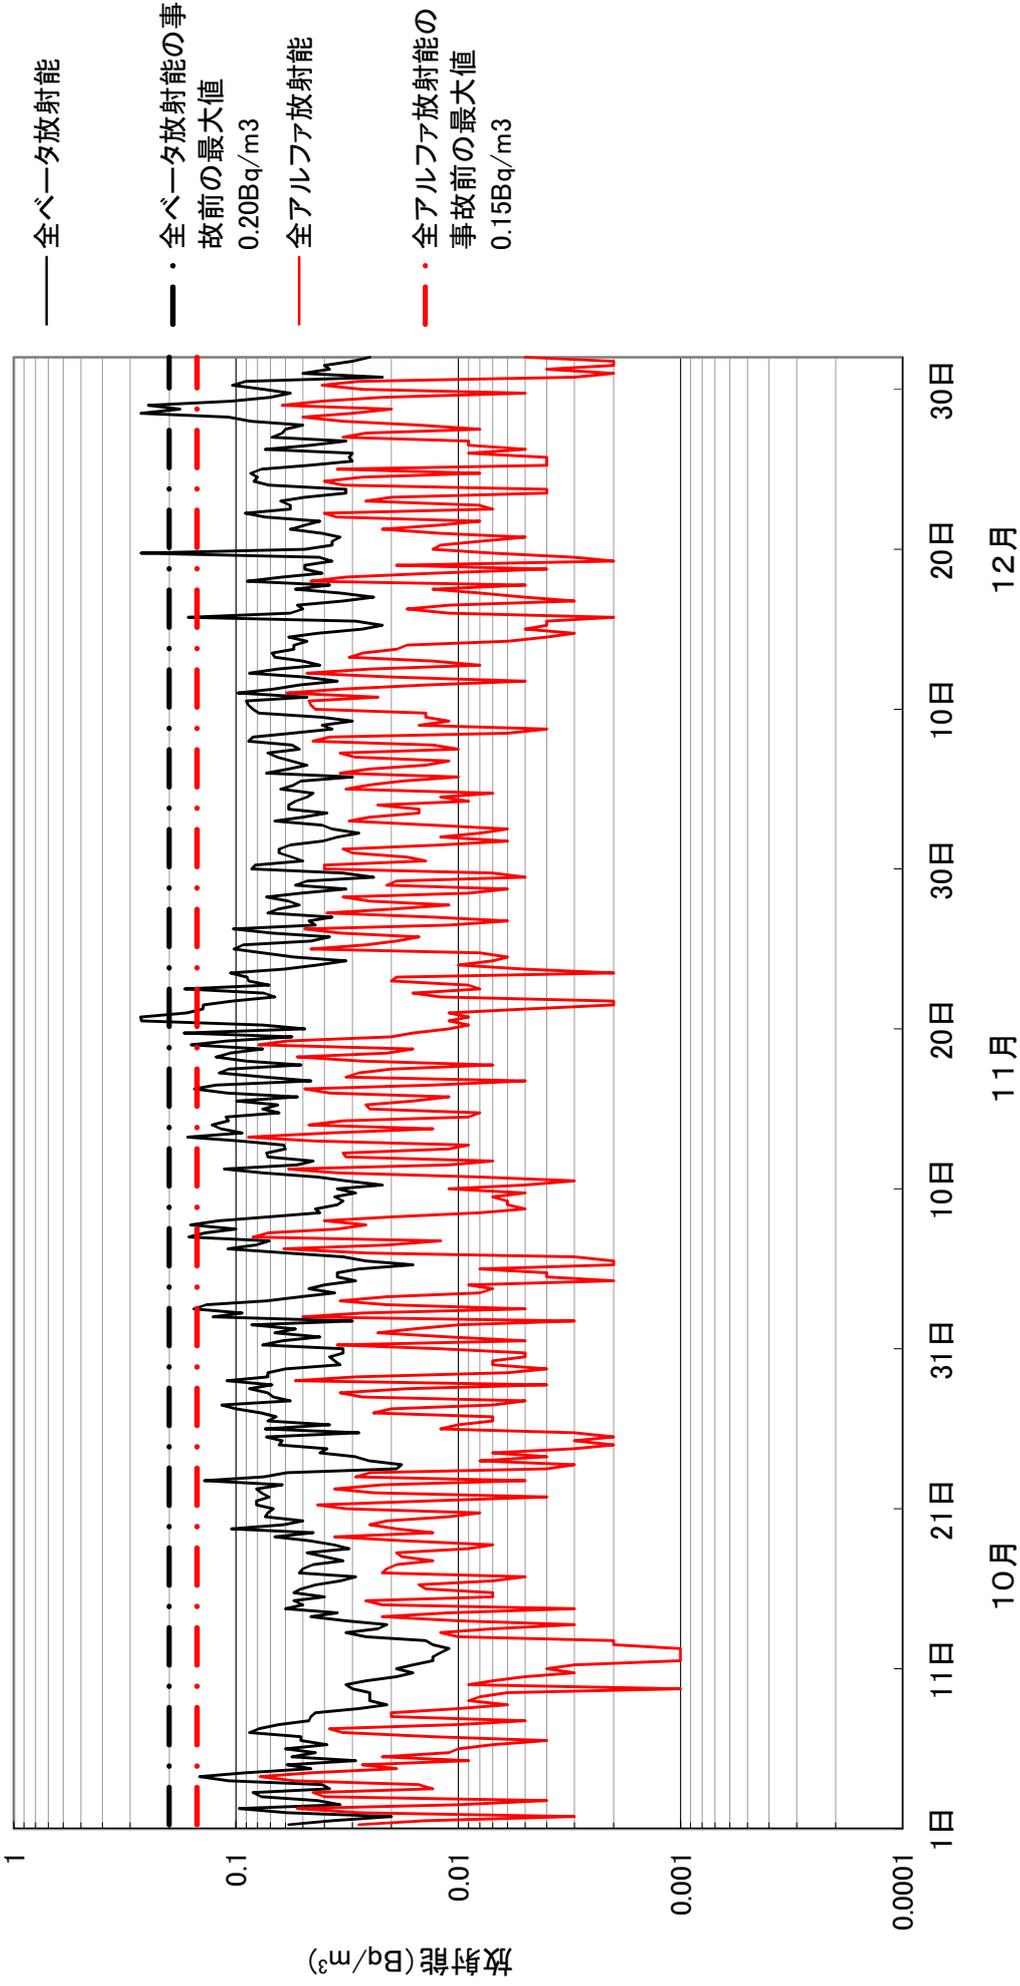


11月18日については、定期点検に伴う欠測。  
 欠測時は、敷地境界付近(MP1～MP8)に設置した連続ダストモニタにて指示値に異常がないことを確認している。  
 注)全アルファ放射能は0.001Bq/m<sup>3</sup>より小さい場合には0Bq/m<sup>3</sup>となるため対数グラフに表示されない。

# 大気浮遊じんの全アルファ及び全ベータ放射能の推移

MP-8

(令和2年10月1日～令和2年12月31日)

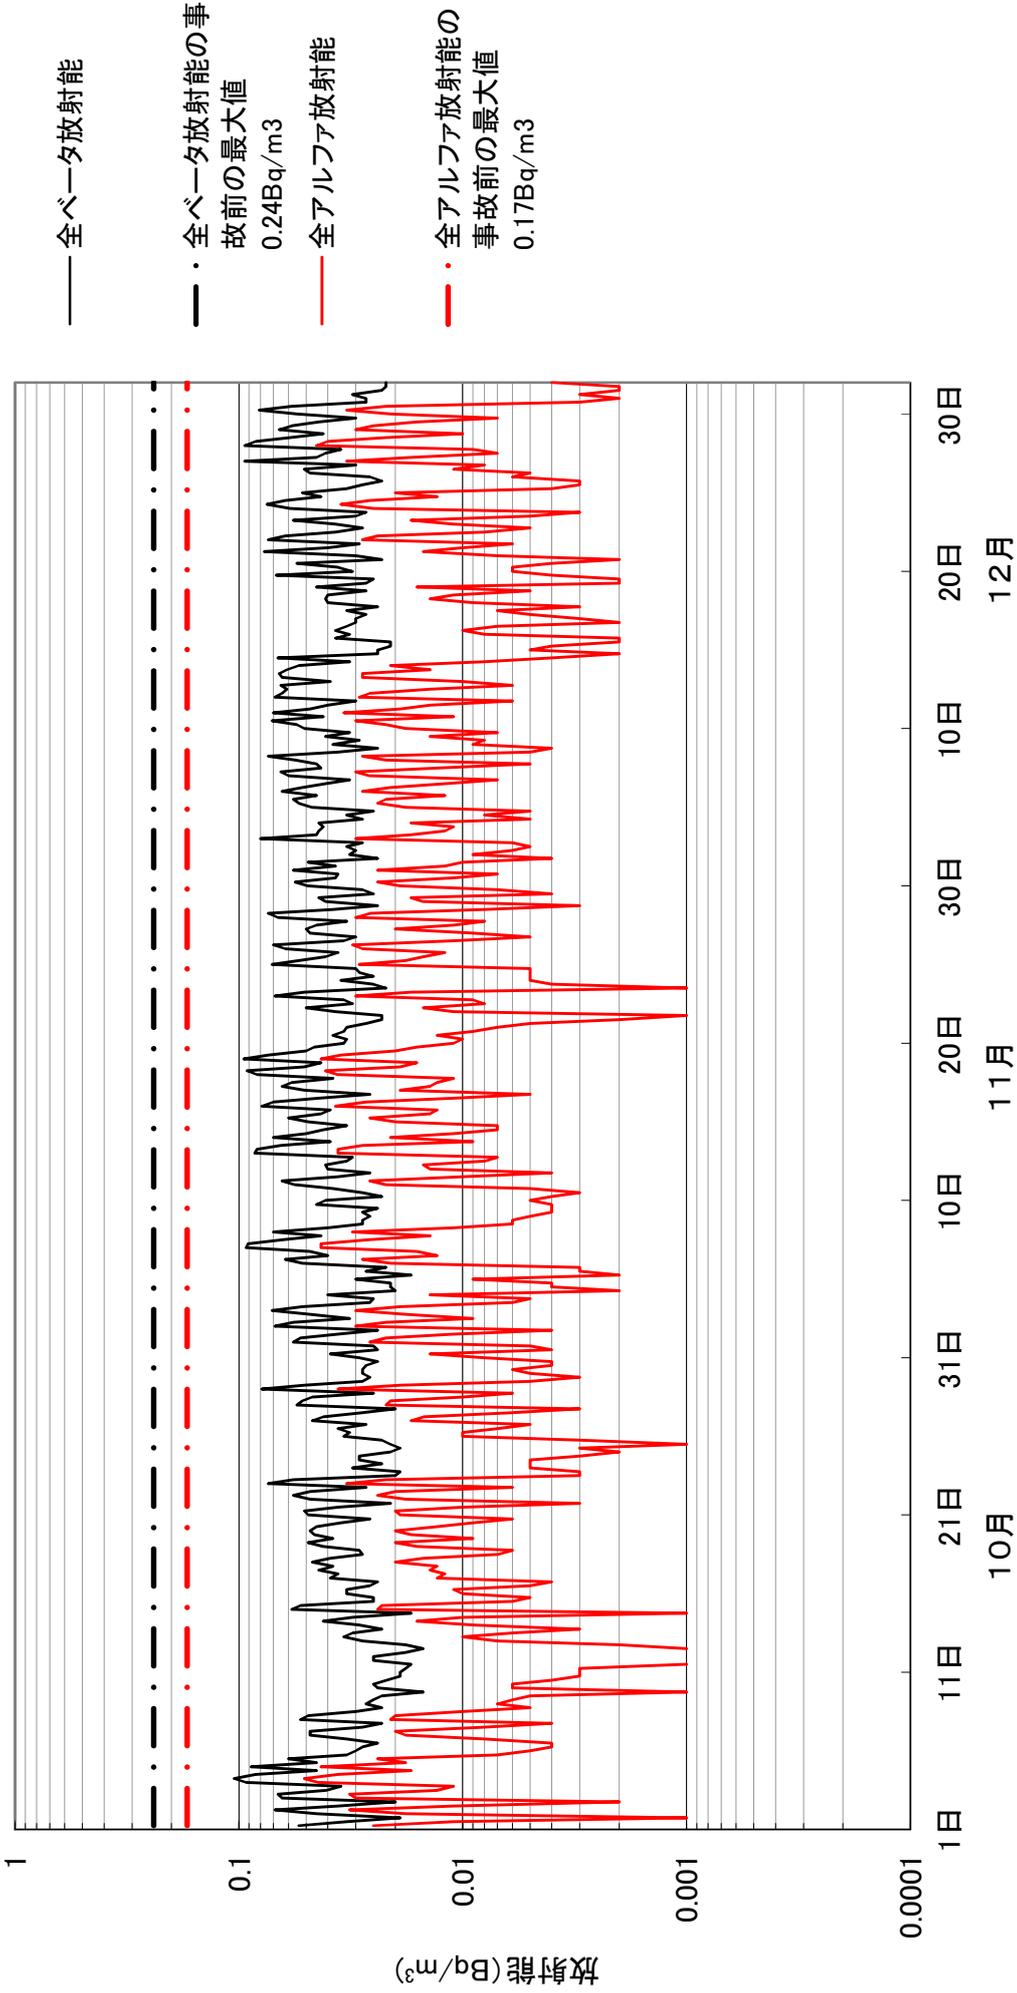


11月10日については、定期点検に伴う欠測。  
 欠測時は、敷地境界付近(MP1～MP8)に設置した連続ダストモニタにて指示値に異常がないことを確認している。  
 注)全アルファ放射能は 0.001Bq/m<sup>3</sup> より小さい場合には 0Bq/m<sup>3</sup> となるため対数グラフに表示されない。

# 大気浮遊じんの全アルファ及び全ベータ放射能の推移

MP-1


(令和2年10月1日～12月31日)

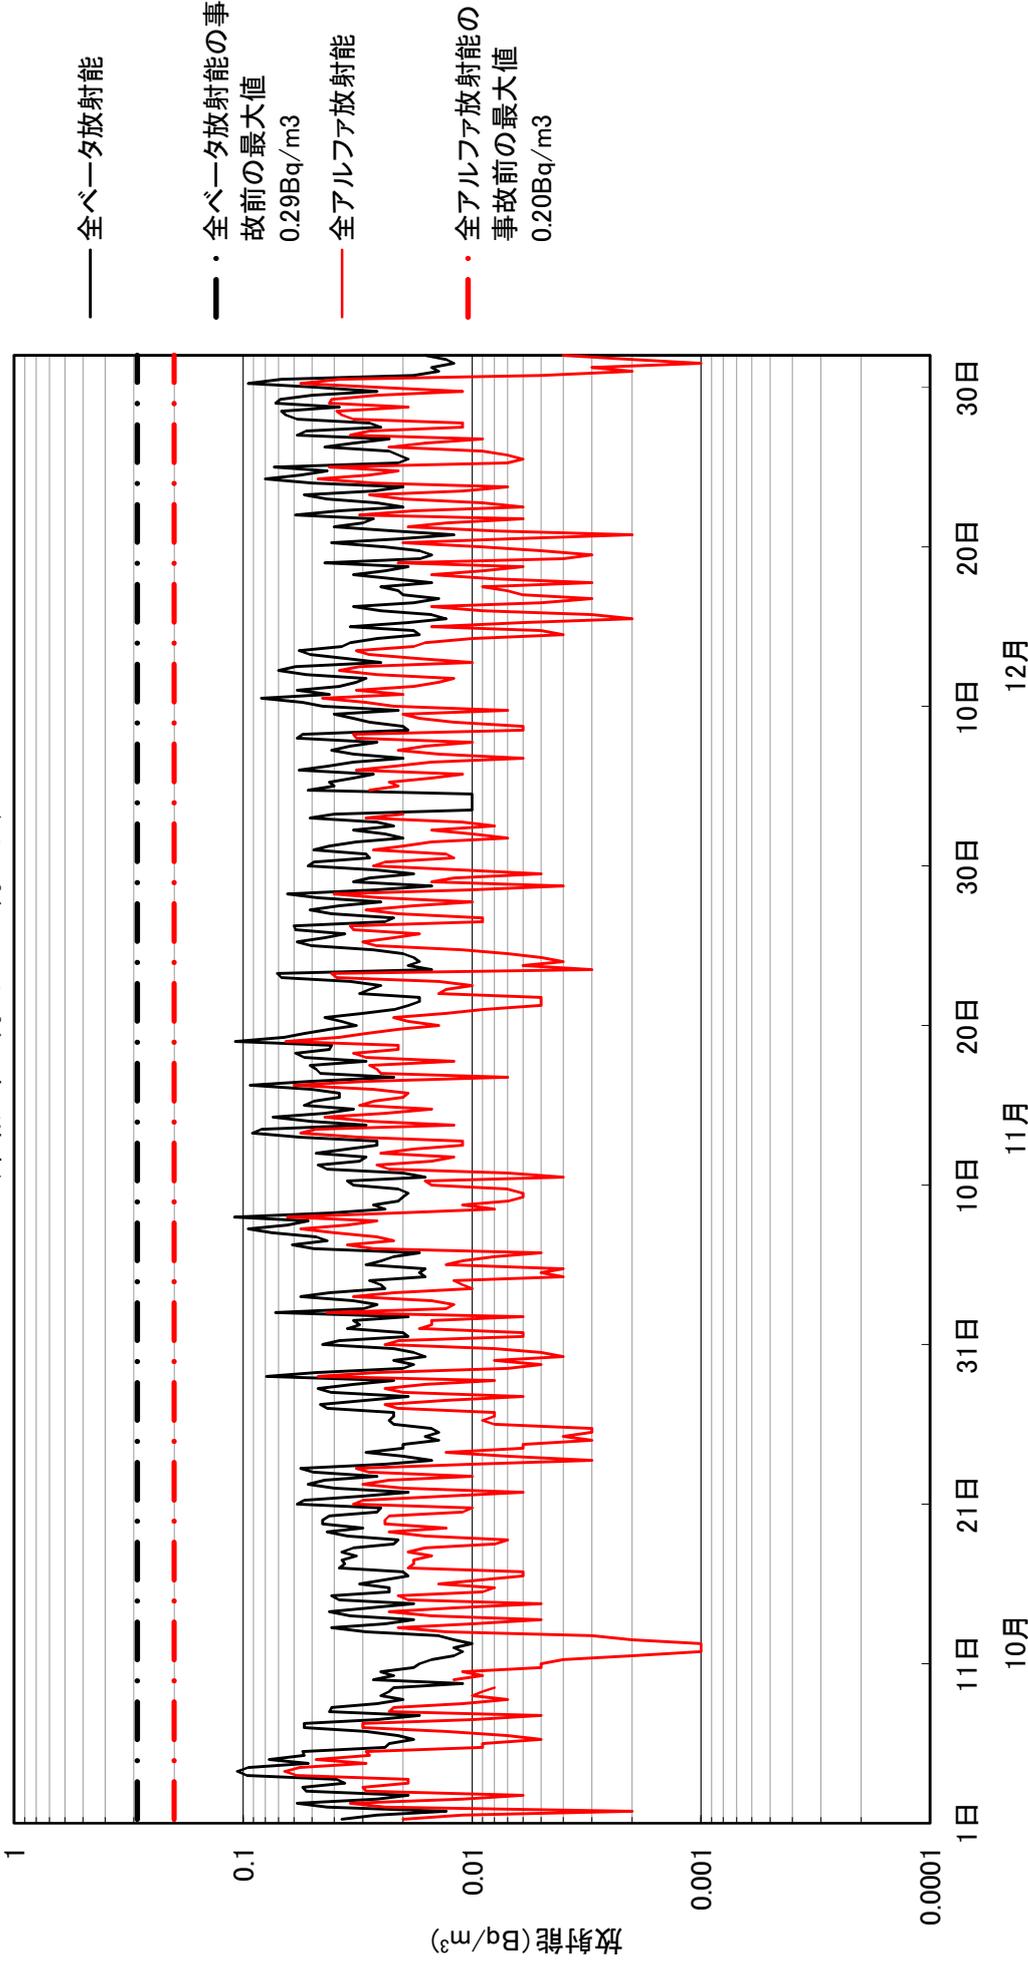

注) 全アルファ放射能は0.001Bq/m<sup>3</sup>より小さい場合には0Bq/m<sup>3</sup>となるため対数グラフに表示されない。


# 大気浮遊じんの全アルファ及び全ベータ放射能の推移

MP-7  
(令和2年10月1日～12月31日)

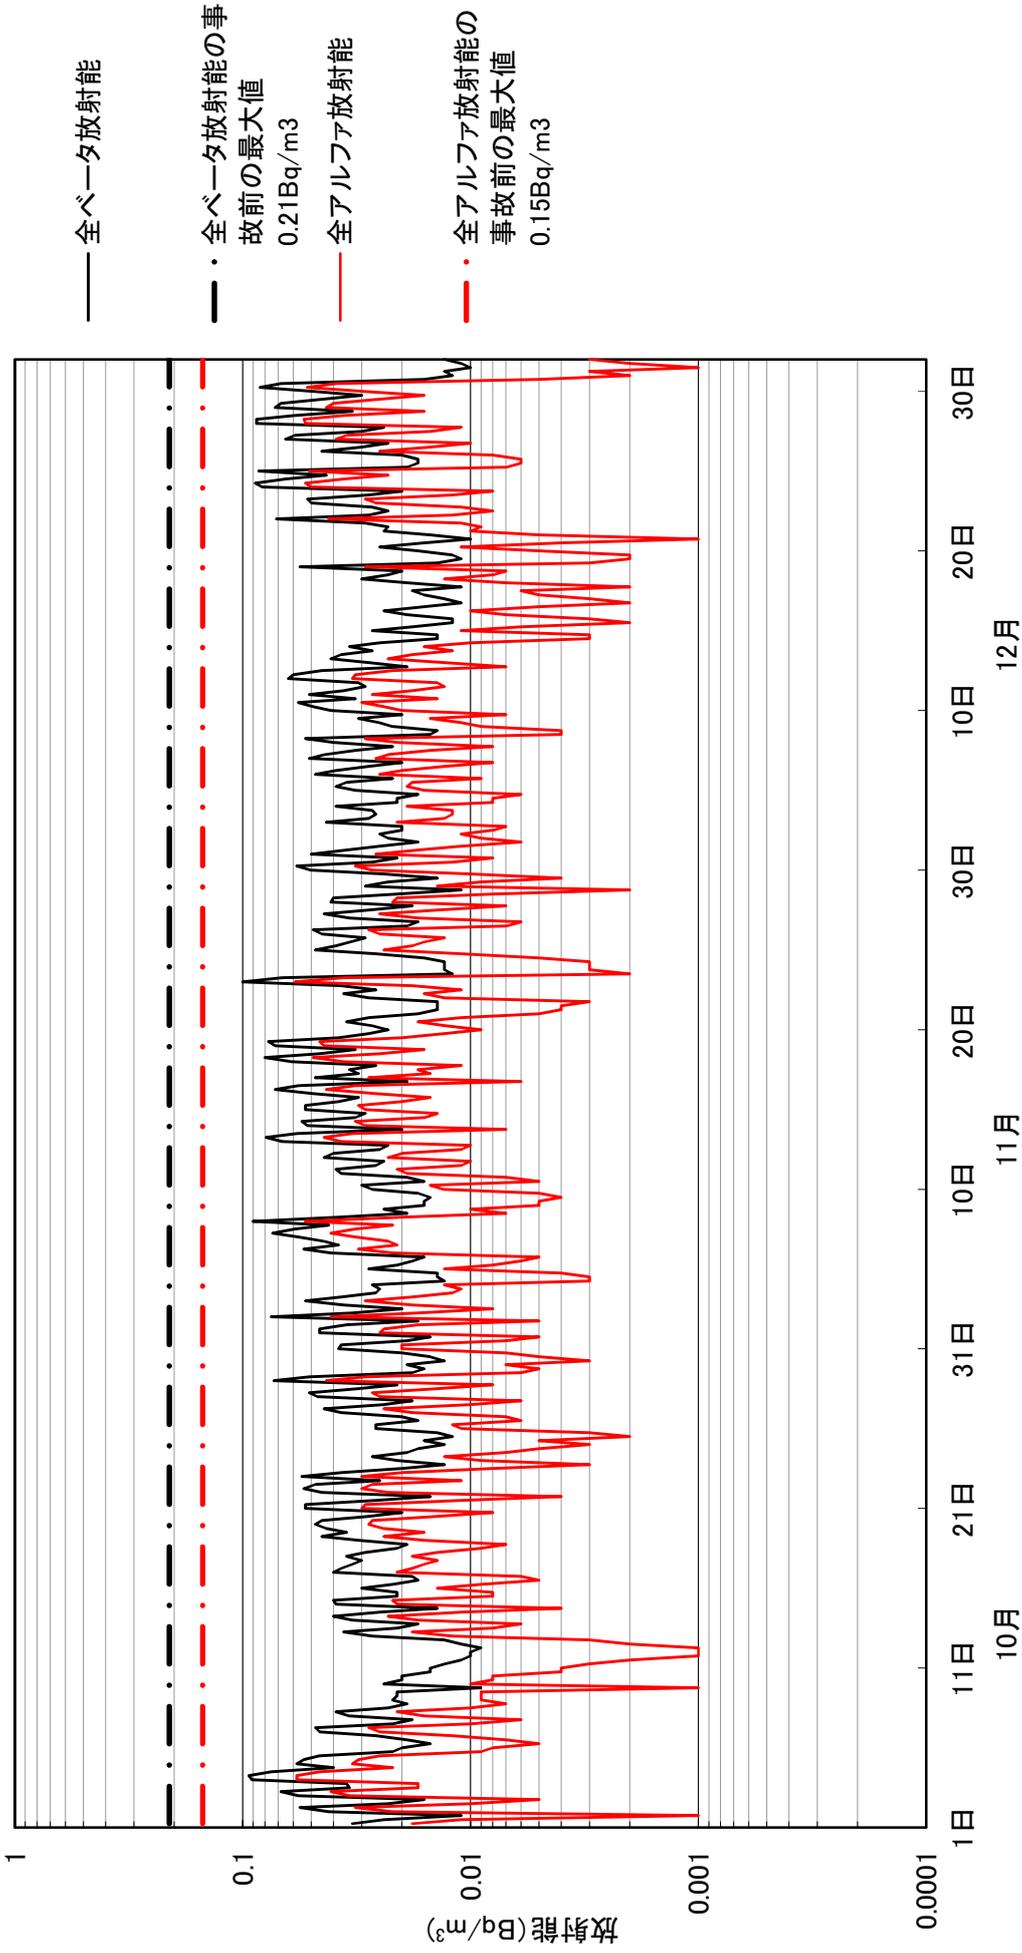


注) 全アルファ放射能は0.001Bq/m<sup>3</sup>より小さい場合には0Bq/m<sup>3</sup>となるため対数グラフに表示されない。

大気浮遊じんの全アルファ・全ベータ放射能の相関図  
(MP-3)  
(令和2年10月～令和2年12月)

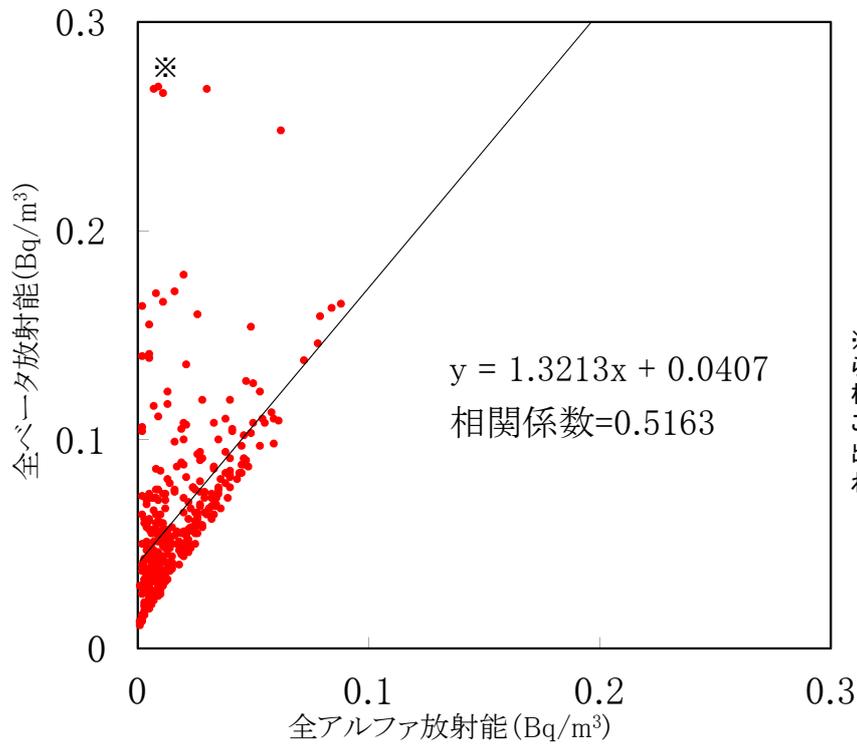


※全アルファ・全ベータの相関から外れた試料については個別に核種濃度を測定している。この結果、Cs-134とCs-137が検出され、その他の核種は検出されていないことを確認している。


大気浮遊じんの全アルファ・全ベータ放射能の相関図  
(MP-8)  
(令和2年10月～令和2年12月)

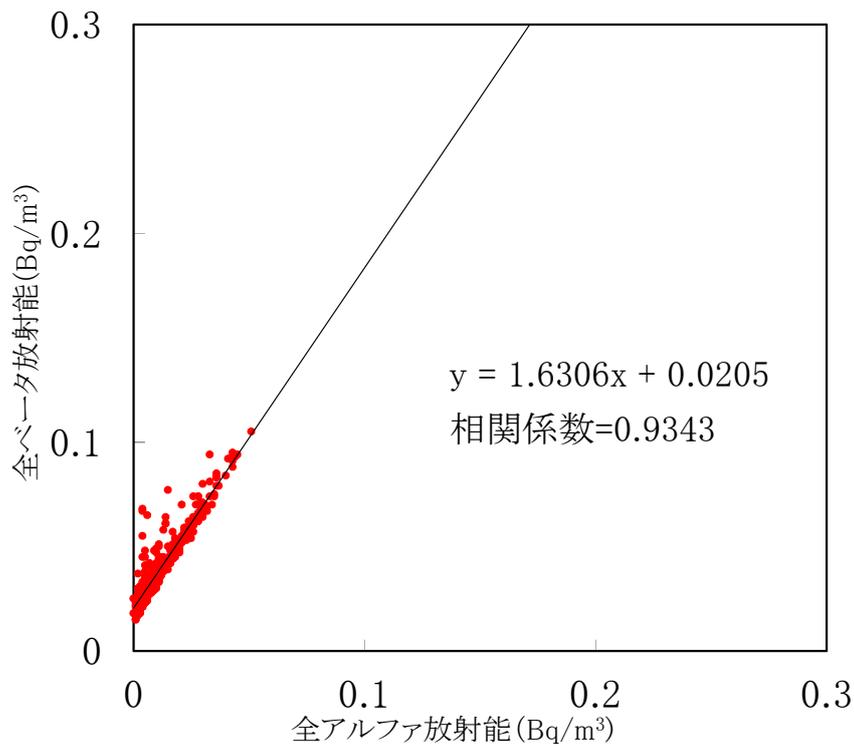

大気浮遊じんの全アルファ・全ベータ放射能の相関図  
 (MP-1)  
 (令和2年10月～12月)

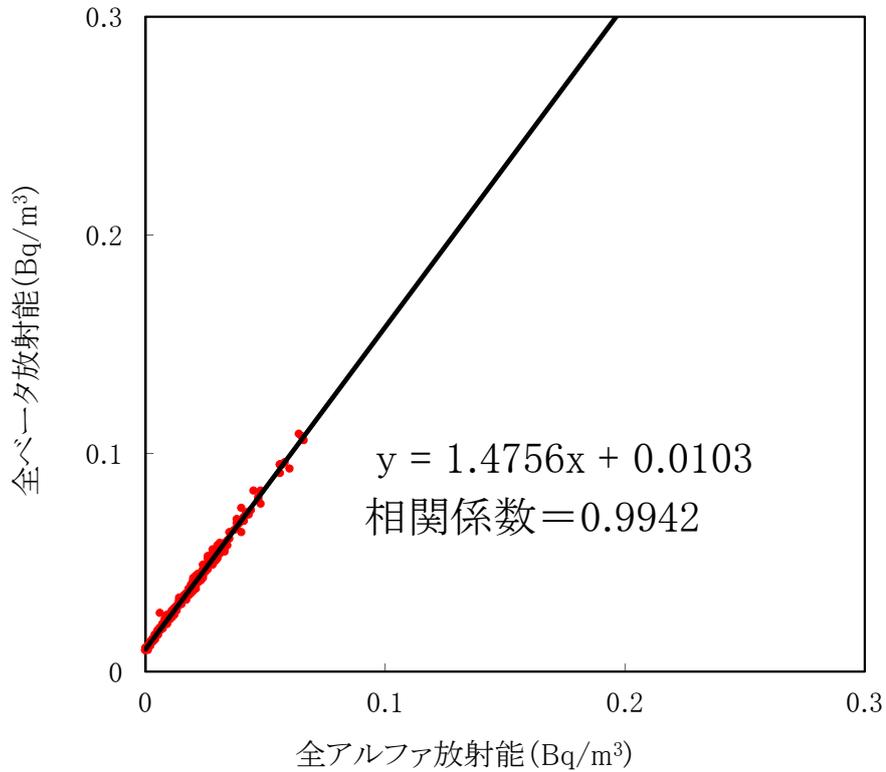

大気浮遊じんの全アルファ・全ベータ放射能の相関図  
 (MP-7)  
 (令和2年10月～12月)

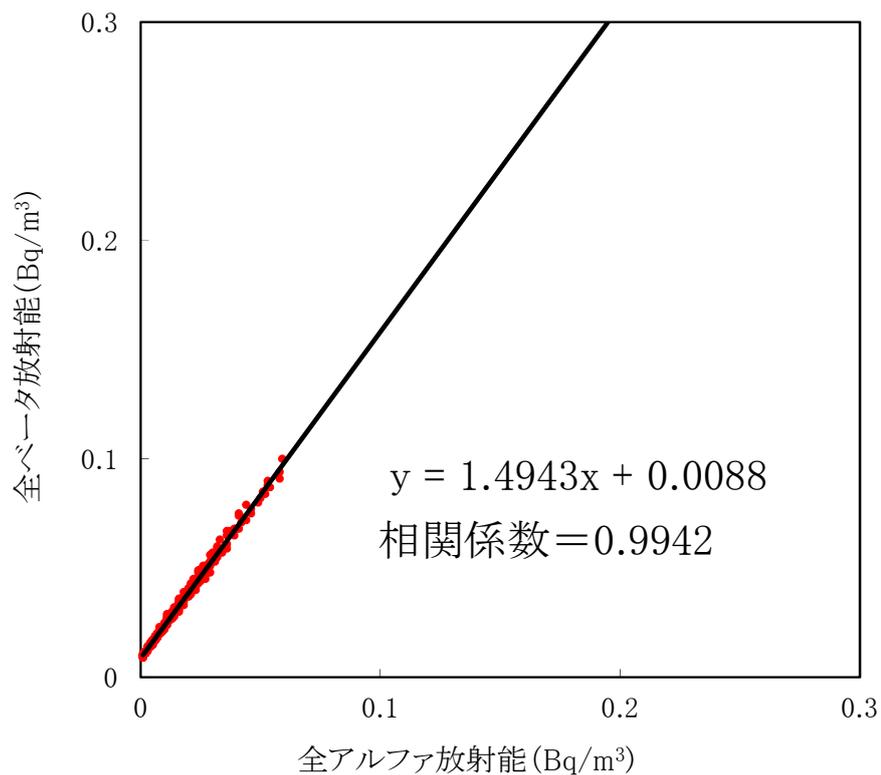

＜参考＞地下水バイパスの評価

(第3四半期:令和2年10月1日～令和2年12月31日)

	核種別			備考
	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>90</sup> Sr	
地下水バイパス	ND	ND	ND	<p>排水放射能(Bq/L)「排水前のタンクの分析結果」に排水量(L)を乗じて求めている。</p> <p><sup>90</sup>Srは全βでの評価値である。なお、排水中の放射性物質濃度が検出限界未満の場合はNDと表示した。</p> <p><sup>134</sup>Cs、<sup>137</sup>Csの検出限界値は1Bq/L未満、全βの検出限界値は5Bq/L未満または1Bq/L未満(10日に1回程度)である。</p> <p>排水量は21,120m<sup>3</sup>である。</p>

＜参考＞サブドレン他浄化設備の処理済水の評価

(第3四半期:令和2年10月1日～令和2年12月31日)

	核種別			備考
	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>90</sup> Sr	
サブドレン他 浄化設備の処理済水	ND	ND	ND	<p>排水放射能(Bq/L)「排水前のタンクの分析結果」に排水量(L)を乗じて求めている。</p> <p><sup>90</sup>Srは全βでの評価値である。なお、排水中の放射性物質濃度が検出限界未満の場合はNDと表示した。</p> <p><sup>134</sup>Cs、<sup>137</sup>Csの検出限界値は1Bq/L未満、全βの検出限界値は3Bq/L未満または1Bq/L未満(10日に1回程度)である。</p> <p>排水量は49,591m<sup>3</sup>である。</p>

＜参考＞地下水バイパス及びサブドレン他浄化設備の処理済水の排水毎の運用目標値

	核種別			備考
	<sup>134</sup> Cs	<sup>137</sup> Cs	<sup>90</sup> Sr	
地下水バイパス	1Bq/L未満	1Bq/L未満	5Bq/L未満 (10日に1回程度の頻度で1Bq/L未満であること)	<p>1500Bq/L未満</p>
サブドレン他 浄化設備の処理済水	1Bq/L未満	1Bq/L未満	3Bq/L未満 (10日に1回程度の頻度で1Bq/L未満であること)	<p>1500Bq/L未満</p>

<参考>地下水バイパス排水実績

(令和2年10月1日～令和2年12月31日)

排水日	排水量【m <sup>3</sup> 】	セシウム134【Bq/L】	セシウム137【Bq/L】	全ベータ【Bq/L】	トリチウム【Bq/L】
10月1日	1796	<0.66	<0.54	<0.63	86
10月6日	1266	<0.64	<0.60	<0.55	90
10月15日	1041	<0.63	<0.73	<0.76	140
10月31日	1548	<0.56	<0.73	<0.69	130
11月7日	2062	<0.65	<0.60	<0.59	100
11月12日	1570	<0.45	<0.69	<0.75	130
11月19日	2289	<0.66	<0.83	<0.72	100
11月26日	1802	<0.78	<0.54	<0.64	100
12月3日	1855	<0.63	<0.65	<0.63	100
12月11日	1967	<0.45	<0.76	<0.67	95
12月19日	1971	<0.65	<0.65	<0.61	97
12月27日	1953	<0.78	<0.54	<0.63	110

<参考>サブドレン排水実績

(令和2年10月1日～令和2年12月31日)


排水日	排水量【m <sup>3</sup> 】	セシウム134【Bq/L】	セシウム137【Bq/L】	全ベータ【Bq/L】	トリチウム【Bq/L】
10月1日	695	<0.57	<0.54	<2.1	860
10月2日	688	<0.61	<0.69	<1.7	960
10月3日	719	<0.75	<0.60	<0.65	910
10月4日	791	<0.70	<0.77	<1.9	720
10月5日	919	<0.67	<0.60	<1.9	680
10月6日	896	<0.64	<0.73	<0.64	760
10月7日	756	<0.57	<0.54	<1.6	970
10月8日	876	<0.72	<0.47	<1.9	950
10月9日	1004	<0.53	<0.69	<1.8	950
10月10日	823	<0.88	<0.60	<1.8	900
10月11日	779	<0.53	<0.65	<1.9	810
10月12日	743	<0.72	<0.54	<1.8	860
10月13日	714	<0.76	<0.65	<2.0	850
10月14日	678	<0.76	<0.47	<0.65	860
10月15日	655	<0.82	<0.60	<1.8	860
10月16日	640	<0.64	<0.65	<1.7	800
10月17日	679	<0.68	<0.73	<1.8	770
10月18日	734	<0.82	<0.69	<1.7	810
10月19日	812	<0.73	<0.65	<1.9	760
10月20日	873	<0.79	<0.69	<2.0	810
10月21日	794	<0.76	<0.65	<1.9	770
10月22日	769	<0.53	<0.73	<1.6	740
10月23日	772	<0.55	<0.73	<2.0	780
10月24日	853	<0.63	<0.68	<0.54	780
10月25日	919	<0.82	<0.69	<1.7	830
10月26日	783	<0.56	<0.60	<1.9	860
10月27日	788	<0.49	<0.60	<1.6	850
10月28日	776	<0.91	<0.65	<1.8	950
10月29日	820	<0.64	<0.69	<1.8	950
10月30日	737	<0.68	<0.60	<2.1	1000
10月31日	819	<0.56	<0.65	<2.0	1000
11月1日	651	<0.91	<0.54	<2.0	1000
11月2日	136	<0.43	<0.46	<2.0	900
11月3日	639	<0.58	<0.65	<0.65	1100
11月4日	575	<0.68	<0.60	<1.7	1100
11月5日	571	<0.53	<0.54	<2.0	1100
11月6日	648	<0.63	<0.65	<0.65	1100
11月7日	655	<0.61	<0.65	<1.8	1000
11月8日	633	<0.74	<0.60	<1.9	980

<参考>サブドレン排水実績

(令和2年10月1日～令和2年12月31日)

排水日	排水量【m <sup>3</sup> 】	セシウム134【Bq/L】	セシウム137【Bq/L】	全ベータ【Bq/L】	トリチウム【Bq/L】
11月9日	610	<0.79	<0.54	<2.0	1000
11月10日	583	<0.50	<0.65	<2.0	1000
11月11日	570	<0.76	<0.69	<2.0	1100
11月12日	541	<0.63	<0.60	<1.6	1100
11月13日	502	<0.61	<0.69	<1.9	1100
11月14日	553	<0.76	<0.73	<1.8	1100
11月16日	950	<0.63	<0.80	<0.69	1100
11月18日	665	<0.65	<0.77	<2.0	930
11月19日	562	<0.76	<0.77	<1.7	960
11月20日	428	<0.68	<0.77	<2.0	960
11月21日	981	<0.53	<0.80	<1.8	960
11月22日	488	<0.50	<0.54	<1.9	920
11月23日	490	<0.64	<0.65	<1.8	870
11月24日	414	<0.68	<0.69	<0.65	850
11月26日	667	<0.57	<0.73	<1.9	860
11月27日	576	<0.55	<0.60	<2.2	860
11月28日	442	<0.41	<0.60	<1.9	830
11月29日	455	<0.49	<0.69	<1.8	890
11月30日	425	<0.45	<0.69	<1.8	880
12月1日	420	<0.55	<0.73	<0.65	890
12月3日	617	<0.82	<0.65	<2.1	880
12月4日	531	<0.55	<0.65	<2.0	880
12月5日	310	<0.63	<0.73	<1.9	940
12月6日	296	<0.65	<0.65	<0.65	910
12月7日	290	<0.78	<0.54	<1.7	920
12月8日	265	<0.61	<0.62	<2.1	960
12月12日	695	<0.70	<0.73	<1.6	760
12月14日	756	<0.67	<0.83	<0.65	810
12月20日	670	<0.68	<0.54	<1.8	900
12月22日	640	<0.76	<0.60	<0.57	910
12月23日	691	<0.59	<0.60	<1.8	870
12月24日	642	<0.70	<0.69	<1.7	970
12月25日	672	<0.74	<0.69	<2.0	900
12月26日	629	<0.72	<0.69	<1.6	990
12月27日	563	<0.76	<0.80	<1.9	880
12月28日	603	<0.72	<0.65	<1.7	1100
12月30日	587	<0.70	<0.47	<0.70	1100


地下水バイパス排水実績(令和2年10月～令和2年12月)

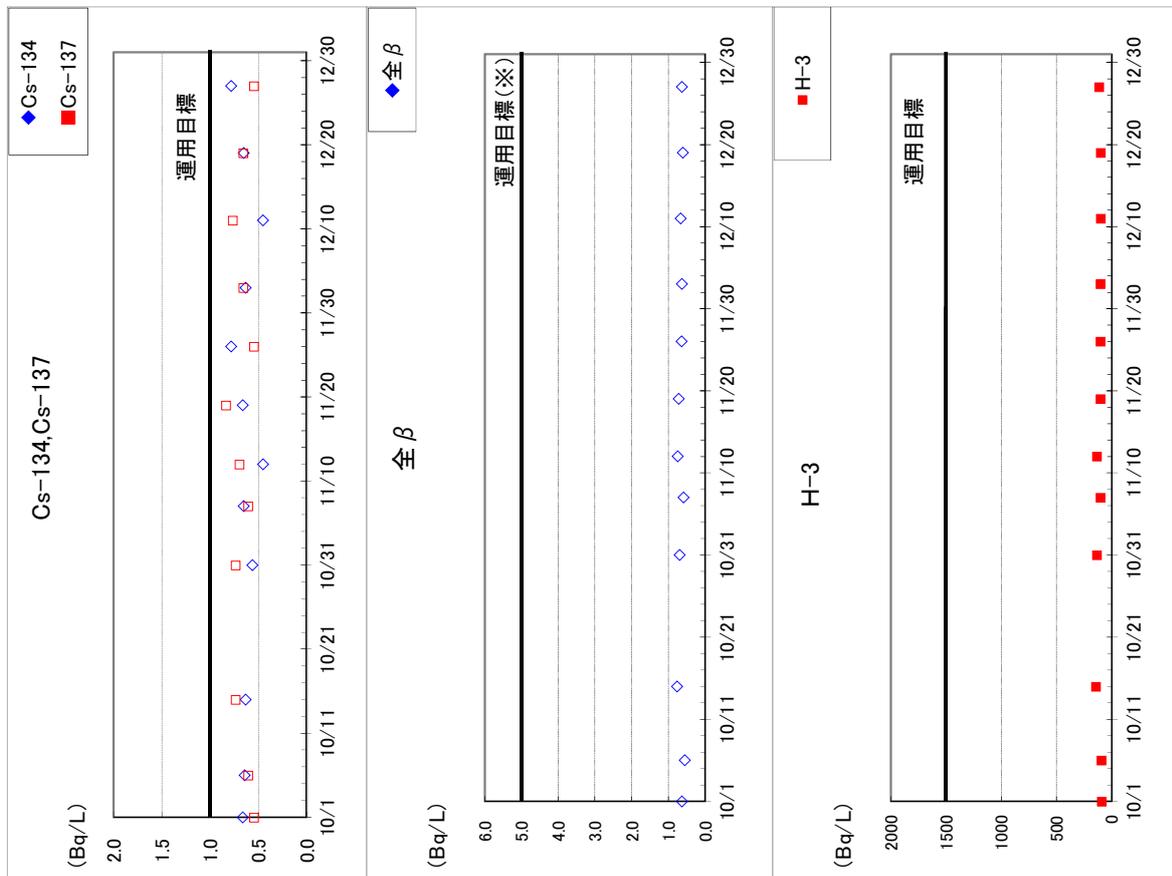

\*: 白抜きのプロットは検出下限値未達であるため、検出下限値をプロットしている。


※: 10日に1回程度の分析では、検出限界値を1Bq/Lに下げて実施

サブドレン排水実績(令和2年10月～令和2年12月)

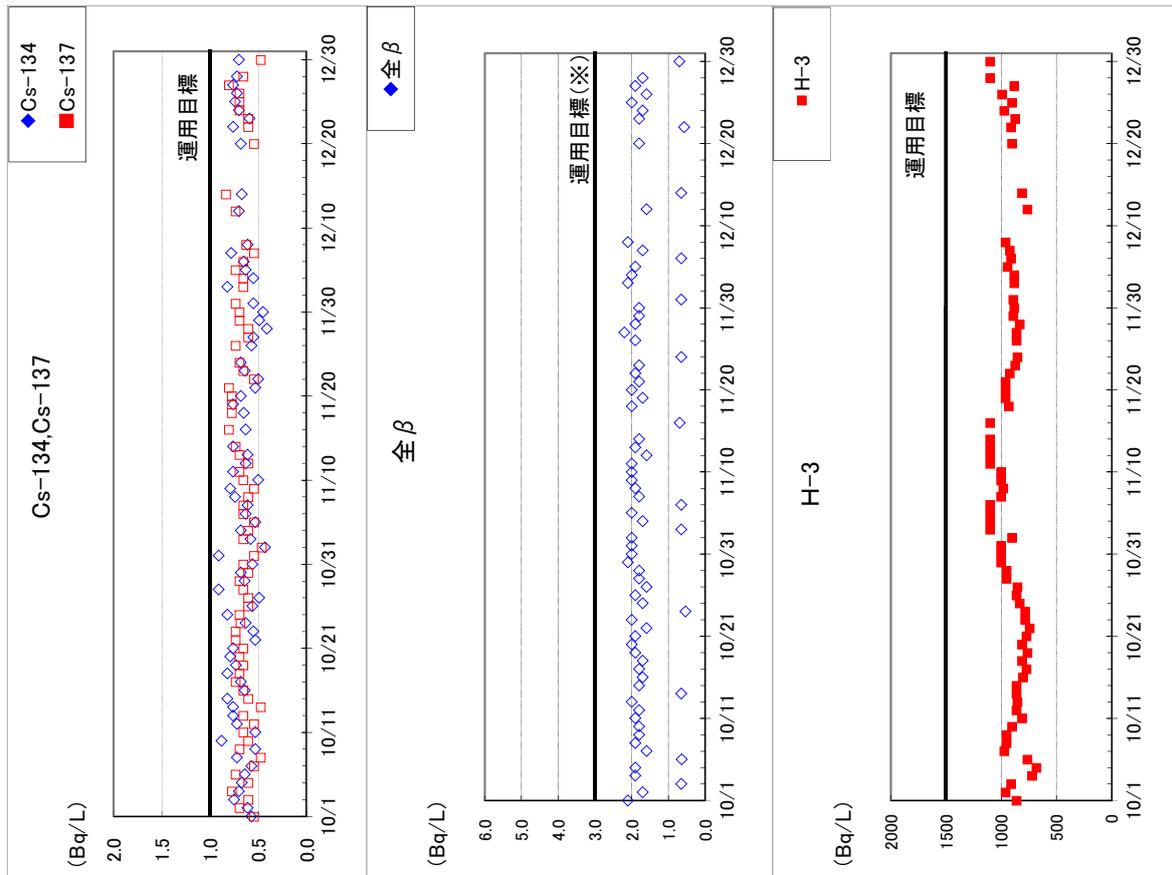

# ＜参考＞福島第一原子力発電所 敷地境界近傍ダストモニタ指示値

(2020/10/1～2020/12/31)

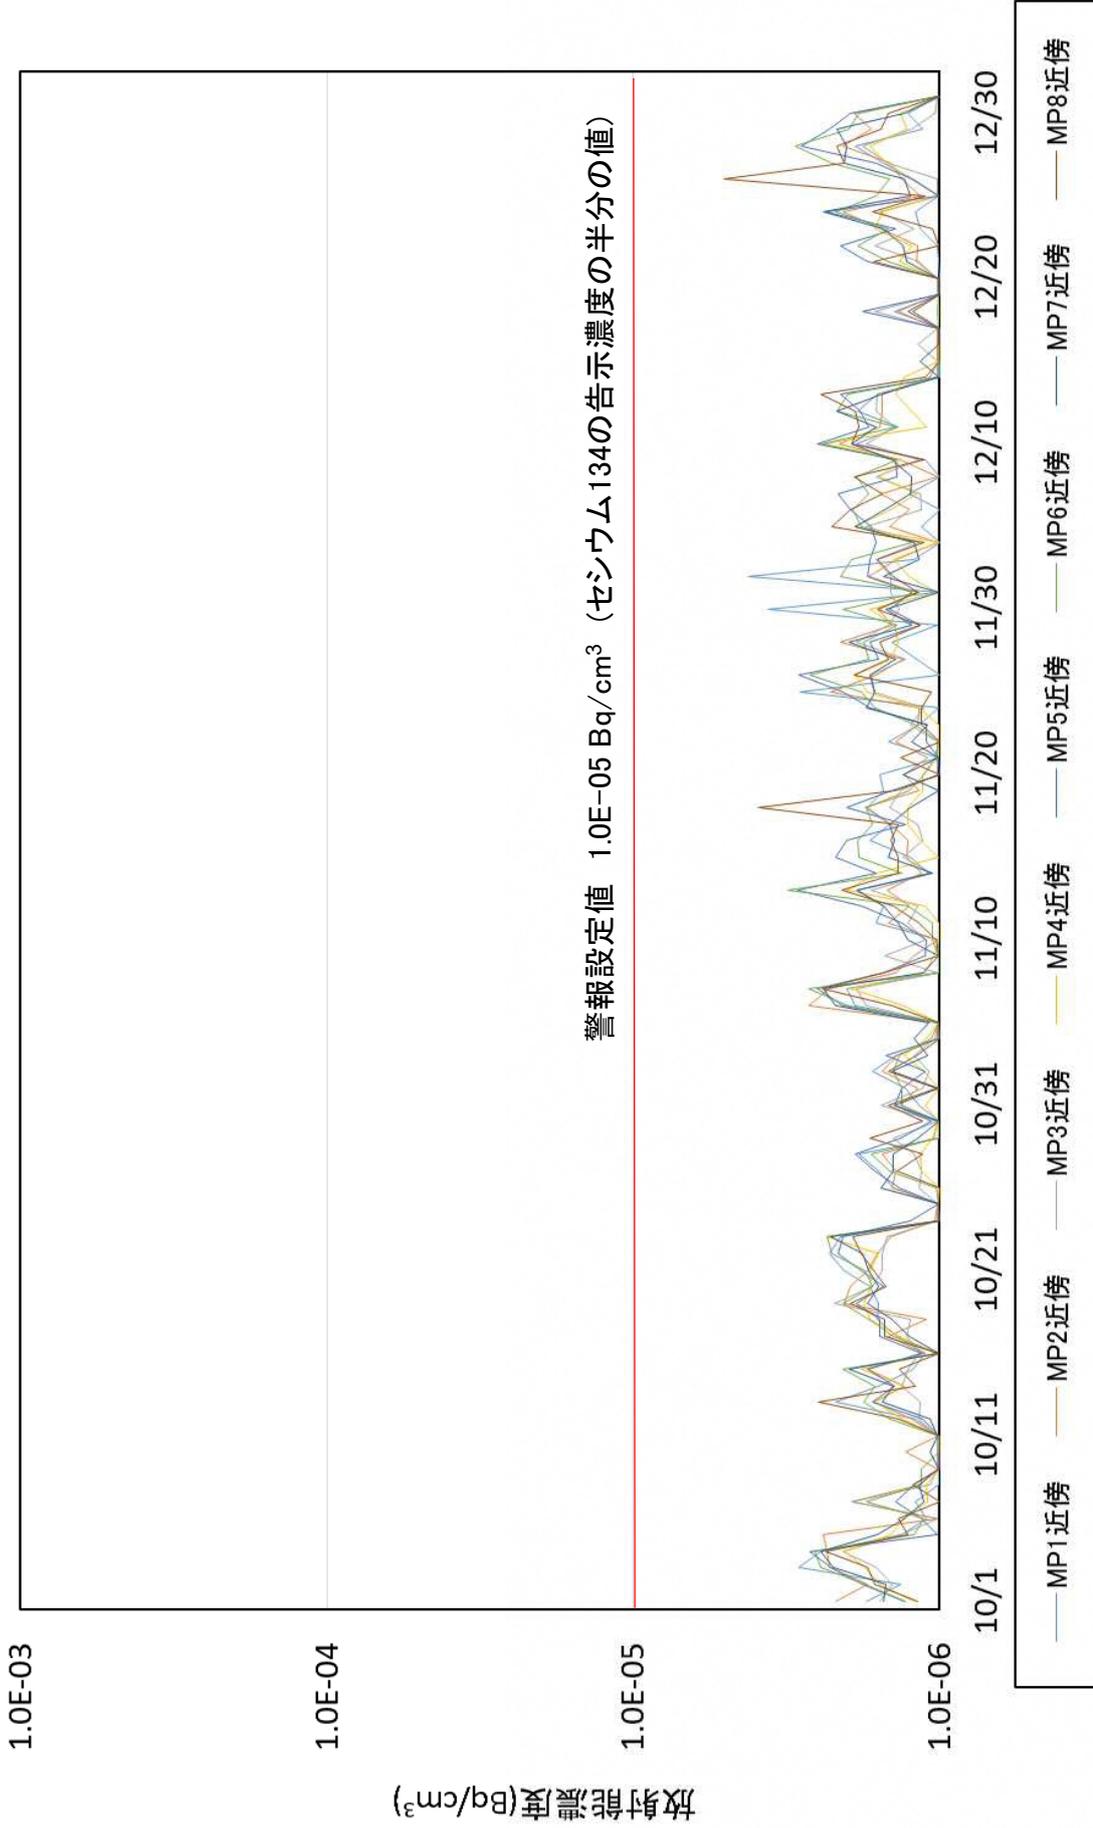

グラフ値は日最大値を記載(5分正時の値)
